

Radicado: R 2021010225847  
Fecha: 2021/06/17 2:08 PM

Tpo: OFICIO

ANA LUCIA CASTANEDA GARCIA

**Ferri**  
**de Antioquia**



Medellín, 11 de junio de 2021



PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S  
Centro de Gestión Documental  
Nro. Radicado: 000210 No presenta  
Fch. Rad: 11/06/2021 14:21:45

Doctor

**LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ**

Gobernador (E)

Departamento de Antioquia

**Asunto:** Concepto de viabilidad para los ajustes del proyecto de inversión "Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el Mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo - Puerto Berrio", BPIN 2019000040023, según Ley 2056 de 2020 del SGR.

Respetado señor Gobernador, cordial saludo.

En concordancia con lo previsto en el numeral 8.2 de las Orientaciones Transitorias para la gestión de proyectos de inversión, expedidas por el Departamento Nacional de Planeación, emito el presente concepto de viabilidad frente a los ajustes que se pretenden realizar al proyecto de inversión "*Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el Mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo - Puerto Berrio*", que actualmente viene ejecutando la Promotora Ferrocarril de Antioquia con aportes de recursos del Sistema General de Regalías – SGR, con fundamento en las siguientes razones técnicas, jurídicas y financieras:

#### 1. RAZONES TÉCNICAS:

Como usted bien conoce señor Gobernador, mediante el Acuerdo No. 59 del 20 de septiembre de 2019, el OCAD REGIONAL EJE CAFETERO del SGR - DNP, viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de la referencia a la Gobernación de Antioquia, que luego, mediante el Acuerdo No. 60 del 11 de octubre de 2019 designó a la Promotora Ferrocarril de Antioquia, como entidad ejecutora y entidad designada para la contratación de la interventoría.

Al proyecto le fueron aprobados recursos por un monto de \$ **9.576.670.807,00** provenientes del "*Fondo de Compensación Regional 60% - Departamento de Antioquia*", y



actualmente se encuentra en ejecución, después que la entidad realizara el correspondiente cierre presupuestal de la vigencia 2020 e incorporara como Disponibilidad Inicial el saldo no ejecutado del proyecto para la vigencia 2021, dentro de la nueva apropiación presupuestal homologada cuya fuente de financiación del SGR se denomina **Asignación para la Inversión Regional del 60% en cabeza de los departamentos**, según lo establecido por

la Ley 2056 de 2020 del SGR, el proyecto cerró a 31 de diciembre de 2020 presentando la siguiente situación para continuar su ejecución en la actual vigencia fiscal 2021:

GASTOS DE INVERSIÓN					
Objeto Presupuestal	Programa	Subprograma	BPIN		VALOR POR EJECUTAR
00AR	2404	0605	2019000040 023	Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo - Puerto Berrío	\$ 7.775.075.140

No obstante, que en la actualidad el proyecto registra un avance en su ejecución financiera del 44% (\$ 4.237.311.001), dentro del desarrollo del mismo dos circunstancias sobrevinientes nos han generado un atraso y déficit presupuestal del mismo, las cuales suscitan la necesidad de gestionar ante el Sistema General de Regalías un AJUSTE DEL PROYECTO para solicitar una adición y prórroga para el contrato de Consultoría, así como también para la interventoría y la supervisión, circunstancias que me permito sintetizar a continuación:

**1. Un mayor plan de intervención del corredor férreo existente.**

Una vez definido por el consultor el Plan de Intervención para el actual corredor férreo entre Santo Domingo y Puerto Berrío, siendo este uno de los hitos más importantes del proyecto, por cuanto posibilita determinar las acciones a emprender, su justificación y necesidad para



el mejoramiento de la vía férrea, una vez obtenida la aprobación de dicho plan por la interventoría y la Promotora, se pudo concluir también, que dadas las restricciones técnicas y geométricas que presenta la vía actual, el estado de deterioro avanzado de la infraestructura férrea en general, y las problemáticas de disponibilidad de la faja predial en cuanto a su liberación, debido a las ocupaciones de hecho de que es objeto en algunos tramos de su recorrido, nos vemos obligados a considerar dentro del plan de intervención otras variantes de trazado a modo de alternativas, lo que implican una mayor cantidad de nuevas infraestructuras (Viaductos y túneles), con los consecuentes requerimientos de trabajos de campo y ensayos de geotecnia, que dentro del proyecto sólo se tenían planteados por un valor de \$ 857.467.532, y que ahora se sabe con precisión, se aumentarán en \$258.194.897, lo cual genera una actividad de geotecnia adicional que debe ejecutarse por el consultor, y obviamente, un mayor tiempo de permanencia del consultor, interventor y supervisor del proyecto, por cuatro (4) meses adicionales, lo cual implica en estos dos últimos la necesidad de una adición de los contratos.

## **2. Aumento del plazo contractual del proyecto para cumplimiento de su objeto.**

De otro lado, como circunstancia extraordinaria que se suma a la anterior, es importante reseñar el impacto que sobre el plazo contractual han generado los hechos presentados por causa directa de la pandemia del virus y sus efectos, así como las restricciones que de esta situación sanitaria se derivó para el desplazamiento y movilidad de los distintos profesionales, no obstante los esfuerzos desplegados para mantener los procedimientos y cronograma establecidos en los contratos, a fin de garantizar la eficaz y eficiente ejecución del proyecto en los tiempos y con los recursos de inversión establecidos dentro del marco de la correcta planeación de la ejecución contractual.

La compleja realidad que vivimos a la postre, no fue ajena con sus efectos al desarrollo de las actividades del proyecto, que por su carácter de complejidad y especialidad, entendidas como la de los proyectos de infraestructura que superan la anualidad y que requieren el cumplimiento de etapas, recibo de insumos de información y trabajos de campo de diversa índole, conceptos de autoridades o condiciones previas para la ejecución del contrato, implicaron en suma, un mayor tiempo para su ejecución, que obligan ahora a una reprogramación en el tiempo del proyecto ante el OCAD REGIONAL o ante la Gobernación, según la nueva ley 2056 de 2020, y obviamente, realizar los ajustes dentro del aplicativo del GESPROY del DNP, tendiente a formalizar las prórrogas que necesariamente habrá que introducir a los contratos.

Es en este escenario de circunstancias sobrevinientes con ocasión de la ejecución del proyecto, que de manera comedida solicitamos su concurso y gestión, para que, a través de su despacho y ante la instancia correspondiente, se tramite y apruebe a nombre de la



Gobernación de Antioquia por las justificadas razones expuestas, nuestra solicitud de ajuste al proyecto en cuanto a su nuevo valor y plazo de programación.

Confiamos señor Gobernador, que con la aprobación de la adición de recursos al proyecto que posibiliten su terminación adecuada y el cumplimiento del objeto contractual, logremos cumplir la meta tendiente a la estructuración integral del mismo, para su futura promoción mediante una APP, como un nuevo Corredor férreo logístico de importancia estratégica nacional para la conectividad de los sistemas de transporte de carga entre el Valle de Aburrá y el puerto fluvial en Puerto Berrío y la red férrea central de la Nación.

Los recursos totales estimados para solicitud de la adición, incluidos los servicios de la interventoría y la supervisión del proyecto, se estiman en \$ 457.714.153, según se detalla a continuación:

Objeto	Contratista	Contrato No.	Valor Para Adicionar
Consultoría para estudios	Unión Temporal Estructuración Tramo 3 FDA	003 de 2020	\$ 258.194.897
Interventoría del proyecto	Consorcio Interventor Férreo Puerto Berrío - CIFBP	005 de 2020	\$ 150.519.256
Supervisión del proyecto	Ing. Luis Ovidio Rivera Guerra	017 de 2021	\$49.000.000
<b>VALOR TOTAL ADICIÓN SOLICITADA</b>			<b>\$ 457.714.153</b>

Nuestro proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Unidos por la Vida” dentro del Programa 2.5.5. “Fomento y promoción de la infraestructura férrea y logística de Antioquia y su conectividad” y se encuentra comprendido por el corredor férreo entre las estaciones de Botero (Municipio de Santo Domingo) y Puerto Berrío (en el municipio de Puerto Berrío), y cuenta con una longitud de 124,14 km.

Su vocación de servicio está enfocada principalmente al transporte de carga por lo que su recuperación está concebida en trocha yárdica para mantener la conectividad con la red férrea nacional, en particular, con el corredor central Dorada – Chiriguaná - Santa Marta.

Su implementación posibilitará a la región de Antioquia y del Eje Cafetero, una vez se recupere el ferrocarril completo de Antioquia, mejorar la integración regional y la competitividad y desarrollo de sus localidades y población.

En el estudio de factibilidad del proyecto se concibió dentro del Plan de Intervención, como se dijo arriba, poder contar con el aprovechamiento de algunos tramos del corredor de la vía actual (59%), y otros tramos con nuevo trazado, con velocidades de diseño entre 70 y



100 km/h. Para los tramos nuevos se adelantará una reconstrucción total del corredor férreo y en los que se discorra por el corredor de la línea actual se sustituirá el balasto, durmiente y rieles.

Este Tramo 3, se ha diseñado con vía sencilla, habiendo previsto diferentes apartaderos a lo largo del tramo para permitir el cruce de circulaciones que transiten en sentido contrario. Para el Tramo 3 se dispondrá una estación de carga en Puerto Berrío.

De antemano, y con el objetivo de brindar una mayor explicación y sustentación de la adición solicitada, estamos adjuntando a este escrito los informes del consultor y de la interventoría en que se convalida el monto de esta, y de parte de la Promotora estamos en la mayor predisposición para acompañar la gestión respectiva, para lo cual sería muy importante se pudiera programar las mesas técnicas que sean necesarias con Planeación Departamental y el Comité de Regalías de la Gobernación, para sustentar la necesidad de los recursos solicitados para la terminación del proyecto.

## **2. RAZONES FINANCIERAS:**

Aparte que con la adición solicitada para el proyecto por valor de **\$ 457.714.153** solamente se incrementa en un **4,78%** el valor total de los aportes del SGR al proyecto, lo cual se encuentra muy por debajo del límite máximo permitido en el Decreto 1821 de 2020 y demás normatividad vigente, que es del 20%, la importancia de que se aprueben los recursos solicitados para el proyecto está en poder cumplir con el objeto de los contratos suscritos para la ejecución del mismo, y con ello alcanzar las metas establecidas para los indicadores de producto del programa dentro del Plan de Desarrollo Departamental al 2023, en cuanto a: Tramo de vía Férrea Bello – Puerto Berrío en Activación (124 Km).

Así mismo, como bien se encuentra establecido dentro de los Talleres Regionales que dieron base y sustento al Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 *“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”*, en lo que respecta al Pacto Regional del Eje Cafetero y Antioquia, se estableció que una vez se tuviera el proyecto estructurado, al quedar incluido dentro del PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2018-2022 del PND como iniciativa de inversión regional de los proyectos en proceso de estructuración, así mismo, se plasmarán los retos y prioridades a futuro entre la nación y los territorios, que busquen desarrollar los lineamientos de política pública y las metas sectoriales para los próximos cuatro años. En conclusión, con nuestro proyecto estructurado estaremos dando un paso importante en la consecución de recursos provenientes de la Nación para la cofinanciación de la ejecución del proyecto.



Se constituye por tanto en una justificación financiera de los recursos solicitados para el proyecto, poder cumplir a cabalidad con la tarea desplegada por la Gobernación de Antioquia en los Talleres Regionales convocados por el DNP para la formulación del PND, en la que se logró incluir el proyecto dentro del Pacto Eje Cafetero y Antioquia, sirviendo al propósito de: *“Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible, varios proyectos cuyo objetivo son conectar al Eje cafetero y Antioquia para que sus productos sean comercializados a nivel nacional e internacional, generando bienestar para toda su población, y promoviendo una competitividad sostenible y amigable con el ambiente”*, como bien lo establece el Gobierno Nacional en su plan de desarrollo nacional, siendo este un logro en el cual hoy no podemos quedar en mitad de camino por parte de la región, en cuanto refiere a la estructuración del proyecto, propósito para el cual se requieren los recursos adicionales solicitados.

### **3. RAZONES JURÍDICAS:**

El presente ajuste se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.2.14. del Decreto 1821 de 2020, reglamentado mediante el numeral 8 de las Orientaciones transitorias para la Gestión de proyectos del Departamento Nacional de Planeación:

**Artículo 1.2.1.2.14. Ajustes a los proyectos de inversión.** Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora. Estos ajustes, previo trámite y aprobación, deberán registrarse por la instancia que presentó el proyecto, en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, previo a la ejecución presupuestal.

**Parágrafo transitorio 1°.** Para los proyectos de inversión registrados a 31 de diciembre de 2020, que con posterioridad a tal fecha requieran ajustes, los mismos serán tramitados conforme a las reglas del ciclo de los proyectos de inversión aplicables a la asignación que resulte de la homologación de los conceptos de gasto a que hace referencia el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020.

**Parágrafo transitorio 2°.** Aquellas solicitudes de ajustes de proyectos de inversión que no se encuentren aprobadas y debidamente registradas en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP al 31 de diciembre de 2020 a las 23:59 horas, serán cerradas automáticamente por el SUIFP, dejando los proyectos de inversión en el estado anterior a la solicitud del ajuste. Las solicitudes de ajustes registradas en el SUIFP que no hayan realizado el ajuste presupuestal en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías- SPGR en



el plazo mencionado, lo harán aplicando la homologación de conceptos de gasto a que hace referencia el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020, conforme con los lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.

## **8. LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE AJUSTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

(...)

### **8.1.1 Variables que son el marco de referencia del proyecto de inversión**

En un ajuste no es posible modificar la información que originó la presentación del proyecto de inversión, a través de la cual se establece la necesidad u oportunidad para abordar, y que establece su marco de referencia; por tal razón, no es posible cambiar el problema central, las causas del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, los productos, la localización y la población objetivo ya que cambiar estas variables implica un nuevo proyecto.

### **8.1.2 Actividades, costos y valor total del proyecto de inversión**

Como ajustes a un proyecto de inversión pueden incluirse actividades no previstas en la formulación y estructuración y estas deben ser parte del proceso para la entrega del producto al cual se asocian.

Los costos de las actividades pueden aumentar o disminuir, así como el valor total del proyecto. Si el valor total del proyecto se incrementa, deberá ser como consecuencia de un aumento en el costo de las actividades; por otra parte, si el valor total del proyecto disminuye y a su cierre los costos asociados a las actividades fueron menores, se está ante una liberación de recursos.

Aunque el valor total del proyecto no cambia, las actividades incluso así pueden aumentar o disminuir de valor, ya que puede existir una redistribución de costos entre las actividades, siempre y cuando las actividades sujetas a disminución de su presupuesto no se vean afectadas en la ejecución, lo cual no implicará un ajuste. Los mayores o menores valores de cada actividad se reportarán durante el seguimiento en la plataforma Gesproy a través del cual se visualizarán las desviaciones en las actividades.

En caso de requerir la inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado implicará un ajuste al proyecto.

Asimismo, se puede ampliar el horizonte del proyecto. Cuando el proyecto afecte presupuestos de bienalidades posteriores, se requerirá de autorización de agencias futuras,



en el marco de lo dispuesto en los artículos 157, 158 y 159 de la Ley 2056 de 2020 y únicamente podrán autorizarse para los componentes del proyecto de inversión para los cuales no se haya dado apertura al proceso de selección de contratistas.

### **8.1.3 Metas e indicadores de producto**

El *indicador principal* del producto está predefinido desde el catálogo de productos de la MGA, es único para cada producto y determina la forma en la que se mide la entrega de bienes o servicios, y no puede cambiarse durante la ejecución. Asociado al indicador principal se cuenta con metas totales y por periodo, las cuales pueden aumentar o disminuir.

Los *indicadores secundarios* para la medición del producto son opcionales, y pueden incluirse durante la ejecución del proyecto de inversión; en el mismo sentido, también podrán aumentar o disminuir en sus metas.

### **8.1.4 Fuentes de financiación**

El valor determinado para las fuentes de financiación puede aumentar o disminuir, antes de que se expida acto administrativo que ordena el proceso de apertura o el acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto, condición que aplica tanto para las fuentes SGR como aquellas diferentes a SGR. Es conveniente tener en cuenta que para las fuentes SGR también es posible hacer cambios entre las diferentes asignaciones de recursos, aún si esto implica cambio en la instancia de decisión.

Las fuentes de financiación pueden aumentar o disminuir en valor, posterior a que se expida acto administrativo que ordena el proceso de apertura o el acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto, cuando los recursos no sean suficientes para asumir los compromisos, siempre y cuando se cumpla lo señalado en el artículo 2.1.1.3.10 del Decreto 1821 de 2020, caso en el cual deberá modificarse el capítulo presupuestal independiente previa autorización de la entidad o instancia competente, según corresponda.

(...)

### **NUESTRA SOLICITUD**

Es por todo lo anterior, respetado señor Gobernador, que, sustentados en las razones expuestas nos permitimos emitir la viabilidad que según la Ley 2056 de 2020 y su decreto reglamentario 1821 de 2020 se exige, a objeto de solicitar su colaboración para que de la fuente de recursos del SGR denominada Asignación para la Inversión Regional del 60% en cabeza de los departamentos, para la vigencia 2021, se autorice el Ajuste del proyecto y se apruebe la adición presupuestal por valor de \$ 457.714.153, que hoy el proyecto está requiriendo para el cumplimiento de su objeto y la meta establecida dentro del Plan de






Desarrollo Departamental.




Estas razones se encuentran soportadas, descritas y detalladas en los documentos adjuntos al presente concepto de viabilidad de ajustes.

Para usted, nuestro sentido agradecimiento por la colaboración brindada.

Dado en el municipio de Medellín departamento de Antioquia, a los 10 días del mes de junio de 2021.

Cordialmente,

  
**GUSTAVO RUIZ AGUDELO**  
Gerente  
Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.

Proyectó:	César Augusto Hernández Ortiz – Director Técnico de Infraestructura Ferroviaria – Promotora Ferrocarril de Antioquia	
Revisó:	Hernán Jaramillo Hernández – Director Legal, Jurídico y de Contratación	
Aprobó:	Luis Pérez Carrillo – Gerente de Proyectos Promotora	
Los aquí firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente de la Entidad.		



Medellín, 11 de junio de 2021



PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S  
Centro de Gestión Documental  
Nro. Radicado: 000211 No presenta  
Fch. Rad: 11/06/2021 15:46:54

Doctora  
**CLAUDIA ANDREA GARCÍA LOBOGUERRERO**  
Directora del Departamento Administrativo de Planeación  
Gobernación de Antioquia  
ESD

**ASUNTO:** Solicitud de Ajuste Proyecto: SUIFP-SGR \_ DNP con ficha BPIN 2019000040023  
*“Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el Mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo - Puerto Berrio”.*

En mi calidad de representante legal de la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión *“Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el Mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo - Puerto Berrio”*, identificado con BPIN 2019000040023, y viabilizado, priorizado y aprobado mediante Acuerdo N.º 59 del 20 de septiembre de 2019 por el OCAD REGIONAL EJE CAFETERO del SGR - DNP, y por Acuerdo No. 60 del 11 de octubre de 2019 designada la Promotora Ferrocarril de Antioquia como entidad ejecutora y entidad designada para la contratación de la interventoría, presento de manera respetuosa ante su despacho, solicitud de ajuste al proyecto, mediante el cual se pretende: **“incrementar el valor de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), y aumentar el plazo del horizonte de trabajo para el proyecto”**, como se describe a continuación:

**1. INCREMENTAR EL VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO.**

**PARA EL CASO DE LOS RECURSOS DEL SGR SOLO PODRÁN APROBARSE CUANDO ACUMULADOS NO SUPEREN EL 20% DEL VALOR TOTAL APROBADO CON RECURSOS DEL SGR.**

Mediante esta causal que implica el aumento del valor de las fuentes que se tienen registradas desde la MGA, así como el aumento del costo de varias actividades, solicitamos respetuosamente una adición del 4.77% para poder cumplir con el objeto del proyecto.



# Ferrocarril de Antioquia

ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR INICIAL TOTAL APROBADO POR EL OCAD (1)	VALOR DE AJUSTE SOLICITADO (2)	VALOR TOTAL PROPUESTO CON AJUSTE (3=1+2)
Departamentos ANTIOQUIA / SGR - Asignación para la Inversión Regional 60%	\$ 9.576.670.807	\$ 457.714.153	\$10.034.384.960

\*Insertar en el recuadro los ajustes que se pretenden realizar.

Dicho incremento se discrimina a continuación respecto a los valores inicialmente aprobados:

Objetivo Específico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo Inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Ejecutar las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura de transporte férreo en la región del Eje Cafetero y Antioquia.	1.1. Estudios de preinversión	Factibilidad	1.1.8 Estudio de Geotecnia y Geología (Trabajo de campo)	2021	\$ 1.183.187.705	\$ 1.441.382.602	\$ 258.194.897
			1.1.33 Interventoría Integral al Contrato de Estudios Técnicos (Factibilidad Avanzada), Legales y Financieros para el Mejoramiento de la Integración de los Sistemas de Movilidad Férrea en la Región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo - Puerto Berrío.	2021	\$ 1.235.255.664	\$ 1.385.774.920	\$ 150.519.256
			1.1.34 Apoyar las Actividades del Seguimiento y Supervisión para la Elaboración de los Estudios y Diseños	2021	\$ 106.377.384	\$ 155.377.384	\$ 49.000.000



## Ferrocarril de Antioquia

Objetivo Específico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Totales							\$ 457.714.153

### 2. AMPLIAR EL HORIZONTE DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Esta causal implica la necesidad de aumentar el plazo total del proyecto en CUATRO (4) MESES ADICIONALES, respecto a los aprobados inicialmente por el OCAD REGIONAL DEL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA, que fue de 16 meses, para compensar los retrasos que experimenta el proyecto por causa de los efectos de la pandemia y otras circunstancias sobrevinientes que retrasaron la ejecución de ciertas actividades del proyecto.

AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO			
<b>Año final del proyecto en firme</b>	Julio 24 de 2021	<b>Año final del proyecto a actualizar</b>	Noviembre 27 de 2021

Para sustentar y justificar los ajustes al proyecto solicitado, nos permitimos, anexo a esta comunicación, remitir los documentos establecidos en el numeral 8.3 de las Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos expedidas por el Departamento Nacional de Planeación, y que se sintetizan en los siguientes:

1. Razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste, avalada por el supervisor o interventor.
2. Soportes, tales como: Informe mensual de la supervisión, justificación de la adición al proyecto, diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de costos. Estos documentos, firmados por el profesional competente con su respectiva tarjeta profesional
3. Como se trata de un proyecto para la ejecución de estudios y diseños de preinversión, de acuerdo con el procedimiento establecido no se contempla ejecución de componentes de infraestructura física dentro del alcance del proyecto, por lo que no se incluyen diseños, memorias y planos legibles o equivalentes de



## Ferrocarril de Antioquia

estos, ya que son los productos a obtener con el proyecto y el ajuste no los requiere, sin embargo, se adjuntan las localizaciones de los trabajos de campo de geotecnia a realizar.

4. Certificado suscrito por el Gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia en el cual se acredita la existencia del caso fortuito o la fuerza mayor que justifica la solicitud.
5. Documento de balance sobre la ejecución física y financiera del proyecto, suscrito por el supervisor o interventor, concordante con la información de GESPROY

Cordialmente,

**GUSTAVO RUIZ AGUDELO**

Gerente

Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.

Proyectó:	César Augusto Hernández Ortiz – Director Técnico de Infraestructura Ferroviaria – Promotora Ferrocarril de Antioquia	<i>César Augusto Hernández Ortiz</i>
Revisó:	Hernán Jaramillo Hernández – Director Legal, Jurídico y de Contratación	<i>Hernán Jaramillo Hernández</i>
Aprobó:	Luis Pérez Carrillo – Gerente de Proyectos Promotora	<i>Luis Pérez Carrillo</i>
Los aquí firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente de la Entidad.		



EL SUSCRITO GERENTE DE LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que el proyecto de inversión “Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo - Puerto Berrio”, identificado con BPIN 2019000040023, requiere un ajuste de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$ 457.714.153), correspondiente al 4,78%, debido a la necesidad de realizar una mayor cantidad de actividades de trabajo de campo en geotecnia y a la prórroga del plazo de los contratos de consultoría e interventoría, para cumplir con el objeto contractual y el fin del proyecto.

Estas necesidades del proyecto, producto de circunstancias sobrevinientes con ocasión de la ejecución del mismo, surgieron como consecuencia de los impactos causados por la pandemia del Covid-19 durante el año 2020 que retrasaron la ejecución de las actividades del contrato de consultoría, y de las condiciones técnicas y estado de deterioro en que se encuentra la red férrea nacional existente, que obligan a presentar otras alternativas de trazado y a realizar estudios adicionales de trabajo de campo en geotecnia.

En tal sentido, y como se detalla en el concepto de viabilidad (“anexo 3 Certificación de razones técnicas, financieras y jurídicas”) expedido por el suscrito, y proyectado por el supervisor del proyecto, las causas que se invocan para justificar la necesidad del ajuste del proyecto responden a circunstancias propias de caso fortuito o fuerza mayor, por constituir hechos extraños a las partes contratantes y ejecutoras, imprevisibles e irresistibles, y, por tanto, no podían ser controlados por el consultor.

Este certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del numeral 8.3 de las Orientaciones Transitorias para la gestión de proyectos de inversión, expedidas por el Departamento Nacional de Planeación.




Dado en el municipio de Medellín departamento de Antioquia, a los 11 días del mes de junio de 2021.

Cordialmente,

  
**GUSTAVO RUIZ AGUDELO**

Gerente

Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.

Proyectó:	César Augusto Hernández Ortiz - Director Técnico de Infraestructura Ferroviaria - Promotora Ferrocarril de Antioquia	
Revisó:	Hernán Jaramillo Hernández - Director Legal, Jurídico y de Contratación	
Aprobó:	Luis Pérez Carrillo - Gerente de Proyectos Promotora	
Los aquí firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente de la Entidad.		



**Ferrocarril  
de Antioquia**

**INFORME DE REPORTE DEL APLICATIVO GESPROY DNP**


**SOBRE AVANCE DEL PROYECTO**

PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S			
Fecha	15/06/2021	Entidad territorial	PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S
Región	NA	Tipo de OCAD	
Población étnica			
Entidad Habilitada		Entidad con adecuado desempeño	

\*Cifras en millones de pesos

### SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

#### 1. SALDOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">Inversión</th> <th style="width:70%;">2019-2020<sup>1</sup></th> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INVERSIÓN</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> </tr> </table> <p><small><sup>1</sup>Incluye Presupuesto 2019-2020 Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018 y saldos de vigencias anteriores. El valor puede variar a partir de aprobaciones de proyectos o ajustes registrados en SUIFP, desaprobarción de proyectos o liberación de saldos.</small></p> <p><small>Fuente: SICODIS - Grupo de Financiamiento Territorial - DIFP - DNP / <a href="https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestalSGR_v6.aspx">https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestalSGR_v6.aspx</a></small></p> <p><small>Fecha de corte:</small></p>	Inversión	2019-2020 <sup>1</sup>	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	
Inversión	2019-2020 <sup>1</sup>				
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>0</b>				

#### 2. ASIGNACIONES Y SALDOS RECURSOS FORTALECIMIENTO

Conceptos	Fortalecimiento SSEC <sup>2</sup>	Fortalecimiento SGR <sup>3</sup>	Total General
<small><sup>2</sup>Recursos para el Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación en la entidad; Resoluciones 1790 de 2013, 1083 de 2014 y 2902 de 2014.</small> <small><sup>3</sup> Recursos para Secretarías Técnicas de Planeación: Resoluciones 0002 de 2012, 1730 de 2012, 0001 de 2013, 0006 de 2013, 0639 de 2013, 2323 de 2013, 0008 de 2014, 0135 de 2015, 1308 de 2015, 1400 de 2015, 2687 de 2016, 3680 de 2016, 1145 de 2017, 1459 de 2017, 3364 de 2017, 3366 de 2017, 4640 de 2017 y 2178 de 2018.</small>			
<small>Fuente: SPGR - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aplicativo de Cuentas SGR.</small> <small>Fecha de corte:</small>			

#### 3. CUENTAS BANCARIAS MAESTRAS VIGENTES -SGR

No. de Cuenta	Banco	Fuente de Recursos	Autorizada / Registrada / Sustituida	Saldo
<b>No. total cuentas</b>	<b>0</b>			

Fuente: SSEC - DVR - DNP  
Fecha de corte:

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

#### 4. BALANCE PROYECTOS VERIFICADOS DNP (A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCR (60%), FDR y ASIGNACION PARA LA PAZ)<sup>4</sup>

TIPO DE OCAD	Total Proyectos		Cumple Aprobado OCAD		Cumple Pendiente de Aprobación		No Cumple		% Cumplimiento	Promedio Revisiones
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		





El futuro  
está en todos

DNP  
Departamento Nacional  
de Planeación

FICHA RESUMEN ENTIDAD  
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



Sistema General de Regalías

4 Artículo 28 Ley 1530 de 2012 y Decreto 865 de 2018.

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel

Fecha de corte:

Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP

5. PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S COMO ENTIDAD BENEFICIARIA<sup>5</sup>

Distribución de recursos SGR por sector<sup>7</sup>

Tipo de ejecutor designado	No. Entidades	No. Proyectos	Valor SGR	Valor Total <sup>6</sup>
TOTAL	0	0	0	0

<sup>5</sup> Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad ejecutado por diferentes entidades de orden nacional o territorial.

<sup>6</sup> Incluye valor del total de las fuentes aprobadas.

<sup>7</sup> El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo con la destinación del recurso

<sup>8</sup> Proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado en SUIFP-SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR

Fecha de corte:

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP..

No data to display

6. INFLEXIBILIDADES<sup>9</sup>

No presenta información

<sup>9</sup> Inflexibilidades: Compromisos con cargo a recursos de regalías del régimen vigente a 31 de diciembre de 2011, que en aplicación de los artículos 144 de la Ley 1530 de 2012 y Artículo 2.2.4.1.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 se financian con cargo a recursos del SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR y Archivo Excel para los compromisos.

Fecha de corte:

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

7. PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S COMO EJECUTOR DE PROYECTOS

7.1 Estado de proyectos

Estado de proyectos	No.	%	Valor SGR	%	Valor Total <sup>6</sup>	%
2 EN EJECUCIÓN	1	100%	9,577	100%	9,577	100%
TOTAL GENERAL	1	100%	9,577	100%	9,577	100%

PROYECTOS



■ TERMINADO ■ EN EJECUCION ■ SIN CONTRATAR

VALOR SGR



■ TERMINADO ■ EN EJECUCION ■ SIN CONTRATAR

	No.	Valor SGR	Valor Total <sup>6</sup>
Proyectos sin cerrar <sup>11</sup>	1	9,577	9,577
Proyectos aprobados como entidad habilitada	0	0	0
Proyectos con enfoque diferencial	0	0	0



	No.	Valor SGR	Valor Total <sup>6</sup>
Proyectos aprobados por OCAD PAZ	0	0	0


<sup>6</sup>Incluye todas las fuentes aprobadas.

<sup>7</sup>El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo a la destinación del recurso.

<sup>8</sup>De los 0 proyectos sin contratar 0 se encuentran en riesgo de liberación de recursos.


<sup>9</sup>Corresponde al número de proyectos que la entidad actualmente debe administrar.

### 7.2 Fuentes de Financiación<sup>6</sup>

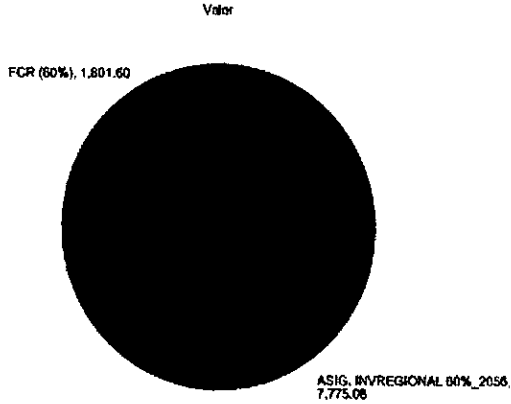

ASIG. INVREGIONAL 60% 2056	81.19%
FCR (60%)	18.81%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### 7.3 Sectores de Inversión<sup>7</sup>

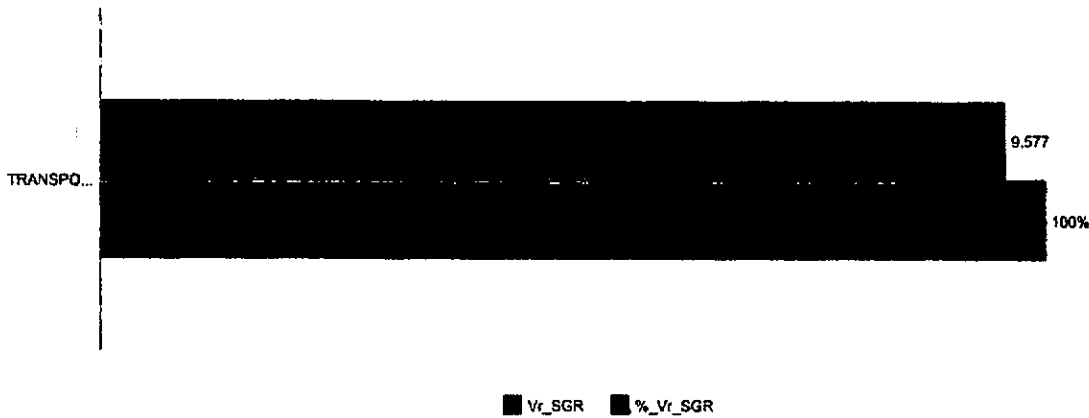

### 7.4 Contratación



El futuro es de todos


**FICHA RESUMEN ENTIDAD**  
**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**



<b>% recursos contratados/ recursos aprobados</b>	96.14	%
---	-------	---

No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Interventoría	1,235	555	45
4	Ejecución inversión	7,972	2,954	37
<b>TOTAL</b>		<b>9,207</b>	<b>3,510</b>	

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR  
Fecha de corte: 15/06/2021  
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

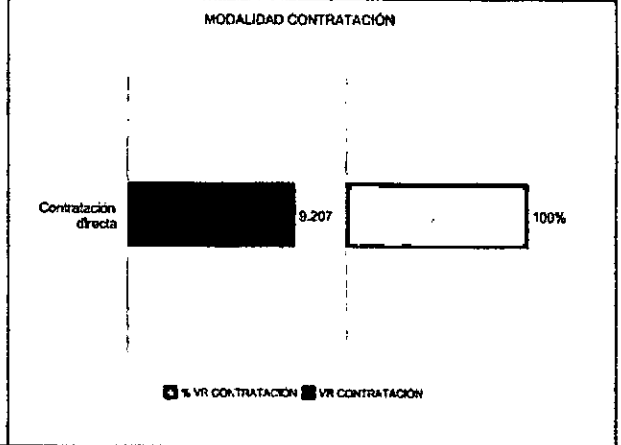

**8. ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS - IGPR**

<b>Meta Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 -2022</b>	72 / 100	<b>Promedio nacional último trimestre medido</b>
--	----------	--

**Histórico de Resultados**

No data to display

**Resultados IGPR**

Resultado entidad	Rango <sup>17</sup>
Puesto Nacional	
Puesto departamental	
Puesto ejecutor similar	

<sup>17</sup>El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a "Techo Alto"; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a "Techo Alto" y mayor o igual a "Promedio"; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que "promedio" y mayor o igual que "Techo Bajo" o 4. Insuficiente (Rojo), Si Resultado es menor que "Techo Bajo".  
Donde:  
• Promedio. Es el promedio de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.  
• DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.  
• Techo Alto = (Promedio + 1 DesvEst).  
• Techo Bajo = (Promedio - 1 DesvEst).

**Resultados IGPR por Categoría**

No data to display

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR  
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.




**9. INDICADORES DE GESTIÓN**



El futuro es de todos

## FICHA RESUMEN ENTIDAD SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



<b>9.1 Consistencia en la programación de proyectos</b>  <div style="text-align: center;">  <p>Consistente, 1</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Consistente</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table> </div>	Consistente	100%	<b>9.2 Retraso en la ejecución de proyectos</b>  <div style="text-align: center;"> <p>2. entre 6 - 12 meses <span style="background-color: black; color: black;">██</span> 1</p> <p>■ PROYECTOS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">N. Proyectos</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. de proyectos en ejecución</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con programación inconsistente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. entre 6 - 12 meses</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> </div>		N. Proyectos		No. de proyectos en ejecución	1		Con programación inconsistente			2. entre 6 - 12 meses	1	100%					
Consistente	100%																			
	N. Proyectos																			
No. de proyectos en ejecución	1																			
Con programación inconsistente																				
2. entre 6 - 12 meses	1	100%																		
<b>9.3 Adición de recursos en proyectos</b>  <div style="text-align: center;"> <p>1.0 <span style="background-color: black; color: black;">██</span> 1</p> <p>■ PROYECTOS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Rangos de adición</th> <th>No. de proyectos</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Rangos de adición	No. de proyectos	%	1.0	1	100%	<b>9.4 Cumplimiento en la terminación de proyectos</b>  <div style="text-align: center;">  <p>No data to display</p> </div>													
Rangos de adición	No. de proyectos	%																		
1.0	1	100%																		
<b>9.5 Cierre de proyectos</b>  <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;"> <p>No data to display</p> </div>																			
<p>Fuente: Gesproy-SGR Fecha de corte: Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.</p>																				
<b>10. ALERTAS Trimestre 1 - 2021</b>																				
No. de alertas como Secretaria Técnica	0																			
No. de proyectos con alertas	1																			
<b>% proyectos con alertas</b>	100.00%																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aplicativo Tipo de Alerta</th> <th colspan="4">No. de eventos sin subsanar</th> </tr> <tr> <th>Gesproy - SGR</th> <th>Cuentas - SGR</th> <th>ST OCAD</th> <th>F-SVC - 17 - 18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Información incompleta-ICO</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><b>Total Eventos</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Aplicativo Tipo de Alerta	No. de eventos sin subsanar				Gesproy - SGR	Cuentas - SGR	ST OCAD	F-SVC - 17 - 18	Información incompleta-ICO	0	0	0	0	<b>Total Eventos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aplicativo Tipo de Alerta		No. de eventos sin subsanar																		
	Gesproy - SGR	Cuentas - SGR	ST OCAD	F-SVC - 17 - 18																
Información incompleta-ICO	0	0	0	0																
<b>Total Eventos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
<b>DETALLE ALERTAS CUENTAS MAESTRAS OTROS PAGOS</b>																				
La entidad tiene sin subsanar alertas por OTROS PAGOS*	NO																			
Valor de OTROS PAGOS	0																			



El futuro es de todos

## FICHA RESUMEN ENTIDAD SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



\*Corresponde a pagos registrados en el aplicativo Cuentas SGR Sin asociar un proyecto aprobado o concepto de gasto.

Fuente: SUIFF -SGR, Gesproy-SGR

Fecha de corte: 15/06/2021

Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

### 11. VISITAS DEL SSEC

Componente del SSEC	No. de proyectos visitados	Valor SGR de proyectos visitados	% de recursos SGR visitados
Seguimiento			
Evaluación			
Control Social			

#### 11.1 Seguimiento a proyectos del SGR

No data to display

#### Planes de Mejora

<sup>13</sup>Un proyecto puede tener más de un plan de mejora.

#### Proyectos Críticos

No. de proyectos críticos	Valor SGR	% Valor SGR <sup>14</sup>	Valor total	% Valor total <sup>14</sup>
---------------------------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------------------

<sup>14</sup>El % Valor SGR corresponde a la relación entre la suma del valor SGR de los proyectos críticos y la suma del valor SGR de los proyectos sin cerrar de la entidad.

<sup>14</sup>El % Valor Total corresponde a la relación entre la suma del valor total de los proyectos críticos y la suma del valor total de los proyectos sin cerrar de la entidad.

Fuente: Gesproy-SGR y Archivo Excel

Fecha de corte:

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

#### 11.2 Evaluación a proyectos del SGR

#	BPIN	Nombre	Sector	Valor total ejecutado	Planeación	Ejecución	Eficacia y Efectos	Operación y Sostenibilidad	Participación	ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN <sup>15</sup>
---	------	--------	--------	-----------------------	------------	-----------	--------------------	----------------------------	---------------	---

<sup>15</sup>El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a "Techo Alto"; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a "Techo Alto" y mayor o igual a "Promedio"; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que "promedio" y mayor o igual que "Techo Bajo" o 4. Insuficiente(Rojo), Si Resultado es menor que "Techo Bajo".

Donde:

- Promedio. Es el promedio de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
- DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
- Techo Alto = (Promedio + 1 DesvEst).
- Techo Bajo = (Promedio - 1 DesvEst).

Fuente: Gesproy-SGR - SSEC y Archivo Excel

Fecha de corte:

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP/ <https://www.sgr.gov.co/SMSCE/Evaluaci%C3%B3nSGR.aspx>

#### 11.3 Control Social a proyectos del SGR

No data to display	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Proyectos con Auditoría Visible</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">BPIN</th> <th>Proyecto</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">           Fuente: SSEC - DVR - DNP            Fecha de corte:            Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP         </td> </tr> </table>	Proyectos con Auditoría Visible		BPIN	Proyecto	Fuente: SSEC - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP	
Proyectos con Auditoría Visible							
BPIN	Proyecto						
Fuente: SSEC - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP							

## 12. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DEL SSEC

### 12.1. Medidas Vigentes

TOTAL MEDIDAS VIGENTES							0
No. PAP	BPIN	Causal	Descripción	No. Resolución	Fecha	Estado	Valor Retenido en MHCP

Fuente: SSEC - Módulo de control, Subdirección de Control SdC - DVR - DNP  
 Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dn.gov.co

### 12.2. Procedimientos Correctivos y Sancionatorios - PACS

TOTAL PACS			0
No.	BPIN	Causal	Estado

Fuente: SSEC - Módulo de control, Subdirección de Control SdC - DVR - DNP  
 Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dn.gov.co

## 13. OTROS RECURSOS ANTERIOR SISTEMA DE REGALÍAS (CAUSADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

**Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro**

**Con recursos retenidos en Agencias**

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel

Fecha de corte: -

Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP.

## 14. DATOS DE CONTACTO

Región	Consultor asignado	Email consultor	Líder oficina regional	Email líder oficina regional	Teléfono oficina regional	Dirección	Enlace gestión sedes	Correo	Extensión
EJE CAFETERO	IDALIA JIMÉNEZ	ijimenez@dn.gov.co	ESTHER ADRIANA ROMERO ESCUDERO	eromero@dn.gov.co	(094) 2669652	MEDELLIN - ANTIQUIA CARRERA 43 A NO. 1 SUR-220 OFICINA 601, EDIFICIO PORVENIR	JUAN FELIPE PERTUZ SOCORRAS	jupertuz@dn.gov.co	PBX :(57+1) 381 50 00. EXTENSIÓN 11054



El futuro  
es de todos

**FICHA RESUMEN ENTIDAD**  
**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**



**ANEXO N1. USUARIOS ACTIVOS APLICATIVOS GESPROY Y CUENTAS -SGR**

No.	Nombre USUARIO	Aplicativo	Perfil	TOTAL USUARIOS	
				1	
				Vigencia del usuario	
				desde	hasta
1	HERNANDEZ ORTIZ CESAR AUGUSTO	GESPROY - SGR	ELABORA Y REVIS	16/03/2020	31/12/2021

Fuente: SSEC - DVR - DNP  
 Fecha de corte: 15/06/2021  
 Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.





El futuro  
es de todos



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

Ejecutor: ANTIQUIA Código entidad: 6666741 Nit Ejecutor: 900988911-1																
REGIO N	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENT O REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CON TRA TADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUB A Y ENVIA	% EJECUCI ÓN FINANCIE RA	% EJECUCI ÓN FISICA
EJE CAFET ERO	DEPART AMENT O DE ANTIOQ UA	2019000040023	Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo: Santo Domingo, Puerto Bello	TRANSPOR TE	DEPARTA MENTALES	Sep 20, 2019	Nov 21, 2019	9,576,870,807	9,576,870,807	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	9,207,254,747	3,509,523,862	Jun 12, 2021	37.00	44.00
Totales: Nro. Proyectos: 1.00 Valor aprobado proyecto: 9,576670807E9 Valor proyecto incluyendo fuentes no aprobadas: 9,576670807E9 Valor contratado:9,207254747E9 Valor pagos:3,50952386208E9																



**INFORME DE REPORTE DEL SUPERVISOR  
SOBRE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO  
CORTE A MAYO 31 DE 2021**

**BALANCE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO  
CORTE A MAYO 31 DE 2021  
INFORME DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO**

**A. CONTRATOS DEL PROYECTO**

**1. INTERVENTORÍA**

No. DE INTERVENTORÍA	CONTRATO	005 DE 2020
OBJETO	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES REGULAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES EL CONSULTOR SE OBLIGA A REALIZAR PARA LA PROMOTORA, "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS TÉCNICOS (FACTIBILIDAD AVANZADA), LEGALES Y FINANCIEROS PAJRA EL MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD FÉRREA EN LA REGIÓN DEL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA - TRAMO SANTO DOMINGO - PUERTO BERRIO."	
CONTRATANTE	SOCIEDAD PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.	
NIT	900988911-1	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTOR FÉRREO PUERTO BERRIO - CIFBP	
NIT	901.371.335-1	
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO FERNÁNDEZ CARPINTERO, cédula de extranjería 395.478	

**2. CONSULTORÍA**

CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3 FDA conformada por: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 70% - Euroestudios Ingenieros de Consulta SAS Nit:900753174-9</li> <li>▪ 15% - Duran &amp; Osorio Abogados Asociados Nit: 830010327-7</li> <li>▪ 15% - Profit Banca de Inversión SAS Nit: 900742786-9</li> </ul>	
NIT	901.361.810-6	
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR JOSÉ SANCHEZ APONTE	
C.C.	DE EXTRANJERÍA 345.220	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	DE	PERFECCIONAMIENTO: 11 de febrero 2020 LEGALIZACIÓN: 11/02/2020
FECHA DE INICIO	24/03/2020	
PLAZO	DIECISEIS (16) MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.	
VALOR CONTRATO DE CONSULTORÍA	\$ 7.865.762.712,00 COP	



VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M.L. (\$1.235.192.035) INCLUYENDO IVA.
ADICIONES (si aplica)	\$
PRORROGAS (si aplica)	Primera prórroga hasta el:
<b>3. SUPERVISIÓN</b>	
No. DE CONTRATO	06 de 2020; 11 de 2020 y 017 de 2020
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, CONSISTENTES EN ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, ASOCIADAS AL PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA Y SU INTEGRACIÓN AL SISTEMA FÉRREO NACIONAL.
CONTRATISTAS	Julio Castro Guamán / Luis Ovidio Rivera Guerra
VALOR	\$12.740.000 / \$ 66.120.000 / \$27.440.000 (Total: \$106.300.000)

## B. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

### 1. BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA (RELACIÓN DE PAGOS)

Acta de Pago Parcial N.	Producto	Factura No	Valor Total (incluido IVA)	Fecha de Radicación y Pago	Orden de Pago No.	Valor acumulado
1	Informe de Interventoría del Periodo 1 DE 10 DE ABRIL AL 30 2020.	Factura 001 de junio 11 de 2020	38.599.752	26-06-2020 /	651126320 de 2020-07-07	38.599.752
2	Informe de Interventoría del Periodo 2 DE 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020	Factura 002 de junio 16 de 2020	38.599.752	26-06-2020 /	651127020 de 07-07-2020	77.199.504
3	Informe de Interventoría del Periodo 3 DE 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020	Factura 003 de julio 21 de 2020	38.599.752	31-07-2020	1120 de 2020-08-03 (obligación pptal)	115.799.256
4	Aprobación METODOLOGÍA	Factura 004 de Julio 22 de 2020	16.174.840	31-07-2020	1220 de 2020-08-03 (obligación pptal)	131.974.096
5	Informe de	Factura No.	38.599.752	25-09-2020	70239320	170.573.848



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



	Interventoría del Periodo 4 DEL 1° DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2020	CPB-3 de septiembre 22 de 2020		/ 28-09-2020	de 2020-09-25	
6	Informe de Interventoría del Periodo 5 DEL 1° DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	Factura No. CPB-2 de septiembre 16 de 2020	38.599.752	25-09-2020 / 28-09-2020	70239120 de 2020-09-25	209.173.600
7	Informe de Interventoría del Periodo 6 DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Factura No. CPB-4 de Octubre 13 de 2020	38.599.752	20-10-2020 /	71296020 de 2020-10-26	247.773.352
8	Aprobación REVISIÓN PREFACTIBILIDAD	Factura No. CPB-5 de Octubre 22 de 2020	27.902.988,01	23-10-2020 /	71296220 de 2020-10-26	275.676.340,01
9	Aprobación DEBIDA DILIGENCIA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA	Factura No. CPB-6 de Octubre 22 de 2020	14.062.660,99	23-10-2020 /	71296420 de 2020-10-26	289.739.001
10	Aprobación del producto 3 AJUSTE AL ESTUDIO DE DEMANDA	Factura CPB-7 de noviembre 11 de 2020	25.846.393	25-11-2020	74632820 de 2020-11-26	315.585.394
11	Informe de Interventoría del Periodo 7 del 1° de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE de 2020	Factura No. CPB-8 de Noviembre 12 de 2020	38.599.752	25-11-2020	74634020 de 2020-11-26	354.185.146
12	Aprobación del producto Entregable No. 5 Corroboración del Plan de Intervención para el Corredor	Factura CPB-9 de 17/12/2020	3,279,435.00	28/12/2020	760463 de 2020-12-23	357.464.581
13	Aprobación del producto Entregable No. 21 Material Rodante	Factura CPB-10 de 17/12/2020	4,835,777.00	28/12/2020	76046920 de 2020-12-23	362.300.358
14	Informe de Interventoría del Periodo 8 del 1° de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2020	Factura CPB-11 de 17/12/2020	38,599,752.00	28/12/2020	76056320 de 2020-12-23	400.900.110

15	Informe de Interventoría del Periodo 9 del 1° de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2020	Factura No. CPB-15 de 11/03/2021*	38,599,752.00	23 de marzo de 2021	439.499.862
16	Informe de Interventoría del Periodo 10 del 1° de ENERO al 30 de ENERO de 2021	Factura No. CPB-14 de 03/03/2021**	38,599,752.00	23 de marzo de 2021	478.099.614
17	Informe de Interventoría del Periodo 11 del 1° de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2021	Factura No. CPB-16 de 18/03/2021	38,599,752.00	23 de marzo de 2021	516.699.366
18	Informe de Interventoría del Periodo 12 del 1° de MARZO al 30 de MARZO de 2021	Factura No. CPB-17 de 20/04/2021	38,599,751.54		555.299.118
19	Informe de Interventoría del Periodo 13 del 1° de ABRIL al 30 de ABRIL de 2021	Factura No. CPB-18 de 19/05/2021	38,599,751.54		593.898.869,54

## 2. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORÍA (RELACIÓN DE PAGOS)

Acta de Pago N.	Producto	Factura No	Valor Total (incluido IVA)	Fecha de Radicación y Pago	Orden de Pago No.	Valor acumulado
<b>FASE 1</b>						
ACTA PARCIAL No. 1	Metodología y organización de los trabajos (VI). Contra Entrega	Factura FE_001 de junio 26 de 2020	101.970.695	Junio 26 de 2020 / julio 10 de 2020	65124520 de 2020-xx-xx	101.970.695
ACTA PARCIAL No. 2	Metodología y organización de los trabajos. Contra aprobación (VF)	Factura FE-002 de 24/07/2020	101.970.695	30 de julio de 2020 / 2020-08-03	66029120 de 2020-08-03	203.941.390
ACTA PARCIAL No. 3	Ajuste al Estudio de Demanda 4,65% - Contra Entrega (VI)	Factura Electrónica FE- 003 de 24/07/2020	162.942.863	30 de julio de 2020 / 2020-08-03	CE 2020-00296 de 2020-08-30	366.884.253
ACTA PARCIAL	Debida diligencia	Factura Electrónica	88.654.935	30 de julio de 2020 / 2020-	CE 2020-00297 de	455.539.188



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



No. 4	técnica, legal y financiera 2,53% - Contra Entrega (VI)	De Venta No. FE-004 de 24/07/2020		08-03	2020-08-30	
ACTA PARCIAL No. 5	Revisión de la prefactibilidad realizada al tramo 3 - 5,02% - Contra Entrega (VI)	Factura Electrónica De Venta No. FE-005 de 24/07/2020	175.908.209	30 de julio de 2020 / 2020-08-03	CE 2020-00298 de 2020-08-30	631.447.397
ACTA PARCIAL No. 6	Corroboración del Plan de intervención para el corredor - 0,59%- Contra Entrega (VI) Descuento \$4.740.938 (IVA incluido) por Mayor valor facturado. 100% Metodología y organización de los trabajos	Factura de Venta No. FE 008 de 05/10/2020	15.452.922	14 de octubre de 2020	71296620 de 2020-10-26	646.900.319
<b>FASE II</b>						
ACTA PARCIAL No. 7	Estudio de Diseño Geométrico - 5,78% - Contra Entrega (VI)	Factura de Venta No. FE 009 de 05/10/2020	204.676.752	14 de octubre de 2020	71297020 de 2020-10-26	851.577.071
ACTA PARCIAL No. 8	Revisión de la prefactibilidad realizada al tramo 3 - 5,02% - Contra Aprobación (VF)	Factura de Venta No. FE -010 de 22/10/2020	167.729.684	22 de octubre de 2020	71297320 de 2020-10-26	1.019.306.755
ACTA PARCIAL No. 9	Debida diligencia técnica, legal y financiera - 2,53% - Contra Aprobación (VF)	Factura de Venta No. FE -011 de 22/10/2020	84.533.086	22 de octubre de 2020	71297620 de 2020-10-26	1.103.839.841

ACTA PARCIAL No. 10	Ajuste al de Estudio DEMANDA (Aprobación) (VF)	Factura FE- 12 de noviembre 17 de 2020	155.367.137	25-11-2020	74634620 de 2020-11-26	1.259.206.978
ACTA PARCIAL No. 11	Corroboración del Plan de intervención para el corredor - 0,59%- Contra Aprobación (VF)	Factura FE- 13 de diciembre 17 de 2020	20.193.860	28/12/2020	76048220 de 2020-12-23	1.279.400.838
ACTA PARCIAL No. 12	Material rodante - 0,87% - Contra Entrega y Aprobación (VF)	Factura FE- 14 de diciembre 17 de 2020	59.554.775	28/12/2020	76048720 de 2020-12-23	1.338.955.613
ACTA PARCIAL No. 13	Estudio Ambiental - 1,92% - Contra Entrega VI	Factura FE -19 de 10/03/2021	131.431.226	23 de marzo de 2021		1.470.386.839
ACTA PARCIAL No. 14	Estudio Social - 2,57% - Contra Entrega VI	Factura FE-20 de 10/03/2021	175.926.172	23 de marzo de 2021		1.646.313.011
ACTA PARCIAL No. 15	Inventario y relocalización de redes de servicios públicos - 0,98% - Contra Entrega VI	Factura FE-21 de 10/03/2021	66.742.419	23 de marzo de 2021		1.713.055.430
ACTA PARCIAL No. 16	Acta 01 por trabajos de campo Periodo enero	Factura FE-22 de 10/03/2021	246.023.633	23 de marzo de 2021		1.959.079.063
ACTA PARCIAL No. 17	Diseño de Infraestructura y superestructura de la vía - 1,15% - Contra Entrega	Factura FE-23 de 16/03/2021	78.721.828	23 de marzo de 2021		2.037.800.891
ACTA PARCIAL No. 18	Diseño de estaciones, edificaciones y plataformas de carga - 2,30% - Contra Entrega	Factura FE-24 de 16/03/2021	157.443.656	23 de marzo de 2021		2.195.244.547



ACTA PARCIAL No. 19	Estudio Predial - 2,72% - Contra Entrega	Factura FE-25 de 16/03/2021	186.194.237	23 de marzo de 2021		2.381.438.784
ACTA PARCIAL No. 20	TRABAJOS DE CAMPO SEGÚN ACTA No. 002 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	Factura FE-26 de 16/03/2021	483.391.017	23 de marzo de 2021		2.864.829.801
ACTA PARCIAL No. 21	Operación y mantenimiento - 1,565% - Contra Entrega	Factura No. FE-27 de 07/05/2021	107.130.140			2.971.959.941
ACTA PARCIAL No. 22	Patios y talleres - 0,33% - Contra Entrega	Factura No. FE-28 de 07/05/2021	22.589.741			2.994.549.682
ACTA PARCIAL No. 23	Puesto de Control Central Operacional - PCO - 0,33% - Contra Entrega	Factura No. FE-29 de 07/05/2021	22.589.741			3.017.139.423
ACTA PARCIAL No. 24	Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación - 2,39% - Contra Entrega	Factura No. FE- 30 de 07/05/2021	163.604.495			3.180.743.918
ACTA PARCIAL No. 25	Sistema de seguridad, señalización y control - 0,955% - Contra Entrega	Factura No. FE- 31 de 18/05/2021	65.373.344			3.246.117.262
ACTA PARCIAL No. 26	Trabajos de Campo según acta No. 003 de 1 al 31 de marzo.	Factura No. FE- 32 de 18/05/2021	290.917.486			3.537.034.748

(VI): Versión Inicial contra entrega del producto a revisión de la interventoría

(VF): Versión final aprobada por Interventoría

### 3. BALANCE FINANCIERO DE LA SUPERVISIÓN

Acta de	Producto	Factura No	Valor Total	Fecha de	Orden de	Valor
---------	----------	------------	-------------	----------	----------	-------



Pago Parcial N.				Radicación y Pago	Pago No.	acumulado
<b>Supervisor Julio Castro Guamán</b>						
1	Primer pago Periodo desde el 9 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo de 2020	CUENTA DE COBRO N.º 1 de abril 3 de 2020	\$5.390.000		61692320 de 2020-04-20	5.390.000,00
2	Periodo 2 DEL 1º de abril de 2020 al 30 de abril de 2020	CUENTA DE COBRO N.º 2 de mayo de 2020	7.350.000,00		63674320 de 2020-05-20	12.740.000
<b>Supervisor Luis Ovidio Rivera Guerra</b>						
3	Periodo 1 DE 11 DE MAYO 2020 AL 31 DE MAYO de 2020	Cuenta de Cobro CC-1 de 26/06/2020	4.900.000,00	Junio 26 de 2020 / Julio 22 de 2020	65596720 de 2020-07-17	17.640.000
4	Periodo 2 Del 1º de Junio al 30 de junio de 202	Cuenta de Cobro CC-2 de Julio 15 de 2020	7.350.000	Julio 31 de 2020 /agosto 14 de 2020	66415120 de 2020-08-12	24.990.000
5	Periodo 3 Del 1º de Julio al 30 de julio de 2020	Cuenta de Cobro CC-3 de septiembre 01 de 2020	7.350.000	01-09-2020 / 28-09-2020		32.340.000
6	Periodo 4 Del 1º de Agosto al 31 de agosto de 2020	Cuenta de Cobro No. 004 de septiembre 18 de 2020	7.350.000	18-09-2020 / 28-09-2020		39.690.000
7	Periodo 5 Del 1º de Septiembre al 30 de septiembre de 2020	Cuenta de Cobro No. 005 de octubre 19 de 2020	7.350.000	19-10-2020 /		47.040.000
8	Periodo 6 Del 1º de Octubre al 30 de octubre de 2020	Cuenta de Cobro No. 006 de noviembre 19 de 2020	7.350.000	25-11-2020 /		54.390.000
9	Periodo 7 Del 1º de Noviembre al 30 de noviembre de 2020	Cuenta de Cobro No. 007 de diciembre 19 de 2020	7.350.000	19-12-2020 / 28-12-2020		61.740.000
10	Periodo 8 Del 1º de Diciembre al 31	Cuenta de Cobro No. 008	7.350.000	05-04-2021 /		69.090.000

	de diciembre de 2020	de abril 05 de 2021				
11	Periodo 9 Del 1° de Enero al 30 de enero de 2021	Cuenta de Cobro No. 009 de abril 05 de 2021	7.350.000	05-04-2021 /		76.440.000
12	Periodo 10 Del 1° de febrero al 28 de febrero de 2021	Cuentas de Cobro No. 010 de abril 5 de 2021/ 11 de	2.420.000			78.860.000
13	Periodo 11 Del 1° de Marzo al 30 de marzo de 2021		10.237.500			89.097.500
14	Periodo 12 Del 1° de Abril al 30 de abril de 2021		7.402.500			96.500.000
15	Periodo 13 del 1° de Mayo al 30 de mayo de 2021		7.350.000			<b>103.850.000</b>
<b>SUBTOTAL PAGADO A MAYO 30 De 2021</b>						<b>103.850.000</b>

#### 4. RESUMEN PAGOS DEL PROYECTO

No.	Descripción	Contrato No.	Contratista	Valor pagado a Mayo 30 de 2021
1	Consultoría	003 de 2020	Unión temporal estructuración tramo 3 FDA	3.537.034.748
2	Interventoría	005 de 2020	CONSORCIO INTERVENTOR FÉRREO PUERTO BERRIO - CIFBP	593.898.869,54
3	Supervisión	006 de 2020 / 11 de 2020 / 017 de 2021	Julio Castro Guamán / Luis Ovidio Rivera Guerra	103.850.000

**TOTAL PAGADO EN PROYECTO**

**4.234.783.617,54**

#### **4. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

##### **1) Avance del proyecto:**

De acuerdo con el cronograma, a la fecha del día **433** de iniciado el contrato, el consultor debía haber entregado los siguientes productos, según los cronogramas que se presentan a continuación:

- Metodología general del trabajo **(Entregado y aprobado)**
- Revisión de la prefactibilidad realizada al tramo 3. **(Entregado y aprobado)**
- Ajuste al Estudio de Demanda. **(Entregado y aprobado)**
- Debida diligencia técnica, legal y financiera. **(Entregado y aprobado)**
- Corroboración del Plan de intervención para el corredor. **(Entregado y aprobado)**
- Estudio de Diseño Geométrico **(Entregado)**
- Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación
- Estudio de Geotecnia y Geología
- Diseño de Túneles
- Diseño de Puentes, Pontones y Viaductos
- Estudio Ambiental **(Entregado)**
- Estudio Social **(Entregado)**
- Estudio Predial **(Entregado)**
- Inventario y relocalización de redes de servicios públicos **(Entregado)**
- Diseño de Infraestructura y superestructura de la vía
- Diseño de estaciones, edificaciones y plataformas de carga
- Material rodante. **(Entregado y aprobado)**
- Estudio Ambiental - 1,92% - **Contra Entrega VI**
- Estudio Social - 2,57% - **Contra Entrega VI**
- Inventario y relocalización de redes de servicios públicos - 0,98% - **Contra Entrega VI**
- Acta 01 por trabajos de campo **Periodo enero**
- Diseño de Infraestructura y superestructura de la vía - 1,15% - **Contra Entrega**
- Diseño de estaciones, edificaciones y plataformas de carga - 2,30% - **Contra Entrega**
- Estudio Predial - 2,72% - **Contra Entrega**
- Trabajos de campo según acta no. 002 del 1 al 28 de febrero
- Operación y mantenimiento - 1,565% - **Contra Entrega**
- Patios y talleres - 0,33% - **Contra Entrega**
- Puesto de Control Central Operacional - PCO - 0,33% - **Contra Entrega**
- Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación - 2,39% - **Contra Entrega**
- Sistema de seguridad, señalización y control - 0,955% - **Contra Entrega**
- Trabajos de Campo según acta No. 003 de 1 al 31 de marzo.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3 Marzo																								1	2	3	4	5	6	7	8
4 Abril	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
5 Mayo	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
6 Junio	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
7 Julio	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
8 Agosto	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
9 Septiembre	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	
10 Octubre	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
11 Noviembre	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	
12 Diciembre	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
1 Enero	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
2 Febrero	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342			
3 Marzo	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
4 Abril	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	
5 Mayo	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434
6 Junio	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	
7 Julio	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480															



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



	ENTREGABLE	DIAS	Nombre	días contrato
18/09/2020				
19/11/2020	4	148	Debida diligencia técnica, legal y financiera	70
07/01/2021	5	149	Corroboración del Plan de intervención para el corredor	90
31/12/2020	6	179	Estudio de Diseño Geométrico	115
20/01/2021	7	206	Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación	169
17/11/2020	8	208	Estudio de Geotecnia y Geología	166
19/11/2020	9	225	Diseño de Túneles	204
06/12/2020	10	229	Diseño de Puentes, Pontones y Viaductos	196
06/12/2020	11	229	Estudio Ambiental	256
10/12/2020	12		Estudio Social	256
06/12/2020	13		Estudio Predial	256
11/01/2021	14		Inventario y relocalización de redes de servicios públicos	184
15/10/2020	15		Diseño de Infraestructura y superestructura de la	176
17/10/2020	16		Diseño de estaciones, edificaciones y plataformas de carga	154
27/01/2021	17		Sistema de seguridad, señalización y control	201
23/02/2021	18		Patios y talleres	206
23/02/2021	19		Sistemas de comunicación	201
22/03/2021	20		Puesto de Control Central Operacional - PCO	236
22/03/2021	21		Material rodante	166
18/03/2021	22		Operación y mantenimiento	181
17/07/2021	23		Presupuesto/ Programación	274
	24		Informe final de estudios y diseños técnicos	249
	25		Resumen ejecutivo y presentación resumen	279
	26		Estudios financieros	319
	27		Estudios legales	339
	28		Informe Final de estudios y diseños Técnicos, Financieros y Legales	360
	29		Cierre, Promoción y liquidación	480

De acuerdo con el informe de Interventoría a 30 de mayo/2021, el estado de avance financiero es el siguiente:

**Tabla de avance financiero**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS


Inicio de Contrato:	24/03/2020	Valor entregables:	\$ 6.845.376.349	Fecha de reporte:	21/05/2021
Fecha de Corte:	30/04/2021	Monto agotable con IVA:	\$ 1.020.386.363	Longitud Tramo T3	124,4 km
Días transcurridos:	403	Valor total del contrato:	\$ 7.865.762.712	N° de entregables	29
Valor de entregables facturado:	\$ 2.864.829.801,82	Valor de entregables finalizados facturados:	\$ 1.134.278.861	N° de entregables facturados	6

INDICADOR DE GESTIÓN	CONCEPTO	Etapa I	Etapa II	Total Proyecto
PLAZO:	Plazo Transcurrido	148 días = 100%	255 días = 75%	403 días = 82,8%
	Plazo Contractual	148 días	339 días	487 días
Acierto en Reprogramación:	% Promedio Avance Entregables	13,66% = 100%	42% = 77%	56% = 81,7%
	% Avance Programado	13,66%	55%	68%
AV. FÍSICO:	Avance Entregables	\$ 1.074.724.086,76 = 100%	\$ 3.326.579.090,46 = 49%	\$ 4.401.303.177,21 = 56,0%
	Valor Total Contrato	\$ 1.074.724.086,76	\$ 6.791.038.625,24	\$ 7.865.762.712,00

Acierto en Programación:	% Promedio Avance Entregables	30,28%	=	35,01%	ACIERTO EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA
	% Avance Programado	86,48%			

Financiero	Avance Entregables	\$ 2.381.438.785,00	=	30,28%	AVANCE FINANCIERO
	Valor Total Contrato	\$ 7.865.762.712,00			

Seguimiento al avance de programación vs ejecución, según el cronograma financiero.

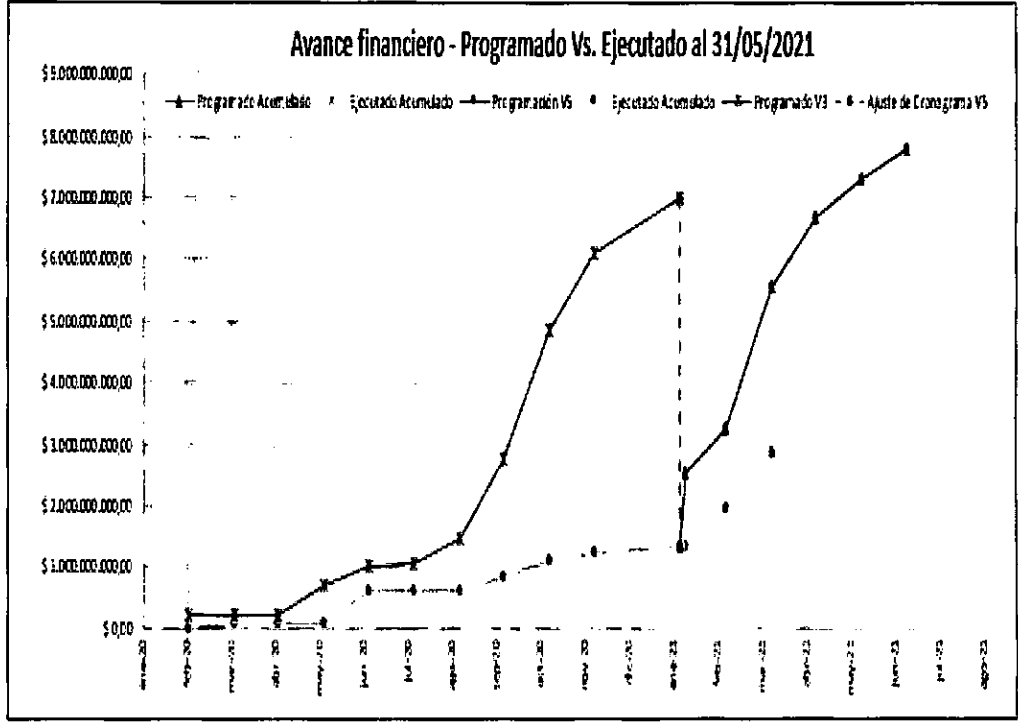

## 5. CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN

En lo fundamental, el atraso registrado en el cumplimiento del cronograma del proyecto, se debió a las dificultades presentadas para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto por causa de los efectos de la pandemia del coronavirus, que imposibilitaron la movilidad por el territorio de la zona de influencia del proyecto, debido a la emergencia sanitaria declarada que restringió el acceso a los municipios. Esto impidió entre otras actividades la ejecución del trabajo de campo de los profesionales, y por ende, la realización de los demás estudios que dependían de los ensayos técnicos de geotecnia, y de la verificación de las condiciones de la línea férrea en todo su recorrido.

Lo anterior generó un desplazamiento dentro del cronograma del proyecto el cual tenía un plazo de 16 meses con fecha de finalización el próximo 27 de julio de 2021, pero que dadas las circunstancias sobrevinientes, hoy nos llevan a la necesidad de realizar una reprogramación del proyecto en cuanto al horizonte de tiempo, extendiendo su plazo hasta el mes de diciembre de 2021, para poder cumplir con el objeto del mismo.

En la fecha, de conformidad con las funcionalidades temporales permitidas en el aplicativo del GESPRY DNP para que las entidades ejecutoras de proyectos de regalías revisen la programación de la ejecución y si lo consideran pertinente adelanten la actualización de la programación, la Promotora ha hecho uso de dicha facultad y realizó la reprogramación del proyecto para compensar los atrasos en la ejecución de las actividades por consecuencia de los efectos de la pandemia que restringió la movilidad de los profesionales y trabajos de campo ocasionando retrasos al proyecto.

Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones de la Circular 0013-4 de 2021 del SGR del DNP, que establece que a partir del 15 de junio de 2021, se fijará la programación de actividades que se encuentre vigente a este corte en el GESPROY SGR, con el objeto de definir la línea base de la medición de desempeño del proyecto realizada actualmente a través del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías versión 2.0. Con lo anterior, y conforme al estado de avance de las actividades del proyecto se reprogramaron las actividades faltantes por ejecutar hasta diciembre 30 de 2021.

Con lo anterior, se posibilitó ajustar el proyecto en cuanto a lo programado con respecto a lo ejecutado, como se evidencia en la gráfica siguiente descargada del GESPROY.






### Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto según fuentes de financiación registradas en SURFP-SGR:	\$ 9.576.670.807,00
Valor Actividades Programadas	\$ 9.576.670.807,00
Valor Actividades Contratadas	\$ 9.419.854.746,65
Valor Actividades Ejecutadas	\$ 4.266.033.370,00

### Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

#### Curva S

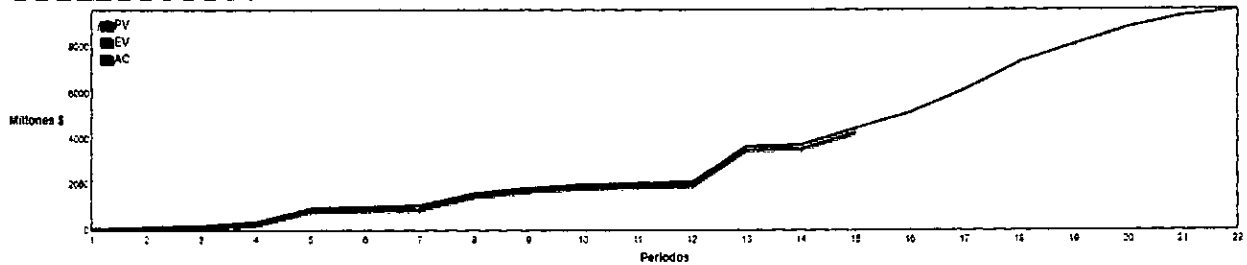

Línea	Periodos																					
	1-mar-20	2-abr-20	3-may-20	4-jun-20	5-jul-20	6-ago-20	7-sep-20	8-oct-20	9-nov-20	10-dic-20	11-ene-21	12-feb-21	13-mar-21	14-abr-21	15-may-21	16-jun-21	17-jul-21	18-ago-21	19-sep-21	20-oct-21	21-nov-21	22-dic-21
* Valor Planeado (PV)	61	123	183	347	943	1.005	1.088	1.607	1.825	1.958	2.030	2.088	3.648	3.721	4.435	5.121	6.137	7.311	8.092	8.822	9.317	9.577
* Valor Ganado (EV)	4	49	92	238	833	878	923	1.486	1.713	1.845	1.891	1.932	3.473	3.529	4.225							
* Costo Actual (AC)	5	51	95	243	834	880	926	1.487	1.714	1.848	1.893	1.935	3.509	3.555	4.266							
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,07	0,40	0,50	0,69	0,88	0,87	0,86	0,92	0,94	0,94	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95							

Como se infiere de la gráfica el GESPROY registra a la fecha de corte de mayo 31 de 2021 una ejecución de \$ 4.266.033.370, la cual guarda correspondencia con el registro que esta supervisión lleva de los pagos tramitados al proyecto por valor de 4.234.783.617,54, según se registró en las tablas anteriores del balance financiero. La diferencia se debe a que en el aplicativo del GESPROY ya se registró la información de avance de ejecución del periodo de mayo de 2021 cuyo plazo de registro es hasta el 15 de junio, y en la práctica, la diferencia de dichos pagos se hayan en trámite.

En conclusión, el seguimiento de la ejecución de nuestro proyecto se encuentra en armonía con los registros del GESPROY, y solo se requiere poder ajustar el proyecto, según la solicitud que presentamos a trámite para autorización del señor Gobernador.

La justificación del ajuste del proyecto en una adición del 4.78% en valor y en la prórroga de plazo, se sustentan en la real situación presentada con el plan de intervención del corredor férreo, el cual sólo permitió el aprovechamiento del 59,5% de la faja de la vía férrea existente, por la necesidad de mejorar el alineamiento geométrico de la vía lo cual generará mayores costos al proyecto por la necesidad de realizar estudios de geotecnia adicionales en las nuevas fajas prediales para la nueva infraestructura que habrá de implementarse, aumentándose la cantidad de viaductos que se





tenían inicialmente contemplados en la prefactibilidad, y cuya alternativa seleccionada debió mejorarse ostensiblemente por las falencias que presentaba.

Así mismo, y como consecuencia de lo anterior, se aumentan las cantidades de trabajos de campo a realizar, lo cual genera la necesidad de adicionar el contrato para este propósito en cerca de 258 millones, los cuales han sido solicitados por el consultor como adición, además de una prórroga de cuatro (4) meses al plazo contractual de los contratos de consultoría, interventoría y supervisión.

La supervisión presentó a la Gerencia de la Promotora la sustentación y justificación para la adición del contrato por cerca de 258 millones para la ampliación de la campaña geotécnica del proyecto, mediante informe que se adjunta al presente Informe de supervisión.

Fecha de expedición del presente informe de supervisión mayo 28 de 2021.

**CESAR AUGUSTO HERNANDEZ ORTIZ**

Firma del Supervisor

Especialista Técnico. Promotora Ferrocarril de Antioquia

Proyectó: César Hernández Ortiz – Especialista Técnico  
Supervisión



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS



Bogotá D.C enero 21 de 2021

**FERR-CPB-155-2021**

**INGENIERO  
CÉSAR HERNÁNDEZ  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA  
MEDELLÍN**

**Referencia:** Contrato N° 003 de 2020. Interventoría integral al contrato de estudios técnicos factibilidad avanzada), legales y financieros, para el mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea, en la región del eje cafetero y Antioquia – tramo Santo Domingo - Puerto Berrio.

**Asunto:** Concepto técnico de la Interventoría relacionado con la solicitud de adición al valor contractual de \$857'467.532 para los trabajos de campo (toma de muestra, apiques y perforaciones, entre otros).

Respetado Ingeniero César:

La consultoría, mediante la comunicación UTFAT3-300-2020 Plan de Intervención V3 geotecnia presentó la propuesta de la campaña de geología y geotecnia, donde manifiesta la necesidad de ajustar la bolsa descrita en el asunto.

Con la comunicación UTFAT3-316-2020 la Consultoría presentó a la Promotora, con copia a esta Interventoría, la discriminación de los valores correspondientes a los ítems: Transporte, Túneles, Geotecnia a Cielo Abierto, por un valor total de \$1.074'438.034. Según los anterior, se requiere adicionar a la bolsa un monto de \$216'970.502.

Con el fin de sustentar la adición, la Consultoría emitió la comunicación UTFAT3-315-2020 dirigida a la Promotora Ferrocarril de Antioquia con copia a esta Interventoría, la cual detalla los ítems de toma de muestras y ensayos que se desarrollarán en lo correspondiente a túneles.

El siguiente cuadro resume el valor de las actividades correspondientes a la campaña de geología y geotecnia. Esta Interventoría revisó la relación de actividades de tomas de muestras y ensayos para túneles y considera viable la adición solicitada por el Consultor.

**BOLSA DISPONIBLE CONTRATO 003 2020 \$**


**857.467.532**



<b>TRANSPORTE</b>	\$	42.873.377
<b>TUNELES</b>	\$	356.536.106
<b>GEOTECNIA CIELO ABIERTO</b>	\$	675.028.552
<b>GASTOS DE CAMPO TOTAL</b>	\$	<b>1.074.438.034</b>
<b>Valor adicional a la bolsa disponible</b>	\$	<b>216.970.502</b>

Por lo anterior, la Interventoría pone a consideración de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, la solicitud planteada por la Consultoría para gestionar los recursos y adicionar el valor de \$216'970.502 al contrato 003 de 2020, específicamente en lo concerniente al Parágrafo Segundo de dicho contrato. Agradecemos dar a conocer la decisión tomada al respecto a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que se viene adelantando dicha campaña de exportación.

Cordialmente,

  
**Ing. Fernando Rey Valderrama**  
**Director de Interventoría**  
**Consortio Intérvntor Férrco Puerto Berrío**

Proyectó: Dra. Ofelia Gómez T, Ing. Carlos Galeano, Ing. Holman D. Benavides.

Revisó: Ing. Fernando Rey Valderrama

Anexo: Propuesta para los ensayos de Geología y Geotecnia. (Formato Excel), UTFAT3-300-2020, UTFAT3-313-2020 y UTFAT3-315-2020, UTFAT3-316-2020.

Copias: Unión Temporal Ferrocarril de Antioquia Tramo 3 -UTFAT3 y archivos.



Bogotá D.C., 19 de enero de 2021

**UTFAT3-315-2020**

Señores  
**PROMOTORA FERROCARRIL DE ANNTIOQUIA**  
CESAR HERNANDEZ  
SUPERVISOR  
Medellín

**Copia:**  
Señores  
**CONSORCIO INTERVENTOR FERREO PUERTO BERRÍO**  
ING. FERNANDO REY  
Director de Interventoría  
Bogotá

**ASUNTO:** Solicitud de valor adicional para ensayos de Geología y Geotecnia- Túneles. Tramo 3 Proyecto Ferrocarril de Antioquia: Santo Domingo – Puerto Berrío, Contrato de consultoría No. 003 de 2020.

**REF:** ESTUDIOS TECNICOS (FACTIBILIDAD AVANZADA), LEGALES Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD FERREA EN LA REGION DEL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA. TRAMO SANTO DOMINGO – PUERTO BERRIO.

Respetados Señores:

Dando alcance a nuestro comunicado UTFAT3-316-2020 del 13 de enero 2021, se detalla a continuación el monto solicitado para la actividad de ensayos de campo para Túneles.

La suma requerida para ensayo de campo para túneles corresponde a \$356.536.106, esta suma se detalla a continuación:

#### Detalles del presupuesto para Túneles

Desde el Plan de Intervención se han seleccionado 10 túneles para ensayos en campo, esto de forma orientativa y para realizar una campaña coherente teniendo en cuenta los recursos disponibles. Los criterios para seleccionar los Túneles a los que se realizarán sondeos en campo son por tener las longitudes mayores o puede ser también porque está situado en una zona de falla según el estudio de prefactibilidad. En la siguiente tabla se indica los sectores de ensayo y detalles de los sectores de estudio.

 	CONTRATO No. 003 DE 2020 PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.	 DURÁN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS 
	<b>UNIÓN TEMPORAL</b> <b>ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3</b> <b>FDA</b>	

**UBICACIONES DE SONDEOS DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA PARA TÚNELES  
EN MINA. DISEÑO GEOMÉTRICO V0**

Id SONDEO	Cadenamiento (km)	Coordenadas planta trazado		Justificación emplazamiento
		X	Y	
ST3_FA-1	38+765	938.313.46	1.199.312.17	Posibilidad acumulación coluvial en boquilla salida
ST3_FA-2	42+740	934.925.22	1.199.323.02	Posible zona falla en estudio de prefactibilidad
ST3_FA-3	45+372	933.805.82	1.197.172.40	Cruce de falla Palestina, cartografiada en boquilla entrada
ST3_FA-4	48+102	932.517.10	1.199.244.79	Chequear saprolito en boca entrada, túnel largo, NAF
ST3_FA-5	49+093	931.532.44	1.199.222.16	Verificar condiciones emboquille bajo cruce vía
ST3_FA-6	50+570	930.791.58	1.198.139.60	Condiciones de emboquille sesgado
ST3_FA-7	61+542	924.275.01	1.200.414.90	Cicatrices de deslizamiento en s. residual boquilla salida
ST3_FA-8	109+944	886.649.07	1.214.977.32	Posible lengua coluvial en boquilla entrada
ST3_FA-9	110+700	885.893.66	1.215.061.36	Sondeo intermedio, chequeo espesor saprolito y calidad macizo rocoso
ST3_FA-10	117+992	878.643.16	1.215.774.64	Investigación boquilla de salida

El resumen del valor requerido se detalla a continuación:

 	CONTRATO No. 003 DE 2020 PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.		DURÁN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS 
	<b>UNIÓN TEMPORAL</b> <b>ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3</b> <b>FDA</b>		

<b>RESUMEN DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA TUNELES ANTIOQUIA</b>				
ID	Unidad de investigación geotécnica o ensayo	Medición	Precio Unit.	Coste Unidad
2	Un. Apiques profundidad 3 m	30.0	\$ 160.905	\$ 4.827.150
5	Hora Transporte traslado de equipos de perforación hasta el proyecto	0.0	\$ 61.144	\$ 0
6	Hora Transporte interno de equipos de perforación	20.0	\$ 179.141	\$ 3.582.820
7	M.I. Toma de muestras, apiques y perforaciones para el informe de Geología y Geotecnia	397.0	\$ 804.525	\$ 319.396.425
18	Un. Granulometría-Lavado por el tamiz 0,075 mm (Nº200)	27.0	\$ 56.853	\$ 1.535.031
19	Un. Granulometría - Tamizado de tamaños mayores a 0,075 mm (Nº200)	16.0	\$ 82.598	\$ 1.321.568
20	Un. Granulometría - Hidrómetro tamaños menores a 0,075 mm (Nº 200)	5.0	\$ 201.668	\$ 1.008.340
21	Un. Límites de consistencia (líquido, plástico) y humedad	27.2	\$ 53.635	\$ 1.458.872
22	Un. Corte directo en suelos cohesivos No Consolidado - No Drenado* UU	6.0	\$ 599.639	\$ 3.597.834
23	Un. Corte directo en suelos cohesivos Consolidado - No Drenado* CU	4.0	\$ 807.743	\$ 3.230.972
24	Un. Compresión triaxial estática Consolidado - No Drenado CU*	2.0	\$ 1.061.973	\$ 2.123.946
25	Un. Corte directo en rocas blandas	6.0	\$ 504.169	\$ 3.025.014
26	Un. Compresión simple en rocas con tallado de muestras	24.0	\$ 135.160	\$ 3.243.840
27	Un. Carga puntual en rocas con tallado de muestras	15.0	\$ 251.012	\$ 3.765.180
28	Un. Tracción brasileña	6.0	\$ 117.997	\$ 707.982
29	Un. Ensayo Deval	9.0	\$ 101.263	\$ 911.367
30	Un. Peso unitario	45.0	\$ 62.217	\$ 2.799.765
<b>TOTAL ESTIMACIÓN CAMPAÑA GEOTÉCNICA PARA TÚNELES</b>				<b>\$ 356.536.106</b>

Por lo anterior quedamos a la espera de su pronunciamiento,

Cordialmente,



LINA MARIA NEIRA G.  
 Directora de Estructuración  
 UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3-FDA



Bogotá D.C., 13 de enero de 2021

UTFAT3-316-2020

Señores  
**PROMOTORA FERROCARRIL DE ANNTIOQUIA**  
CESAR HERNANDEZ  
SUPERVISOR  
Medellín

**Copia:**  
Señores  
**CONSORCIO INTERVENTOR FERREO PUERTO BERRÍO**  
ING. FERNANDO REY  
Director de Interventoría  
Bogotá

**ASUNTO:** Solicitud de valor adicional para exploración y ensayos de geología y geotecnia. Tramo 3 Proyecto Ferrocarril de Antioquia: Santo Domingo – Puerto Berrío, Contrato de consultoría No. 003 de 2020.

**REF:** ESTUDIOS TECNICOS (FACTIBILIDAD AVANZADA), LEGALES Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD FERREA EN LA REGION DEL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA. TRAMO SANTO DOMINGO – PUERTO BERRIO.

Respetados Señores:

Como se ha venido informando por parte de la consultoría el valor de la campaña geotécnica necesaria para desarrollar el entregable del estudio de Geología y Geotecnia, es mayor al monto destinado contractualmente, hecho manifestando desde la reunión de avance conjunto del 9 de noviembre 2020, así mismo se han realizado reuniones técnicas al respecto entre la consultoría y la interventoría los días 11, 23 y 24 de noviembre 2020 para discutir y justificar el requerimiento, de igual forma el 26 de noviembre en la reunión de avance se informó los detalles de los gastos de la campaña geotécnica, y posteriormente con la entrega el Plan de intervención de geología y geotecnia, en el cual se tuvo en cuenta las observaciones remitidas por la Interventoría, se remitió el presupuesto ajustado requerido para la elaboración del estudio.

La suma requerida asciende a \$216.970.502, esta suma se detalla a continuación:



 	CONTRATO No. 003 DE 2020 PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.		DURÁN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS 
	<b>UNIÓN TEMPORAL</b> <b>ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3</b> <b>FDA</b>		

Detalles del presupuesto PI Geología y Geotecnia v3

TRANSPORTE	\$	42.873.377
TUNELES	\$	356.536.106
<b>GEOTECNIA CIELO ABIERTO</b>		
TOTAL PUENTES	\$	499.363.589
TOTAL TALUDES	\$	156.937.212
TOTAL EDIFICACIONES	\$	4.052.449
TOTAL ZODMES	\$	7.687.510
TOTAL FUENTES	\$	6.987.792
<b>TOTAL GEOTECNIA CIELO ABIERTO</b>	<b>\$</b>	<b>675.028.552</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.074.438.034</b>

El resumen del valor requerido se detalla a continuación:

PI Geología y Geotecnia v3

BOLSA DISPONIBLE	\$	857.467.532
TRANSPORTE	\$	42.873.377
TUNELES	\$	356.536.106
GEOTECNIA CIELO ABIERTO	\$	675.028.552
GASTOS DE CAMPO TOTAL	\$	1.074.438.034
RESPONSIBLE GASTOS	\$	216.970.502

Por lo anterior se recalca lo ya mencionado en los comités de avance y en el plan de intervención de geología y geotecnia v3 remitido con el comunicado UTFAT3-300-2020 del 11 de diciembre de 2020 a la Interventoría, acerca de la importancia de la obtención de los recursos necesarios para llevar a cabalidad la campaña geotecnia para la entrega del estudio.

Por último, cabe resaltar que esta consultoría inicio los trabajos de campo efectuando exploraciones hasta donde el monto agotable contractual lo permita, para evitar atrasos en

 	CONTRATO No. 003 DE 2020 PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. <b>UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3 FDA</b>	 
--	---	---

el cronograma propuesto cronograma V4 el cual fue aprobado por la interventoría y enviado a la Promotora.

Por lo anterior quedamos a la espera de su pronunciamiento

Cordialmente,



LINA MARIA NEIRA G.  
Directora de Estructuración  
UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN TRAMO 3-FDA
