

INFORME

INDIVIDUAL DE CONTROL DE RESULTADOS

Planes de Desarrollo y Planes de Acción Territorial

Vigencia 2024



CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

**INFORME INDIVIDUAL DE CONTROL DE
RESULTADOS:
Definitivo**

Contraloría General de Antioquia
Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales

Departamento	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Cuatrenio	2024 - 2027
Plan de desarrollo	POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027
Vigencia evaluada	2024

Medellín, 24 de junio de 2025

Contralora General de Antioquia	Enedith del Carmen González Hernández
Subcontralora	Andrea Bedoya Pulgarín
Contralora Auxiliar de Proyectos Especiales	Natalia Trujillo González

COMISIÓN EVALUADORA	
Supervisor	Asdrúbal Gutiérrez Valdés Contralor Auxiliar
Evaluador	Alejandro Palacio Sánchez Contralor Auxiliar

CONTENIDO

1. RESULTADOS GENERALES	6
1.1. Concepto de cumplimiento del plan de acción vigencia 2024.....	6
1.2. Concepto de cumplimiento Parcial del PD 2024-2027	6
1.3. Concepto de efectividad (avance en indicadores de resultado)	7
1.4. Concepto de ejecución financiera.....	7
1.5. Observaciones:	8
2. ASPECTOS PRELIMINARES	13
2.1. Introducción.....	13
2.2. Justificación.....	13
2.3. Metodología de cálculo	14
2.3.1. Eficacia	15
2.3.2. Eficacia plan de acción	15
2.3.3. Eficacia plan de desarrollo	15
2.3.4. Eficiencia.....	16
2.3.5. Efectividad	17
2.3.6. Ponderaciones	19
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	20
3.1. Calidad de la información	20
3.2. Análisis Comparativo Plan de Acción	20
3.3. Análisis Comparativo Plan de Desarrollo	21
3.4. Análisis Comparativo Efectividad	22
3.5. Ejecución Financiera.	23
3.6. Número de Indicadores Plan de Desarrollo	25
3.7. Análisis de legalidad del plan de desarrollo y plan de acción	30
4. CUMPLIMIENTO DE METAS.....	31
4.1. Metas de producto.....	31
4.2. Ejecución financiera.....	41
4.3. Metas de Resultado.	53
5. REFERENCIAS	57



Señor
ANDRES JULIAN RENDÓN CARDONA
Gobernador de Antioquia
Carrera 42 N°52-106
Medellín, Antioquia

Asunto: Seguimiento al plan de desarrollo departamental **“POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027”** vigencia **2024**.

Respetado señor **Rendón Cardona**

La Contraloría General de Antioquia, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó seguimiento para la vigencia **2024**, al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental **“POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027”** del departamento de **ANTIOQUIA**.

Es responsabilidad del sujeto de control el contenido de la información suministrada o dejada de suministrar por la Entidad en el Aplicativo de rendición GESTIÓN TRANSPARENTE, la cual es sujeta al análisis por la Contraloría General de Antioquia.

La responsabilidad de la Contraloría General de Antioquia consiste en producir un Informe de Control de Resultados que contenga el concepto sobre el examen practicado.

El ejercicio del Control Fiscal, practicado por la Contraloría General de Antioquia, se centró en el Control de Resultados a 31 de diciembre de **2024**, teniendo como referencia para el seguimiento del plan de desarrollo, los indicadores de producto y los indicadores de resultado.

1. RESULTADOS GENERALES

1.1. Concepto de cumplimiento del plan de acción vigencia 2024

TABLA 1. Matriz Control de Resultados – Plan de Acción 2024

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027			
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2024			
Criterio	Calificación	Ponderación	Resultado ponderado
Eficacia Plan Acción	84,69	60%	50,81
Eficiencia Plan Acción	82,71	40%	33,08
TOTAL			83,90
CONCEPTO			Sobresaliente

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Se observa que el departamento de **ANTIOQUIA** en el Plan de Acción “**POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027**” en el CONTROL DE RESULTADOS, presenta los siguientes factores con corte a 31 de diciembre de **2024**: eficacia del **84,69%** y de eficiencia del **82,71%**, los cuales una vez ponderados arrojan una calificación total de **83,90%** en el cumplimiento de los planes y programas, obteniendo así un concepto de gestión de resultados **Sobresaliente**.

1.2. Concepto de cumplimiento Parcial del PD 2024-2027

TABLA 2. Matriz Control de Resultados - Plan de Desarrollo 2024-2027

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027			
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
CUMPLIMIENTO DEFINITIVO PLAN DE DESARROLLO - CORTE 2024			
Criterio	Calificación	Ponderación	Resultado ponderado
Eficacia Plan Desarrollo	16,29	60%	9,77
Eficiencia Plan Desarrollo	21,07	40%	8,43
TOTAL			18,20
CONCEPTO			Crítico

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Se observa que el Departamento de **ANTIOQUIA** en su **PLAN DE DESARROLLO** Departamental “**POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027**” en el CONTROL DE RESULTADOS, presenta los siguientes factores con corte a 31 de diciembre de **2024**: eficacia del **16,29** y eficiencia del **21,07**, los cuales una vez ponderados arrojan una calificación total de **18,20** en el cumplimiento de los planes y programas, obteniendo así un concepto de gestión de resultados **Crítico**.

Nota: Es importante realizar la claridad que el resultado es crítico, debido a que la calificación se pondera sobre el cuatrienio y la administración departamental empezó su ejecución apenas en la vigencia 2024.



1.3. Concepto de efectividad (avance en indicadores de resultado)

TABLA 3. Matriz Control de Resultados: efectividad en 2024

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027	
Ente Territorial_ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO 2024	
CRITERIO	CALIFICACIÓN
Efectividad (avance en metas de resultado)	31,59

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Se observa que el departamento de **ANTIOQUIA** en su **PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027”** en el CONTROL DE RESULTADOS con corte al 31 de diciembre del **2024** presento una efectividad de 31,59 en el cumplimiento de los planes y programas.

1.4. Concepto de ejecución financiera

TABLA 4. Matriz de ejecución financiera 2024

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027	
Ente Territorial_ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
EJECUCIÓN FINANCIERA 2024	
CONCEPTO	VALOR
Plan Plurianual de Inversiones	\$26.785.677.491.663
Apropiación 2024	\$5.100.611.009.338
Ejecutado (Obligado) 2024	\$5.100.611.009.338
Porcentaje de ejecución presupuestal 2024	100,00%
Obligado Acumulado 2024-2027	\$5.100.611.009.338
Porcentaje de ejecución Acumulada del PPI	19,04%

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Se observa que el departamento de **ANTIOQUIA** en su **PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027”** en el CONTROL DE RESULTADOS, programó recursos en su Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio por valor de **\$26.785.677.491.663**, que en la vigencia **2024** apropió recursos presupuestales por valor de **\$5.100.611.009.338**; que en esta misma vigencia ejecutó recursos presupuestales a nivel de obligación por valor de **\$5.100.611.009.338**; equivalentes al **100,00%** de lo presupuestado y que en las vigencias acumuladas ha ejecutado recursos a nivel de obligación por valor de **\$5.100.611.009.338**, correspondientes al **19,04%** de los programado en el plan plurianual de inversiones.



1.5. Observaciones:

Una vez realizada la evaluación de los indicadores del plan de desarrollo del **Departamento de Antioquia** en la vigencia 2024 – 2027 se encontraron las siguientes observaciones:

- 1) Se evidencia que la **Gobernación de Antioquia** presentó una variación entre la información rendida a la CGA en el 2024 y al cierre de la vigencia 2024 en el CUIPO (CHIP), así:

Departamento de Antioquia.			
VARIABLE	Según cuipo (CHIP) 2024	Según rendición a la CGA 2024	% de variación
Presupuesto Apropriado	\$6.477.671.091.442,00	\$5.100.611.009.338,00	-21,26
Presupuesto Obligado	\$5.639.899.714.645,00	\$5.100.611.009.338,00	-9,56

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Además, que la información presupuestal reportada en el ERIPD, el valor de las apropiaciones es igual a las obligaciones, algo que no ocurre en la información registrada en el CUIPO, esto también podría reflejar que los bienes y servicios se adquirieron con el mismo valor de lo proyectado y que no constituyeron reservas a 31 de diciembre del 2024.

- 2) Una vez revisados los documentos rendidos se evidencia que la Gobernación de Antioquia no rindió completamente los actos administrativos de armonización del presupuesto al plan de desarrollo “POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027”, lo anterior incumpliendo la Ley 152 de 1994 en su Artículo 28 y 44, ya que algunas dependencias no realizaron este proceso.
- 3) Se observa una diferencia entre el reporte del ERIPD con respecto al plan de desarrollo departamental "Por Antioquia Firme 2024-2027", ya que, en el documento (página 190) se deja consignado en el Plan Plurianual una inversión de 16.655.530 millones de pesos para el cuatrienio, sin embargo, en el ERIPD se reporta en el Plan plurianual de Inversiones del Cuatrienio inversión por \$26.785.677.491.663 pesos. **Lo anterior evidenciando una diferencia de 10.130.147.491.663 entre el reporte del ERIPD y lo plasmado en el plan de desarrollo**, esto afectando la evaluación del plan departamental por el reporte de información incorrecta.



Tabla 13. Ingresos y gastos – Plan Financiero 2024 – 2027

CONCEPTO	2024	2025	2026	2027	CUATRIENIO
INGRESOS TOTALES	6.182.184	5.853.916	6.333.766	6.777.914	25.147.780
Asamblea	23.057	25.840	27.390	29.033	105.320
Contraloría	424.76	48.041	51.071	54.044	195.632
Servicio de la Deuda Pública	935.200	910.918	946.728	955.856	3.748.701
Servicio de la Deuda Pública Financiera	798.832	764.459	789.230	783.126	3.135.646
Bonos Pensionales	136.368	145.459	157.297	172.530	612.655
Fondo de Contingencias			200	200	400
Plan Plurianual de Inversión	4.287.796	3.759.842	4.124.304	4.483.588	16.655.530

Fuente: información extraída del Plan de Desarrollo Departamental “Por Antioquia firme 2024-2027”, (2024) pagina 189 – 190

\$	26.785.677.491.663,00

Fuente: Información extraída del ERIPD rendido por el Departamento, (2025).

- 4) Se evidencia que el Departamento de Antioquia obliga presupuestalmente recursos, en el Plan de Acción a indicadores productos que NO fueron ejecutados en la vigencia 2024, es decir su ejecución física fue de cero (0) o “N/A”. Lo anterior incumpliendo los principios generales que deben regir las actuaciones de las autoridades regionales en materia de planeación, como lo describe la Ley 152 de 1994 en su Artículo 3:

“Artículo 3.-Principios generales. Los principales generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación son: ...

k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva;

l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder; ...”



#	Nombre Indicador de Producto	Meta del cuatrienio	Programación 2024	Ejecución Física Plan de Acción 2024	Apropiación Presupuestal 2024 (Pesos)	Obligación Presupuestal 2024 (Pesos)
69	Infraestructura deportiva construida	18	NP	NA	\$ 2.999.086.345	\$2.999.086.345
70	Escenarios deportivos o equipamientos adecuados, mantenidos o mejorados.	80	8,00	0,00	\$ 10.184.392.894	\$10.184.392.894
72	Sedes operativas, para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones funcionales y con mantenimiento	3	3,00	0,00	\$ 1.642.344.247	\$1.642.344.247
90	Estrategia de empleo y emprendimiento implementada	1	0,25	0,00	\$ 12.709.667	\$12.709.667
122	Nodos para el aprendizaje dotados.	5	NP	NA	\$ 27.706.417.053	\$27.706.417.053
138	Centros de investigación e innovación educativa para maestros y maestras operando	9	NP	NA	\$ 260.000.000	\$260.000.000
139	Estrategia desarrollada para la articulación y la gobernanza del sistema de educación terciaria y superior departamental	1	NP	NA	\$ 56.443.736.954	\$56.443.736.954
156	Intervenciones en bienes muebles de interés cultural realizadas	2	NP	NA	\$ 91.694.696	\$91.694.696
159	Túnel y vías de acceso construidas	6	NP	NA	\$ 280.802.018.885	\$280.802.018.885
160	Aeropuertos o Aeródromos mejorados y en operación	15	NP	NA	\$ 419.055.213	\$419.055.213
175	Puntos de acceso a Internet con diferentes tecnologías	4000	NP	NA	\$ 5.590.038.624	\$5.590.038.624
178	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	1041	900,00	0,00	\$ 30.842.181.886	\$30.842.181.886
179	Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	1000	354,00	0,00	\$ 3.985.325.879	\$3.985.325.879
188	Productores con acceso a crédito agropecuario y rural	300	NP	NA	\$ 1.000.000.000	\$1.000.000.000
189	Pequeños productores cubiertos con seguro agropecuario	2400	1200,00	0,00	\$ 600.000.000	\$600.000.000
220	Emprendimientos verdes sostenibles apoyados	42	35,00	0,00	\$ 86.428.939	\$86.428.939
237	Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados	62	10,00	0,00	\$ 240.000.000	\$240.000.000
238	Infraestructura para el bienestar animal cofinanciados	40	5,00	0,00	\$ 100.000.000	\$100.000.000
282	Modernización del sistema de información estadística	1	NP	NA	\$ 29.250.000	\$29.250.000

Fuente: Información extraída del ERIPD rendido por el Departamento, (2025).

Lo anterior altera el resultado de la eficiencia en la evaluación del Plan de Acción, debido a que mostraría un costo de una actividad no realizada.

- 5) Se detecta que la **Gobernación de Antioquia** NO reporta línea base de los indicadores de productos del Plan Indicativo y/o Plan de Acción, por ejemplo:



#	Nombre Indicador de Producto	Unidad de medida	Línea base	Meta del cuatrienio
174	Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC	Número		4000
175	Puntos de acceso a Internet con diferentes tecnologías	Número		4000
180	Procesos de formalización o regularización de predios para el desarrollo rural	Número		5700

Fuente: Información extraída del ERIPD rendido por el Departamento, (2025).

- 6) Se observa mal reporte en la ejecución del Indicador de Resultado "Cobertura de acueducto" del cual se reporta en el ERIPD, una ejecución de las 92,62 % para el año 2023. No obstante, en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación DNP-SisPT la ejecución que se reporta fue de 55,46 para el 2023.

Componente de Resultados				
Fecha actualización: Octubre de 2024				
Departamento y Municipio	Periodo	Deshacer filtros		Menú
Antioquia	2020 - 2023			
Variable	2020	2021	2022	2023
3.3.3. Cobertura en acueducto (%)	58,64	57,70	62,05	55,46

Fuente: Información extraída de la página del Departamento Nacional de Planeación, Componente Resultados, SisPT (2025).

- 7) Se observa mal reporte en la ejecución del Indicador de Resultado "Cobertura de alcantarillado" reporta en el ERIPD, una ejecución de las 83,71% para el año 2023. No obstante, en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación DNP-SisPT la ejecución que se reporta fue de 44,35% para el 2023.

Componente de Resultados				
Fecha actualización: Octubre de 2024				
Departamento y Municipio	Periodo	Deshacer filtros		Menú
Antioquia	2020 - 2023			
Variable	2020	2021	2022	2023
3.3.4. Cobertura en alcantarillado (%)	46,20	45,34	48,89	44,35
3.4. Seguridad y convivencia (#)	87,49	85,14	91,83	87,84

Fuente: Información extraída de la página del Departamento Nacional de Planeación, Componente Resultados, SisPT (2025).

- 8) Se evidencia que el Departamento de Antioquia NO reporta ejecución de los siguientes indicadores de resultado:



#	Nombre Indicador de Resultado	Unidad de Medida	Meta del Cuatrienio	Ejecución Meta de Resultado Año 2024	Año de Medición Ejecución Meta de Resultado Año 2024
15	Medallas de oro obtenidas en juegos deportivos nacionales y para nacionales	Número	249	NA	
17	Índice de desigualdad de género	Número	0,26	NA	
18	Niños y niñas con atención integral para la primera infancia, que obtienen nivel de desarrollo adecuado.	Porcentaje	90	ND	
19	Prevalencia del riesgo de desnutrición aguda	Porcentaje	6,7	NA	
20	Prevalencia de Inseguridad Alimentaria y Nutricional del departamento de Antioquia (moderada + severa)	Porcentaje	35,9	NA	
22	Efectividad de la atención a las familias para la garantía de derechos	Porcentaje	60	NA	
24	Transformación Digital en el sector educativo	Porcentaje	60	ND	
40	Incremento de la conectividad a internet en el Departamento de Antioquia.	Porcentaje	78	ND	
52	Grado de Apertura Comercial	Porcentaje	43	ND	
55	Índice Departamental de Innovación para Colombia -IDIC	Porcentaje	66,9	ND	
57	Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados	ha	250	ND	

Fuente: Información extraída del ERIPD rendido por el Departamento, (2025).

- 9) Se detecta que el Departamento de Antioquia NO reporta el Código del sector y Sector de los indicadores de Resultados, generando un reporte incompleto del ERIPD.

#	Código del Sector	Nombre del Sector	Nombre Indicador de Resultado	Unidad de Medida	Meta del Cuatrienio
15			Medallas de oro obtenidas en juegos deportivos nacionales y para nacionales	Número	249
17			Índice de desigualdad de género	Número	0,26

Fuente: Información extraída del ERIPD rendido por el Departamento, (2025).

Cordialmente,

NATALIA T.G.

NATALIA TRUJILLO GONZALEZ
Contralor Auxiliar - Proyectos Especiales
P/E/ Alejandro Palacio Sánchez, Contralor Auxiliar
R/ Asdrúbal Gutiérrez Valdés, Contralor Auxiliar



2. ASPECTOS PRELIMINARES

2.1. Introducción

La Contraloría General de Antioquia, a través de la Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, pone a disposición de los sujetos de control, de las corporaciones públicas y de todas las partes interesadas, el primer Informe Individual de Control de Resultados al plan de Desarrollo Territorial **2024 - 2027**.

En el presente informe se da un concepto de cumplimiento del Plan Acción según los criterios de eficacia y eficiencia; se presenta el avance del Plan de Desarrollo igualmente según los criterios de eficacia y eficiencia, y del avance en la ejecución financiera del mismo. Igualmente se hace un análisis diferenciado del criterio de efectividad (avance en indicadores de resultado), el cual ya no hace parte de los criterios de evaluación del Plan de Desarrollo, esta decisión se toma teniendo en cuenta que la mayoría de los indicadores de resultado tienen varios años de retraso en su medición, por lo que la ejecución de estos no corresponde con resultados de la gestión de los gobernantes actuales.

La fuente de información para la elaboración del informe de control de resultados a los planes de desarrollo territoriales, la constituye la información rendida por el sujeto de control, en el aplicativo o sistema destinado por la Contraloría general de Antioquia para tal fin. Esta información será rendida anualmente en un anexo en Excel, la cual debe coincidir con los reportes generados por el sistema de medición de los planes de desarrollo territoriales del Departamento De Planeación Nacional DNP.

2.2. Justificación

Establece el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución Política que:

(...) Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo (...)

La Ley 152 de 1994 en el inciso primero del artículo 31 establece que:

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos en la presente Ley (...)



Por su parte, la ley 42 de 1993, “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen” establece en su artículo nueve que:

Para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes. PARÁGRAFO. Otros sistemas de control, que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría General de la República, mediante reglamento especial.

Además, en el artículo 13 de la misma ley, se define el sistema de **control de resultados** como: “el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logra sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un período determinado.”

En este contexto, la Contraloría General de Antioquia, en el marco de su **Plan Estratégico Corporativo 2022–2025**, se ha planteado como meta hacer informes de seguimiento a los planes de desarrollo territoriales de sus sujetos de control, como una forma de: 1) Promover el cumplimiento de las normas asociadas a la formulación, adopción y ejecución del plan de desarrollo territorial. 2) Promover la formulación técnica de estos instrumentos de planeación. 3) Promover la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución y cumplimiento de las metas de estos planes y 4) Promover la cultura del seguimiento y la evaluación en los entes territoriales, como medio para el logro de los resultados propuestos para el desarrollo territorial (2022).

2.3. Metodología de cálculo

El sistema de seguimiento y evaluación a los planes de Desarrollo y Planes de Acción que se utilizó para el presente informe se soporta en tres ejes, a saber: La ejecución física de los indicadores de producto; la ejecución física de los indicadores de resultado y la ejecución financiera de los indicadores de producto y se evalúan los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Teniendo en cuenta que los indicadores de resultado solo tienen una programación para el cuatrienio (Plan de Desarrollo) y que los indicadores de producto presentan dos programaciones; una meta del cuatrienio (Plan de Desarrollo) y una meta anual (Plan de Acción) se hace un cálculo diferente del cumplimiento para cada uno de estos sistemas de indicadores y metas.



2.3.1. Eficacia

Cohen y Franco (1992), definen la eficacia como:

“Operacionalmente, la eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la población beneficiaria, en un periodo determinado, independiente de los costos que ello implique”. (pág. 102)

Se entiende, para estos efectos, la eficacia como la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las Metas de Producto, multiplicadas por la ponderación. En caso de que la eficacia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%

2.3.2. Eficacia plan de acción

La fórmula de eficacia compara la Meta del año, con la ejecución de la vigencia de los indicadores de producto. Se calcula así la eficacia del plan de acción (PA), como la sumatoria de los cocientes formados por la ejecución de la meta de producto, dividida entre la meta del año de este, esto multiplicado por 100% y por la ponderación de cada indicador de producto, determinada esta por la programación financiera del indicador en el año objeto de medición.

$$Eficacia_{PA} = \sum_i \left(\frac{Ejecución\ meta\ anual\ producto_i}{Meta\ anual\ producto_i} \times Ponderación_{PA} \right) \times 100\%$$

En caso de que la eficacia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%

2.3.3. Eficacia plan de desarrollo

En el plan de desarrollo se compara la sumatoria de las metas anuales del cuatrienio, con la ejecución acumulada (sumatoria de las ejecuciones de los años que lleve de vigencia el plan). Es de aclarar que la sumatoria de las metas anuales del indicador de producto, en los indicadores de mantenimiento y/o con acumulación tipo “acumulada”, no coinciden con la meta del cuatrienio.

Se entiende así la eficacia del Plan de Desarrollo (PD), como la sumatoria de los cocientes formados por la ejecución acumulada de los indicadores de producto (suma de las ejecuciones anuales de la meta de producto), dividida entre la suma de las metas anuales del mismo, esto multiplicado por 100% y por la ponderación de cada indicador de producto (determinada esta por la programación financiera del indicador en el cuatrienio). Como consecuencia, la eficacia del plan de desarrollo en los años 1, 2 y 3 de ejecución son parciales, la definitiva solo se logra al evaluar el último año de vigencia del plan de desarrollo. La fórmula es la siguiente:



$$Eficacia_{PD} = \sum \left(\frac{\sum Ejecución\ metas\ de\ producto_i}{\sum Meta\ producto_i} \times Ponderación_{PD} \right) \times 100\%$$

En caso de que la eficacia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%

2.3.4. Eficiencia

El concepto de eficiencia puede considerarse desde dos perspectivas complementarias: si la cantidad de producto está predeterminada, se persigue minimizar el costo total o medio que se requiere para generarlo; si el gasto total está fijado de antemano, se busca optimizar la combinación de insumos para maximizar el producto. (Cohen & Franco, 1992, pág. 104)

Se entiende como el producto de la eficacia lograda (cumplimiento de metas de producto), multiplicada por el cociente entre el costo unitario programado sobre el costo unitario ejecutado del indicador de producto. En caso de que la eficiencia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%

2.3.4.1. Eficiencia del plan de acción

La eficiencia del Plan de Acción (PA) se entiende como la sumatoria de los productos de la eficacia del Plan de Acción por el cociente entre el Costo Unitario Programado del indicador de producto, y el Costo Unitario Ejecutado en el año, esto multiplicado por la ponderación del Plan de Acción.

$$Eficiencia_{PA} = \sum \left(Eficacia_{PA} \times \frac{Costo_i\ unitario\ programado}{Costo_i\ unitario\ ejecutado} \times Ponderación_{PA} \right)$$

A su vez el Costo Unitario Programado del plan de acción resulta de dividir el costo del producto estimado en el Presupuesto programado, dividido entre la meta de producto de año; y el Costo Unitario Ejecutado en el plan de acción resulta de dividir la ejecución financiera en el año del indicador de producto, entre la ejecución física del año. En caso de que la eficiencia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%

2.3.4.2. Eficiencia del plan de desarrollo

La eficiencia del Plan de Desarrollo (PD) se entiende como la sumatoria de la multiplicación de la eficacia del Plan de Desarrollo por el cociente entre el Costo Unitario Programado del indicador de producto, dividido entre el Costo Unitario Ejecutado Acumulado, esto multiplicado por la ponderación del Plan de Desarrollo.



$$Eficiencia_{PD} = \sum \left(Eficacia_{PD} \times \frac{\text{Costo}_i \text{ programado del cuatrienio}}{\text{Costo}_i \text{ ejecutado acumulado}} \times Ponderación_{PD} \right)$$

A su vez el Costo Unitario Programado del plan de desarrollo es el reportado por los sujetos de control; y el Costo Unitario Ejecutado Acumulado resulta de dividir la ejecución financiera Acumulada en todos los años de ejecución del indicador de producto, entre la ejecución física acumulada del indicador de producto. En caso de que la eficiencia del indicador supere el 100%, la calificación será del 100%

2.3.5. Efectividad

2.3.5.1. Concepto de indicador de resultados

Son aquellos que cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública; comparan cuantitativa o cualitativamente los objetivos planificados y resultados logrados, por ende, son indicadores que muestran el beneficio inmediato de la implementación del proyecto. (DNP, 2018)

Se entiende la Efectividad como la “Eficacia” de los indicadores de Resultado. Esto teniendo en cuenta que los indicadores de resultado miden el cambio en la situación problema que se pretende cambiar con los productos que se ofrecen a la comunidad. Esto implica que es posible que se cumpla a nivel de productos, pero no necesariamente se solucione el problema (meta de resultado). Como las metas de resultado no están anualizadas, su análisis se hace solamente para el cuatrienio, es decir en el Plan de Desarrollo.

Como se puede concluir de lo anterior, las metas de resultado tratan de cambiar una situación encontrada en los diagnósticos por lo que en primer lugar, en las fórmulas tiene un papel preponderante la línea base del indicador; y en segundo lugar y en relación con lo anterior, en los casos de metas de mantenimiento, se deben utilizar diferentes fórmulas dependiendo si el indicador es intrínsecamente positivo o negativo, es decir, si es deseable que el indicador aumente o disminuya en su resultado.

2.3.5.2. Fórmula general de efectividad

La fórmula general de efectividad se aplica cuando la meta del indicador es de incremento o de reducción ($PDM\Delta$). Esta fórmula compara el cambio en el indicador (Ejecución menos línea base), con la meta real o cambio esperado (Meta menos línea base) y lo multiplica por cien y por la ponderación de los indicadores de producto asociados ($PDIP$). Así, para el indicador de resultado i :



$$Efectividad_{PDM\Delta} = \sum_i \left(\frac{Ejecución_i - Línea base_i}{Meta cuatrienio_i - Línea base_i} \times Ponderación_{PDIP} \right) \times 100\%$$

2.3.5.3. Fórmula de efectividad en metas de mantenimiento cuando el indicador es de “Incrementar”

Cuando la meta es de mantenimiento y el indicador intrínsecamente es deseable aumentarlo (*MI*), partimos de dos axiomas: si se logra la meta (mantener la línea base), la efectividad es el 100%; y si el indicador sobre pasa la meta, la efectividad es mayor que 100 y si, por el contrario, la ejecución es inferior a la meta, la efectividad debe dar un valor menor que 100.

En este sentido, la fórmula de efectividad parte del 100% y se le suma el cociente entre la desviación de la línea base (ejecución – línea base), sobre la línea base. Así, si la ejecución sobre pasa la meta, el numerador será positivo y la efectividad será mayor que 100 y por el contrario si la ejecución es inferior a la línea base, el numerador será negativo y el cociente se restará de 100.

$$Efectividad_{PDMI} = \sum_i \left(100 + \frac{Ejecución_i - Línea base_i}{Meta cuatrienio_i - Línea base_i} \times Ponderación_{PDIP} \right) \times 100\%$$

2.3.5.4. Fórmula de efectividad en metas de mantenimiento cuando el indicador es de “Reducir”:

Cuando la meta es de mantenimiento y el indicador intrínsecamente es deseable disminuirlo (positivo) (*MR*), partimos de dos axiomas: Al igual que el caso anterior, si se logra la meta (mantener la línea base), la efectividad es el 100%; y si el indicador sobre pasa la meta, la efectividad es menor que 100 y si, por el contrario, la ejecución es inferior a la meta, la efectividad debe dar un valor mayor que 100.

En este sentido, la fórmula de efectividad parte del 100% y se le Resta el cociente entre la desviación de la línea base (ejecución – línea base), sobre la línea base. Así, si la ejecución sobre pasa la meta, el numerador será positivo y la efectividad será menor que 100 y por el contrario si la ejecución es inferior a la línea base, el numerador será negativo y el cociente se sumará a 100.

$$Efectividad_{PDMR} = \sum_i \left(100 - \frac{Ejecución_i - Línea base_i}{Meta cuatrienio_i - Línea base_i} \times Ponderación_{PDIP} \right) \times 100\%$$



2.3.6. Ponderaciones

Las ponderaciones de los indicadores de producto se calculan con base en las programaciones financieras de cada indicador. La ponderación de los indicadores de producto para el cálculo de la eficacia y eficiencia de la vigencia se calcula dividiendo el monto apropiado presupuestalmente en el año para el indicador, entre el total apropiado en el año

La ponderación de los indicadores de producto para el cálculo de la eficacia y eficiencia acumulada del cuatrienio se calcula dividiendo el valor programado en Plan Plurianual de Inversiones para el indicador (Costo programado total en el “KPT”), entre la sumatoria del total del costo programado para el cuatrienio de todo el plan de desarrollo.

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

3.1. Calidad de la información

- 1) La información presentada por la **Gobernación de Antioquia** cuenta con los requerimientos mínimos para realizar la evaluación de los indicadores del plan de desarrollo vigencia 2024-2027.
- 2) No obstante, se detectaron errores o inconsistencias, en la calidad de la información, que pudieren afectar los resultados de la evaluación, tales como los detectados en los indicadores de resultado: “Cobertura de acueducto” y “Cobertura de alcantarillado”. Además, se detectaron errores o inconsistencias en la rendición de los indicadores de producto antes descritos.

3.2. Análisis Comparativo Plan de Acción

TABLA 5. Análisis comparativo del plan de acción

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027				
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
Comportamiento Comparativo Plan de Acción				
CRITERIO	2024	2025	2026	2027
Eficacia Plan de Acción	84,69			
Eficiencia Plan de Acción	82,71			
Cumplimiento Plan de Acción	83,90			

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Gráfico 1: Análisis comparativo del plan de acción



Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)




3.3. Análisis Comparativo Plan de Desarrollo

TABLA 6. Análisis comparativo plan de desarrollo

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027				
Ente Territorial_ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
Comportamiento Comparativo Plan de Desarrollo				
CRITERIO	2024	2025	2026	2027
Eficacia Plan de Desarrollo	16,29			
Eficiencia Plan de Desarrollo	21,07			
Cumplimiento Plan de Desarrollo	18,20			

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Gráfico 2: Análisis comparativo plan de Desarrollo.

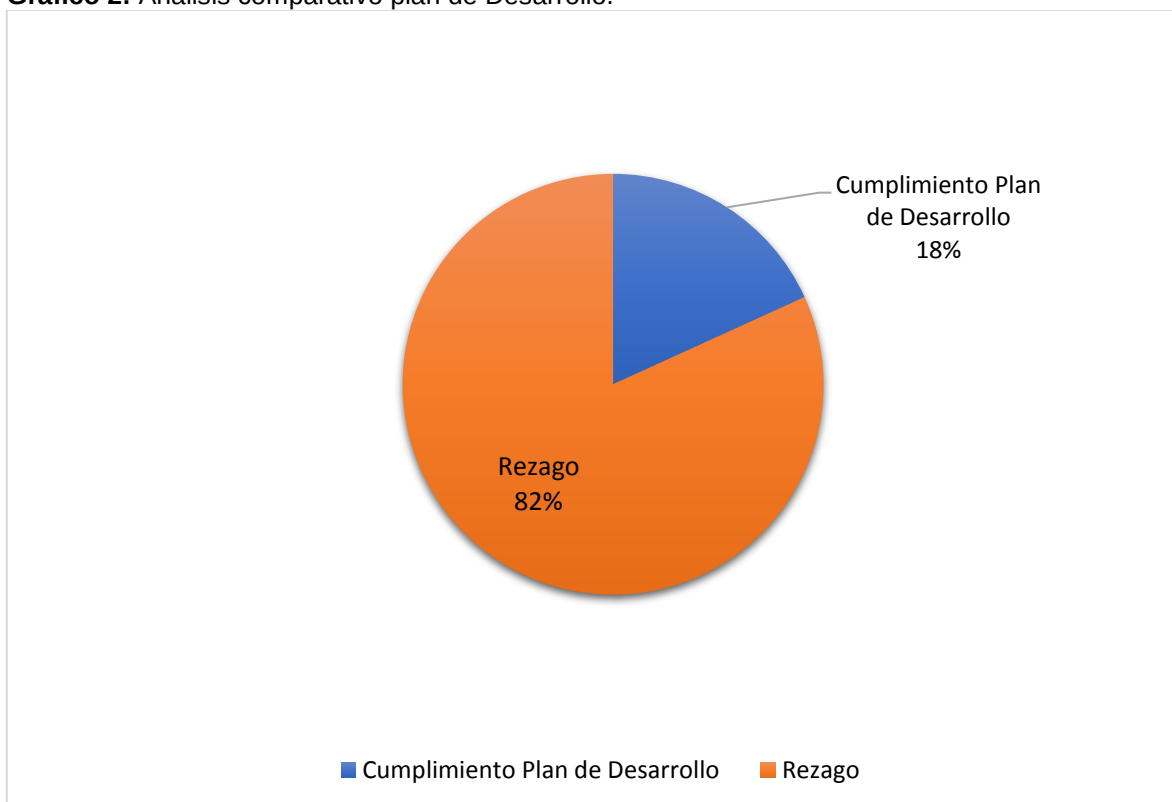

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)




3.4. Análisis Comparativo Efectividad

TABLA 7. Análisis comparativo Efectividad.

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027				
Ente Territorial_ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
Comportamiento Efectividad (Avance en Metas de Resultado)				
CRITERIO	2024	2025	2026	2027
Efectividad (avance en metas de resultado)	31,59			

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Gráfico 3: Análisis comparativo Efectividad.

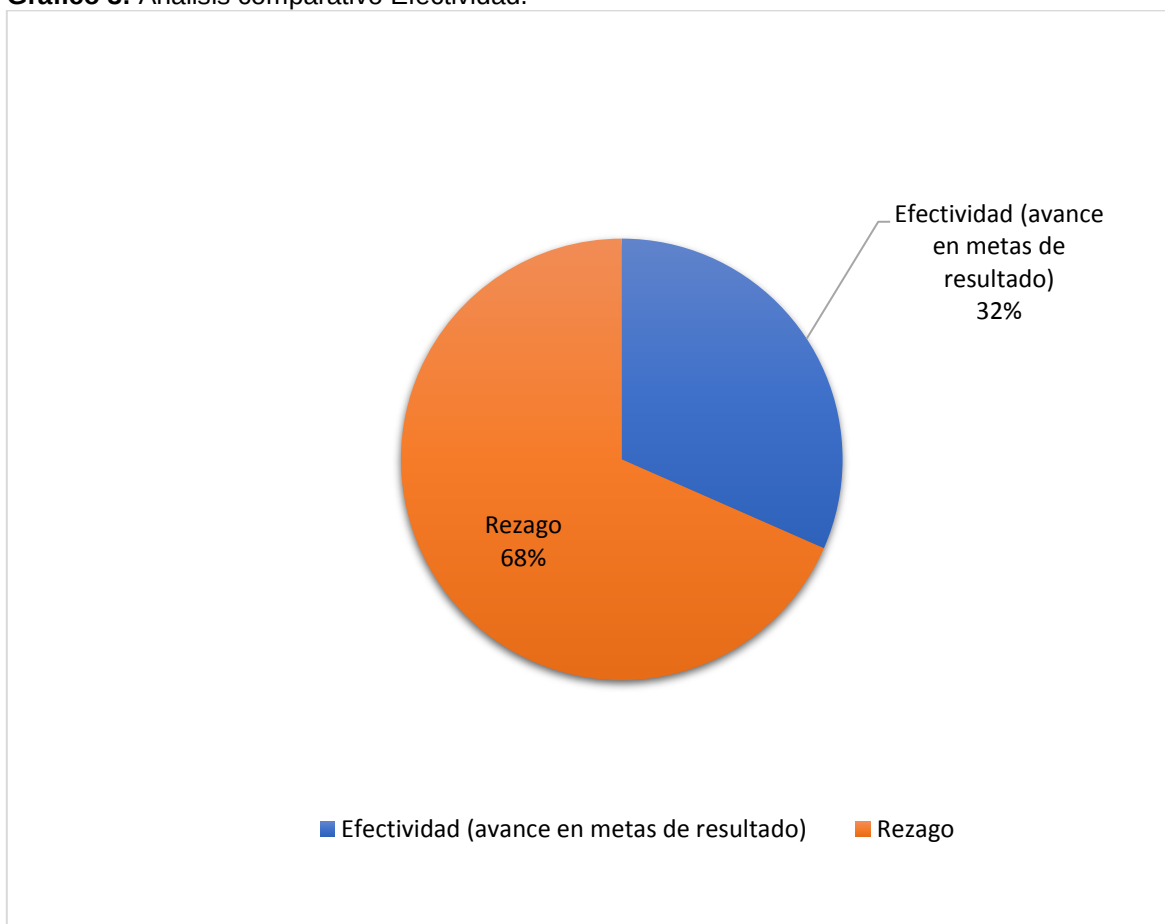


Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)



3.5. Ejecución Financiera.


Gráfico 4. Ejecución financiera.

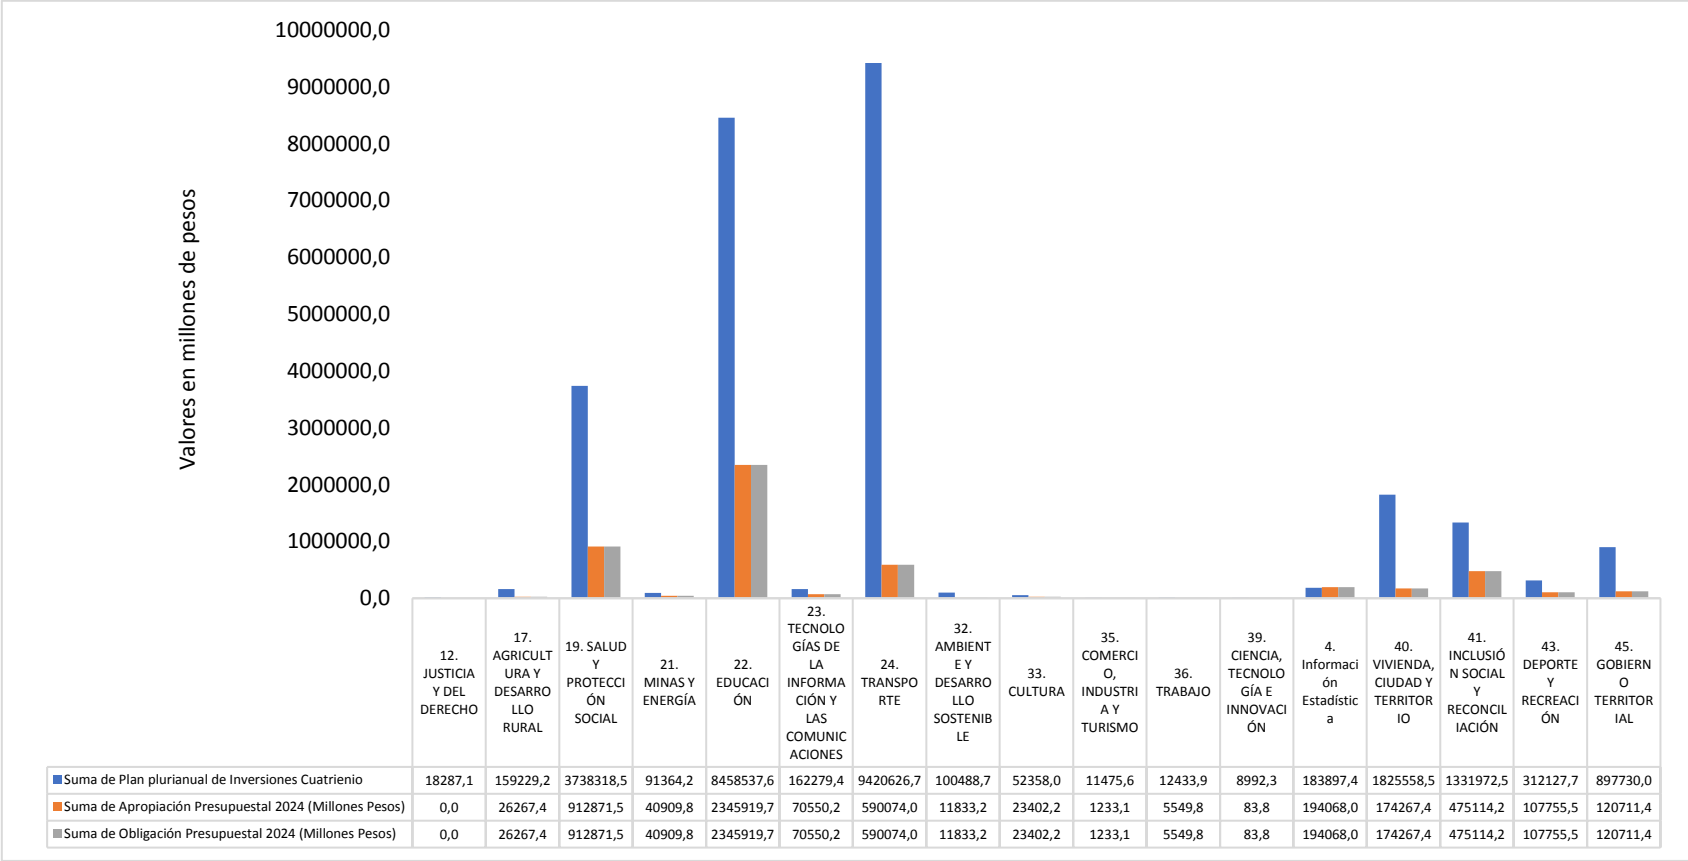

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)



Gráfico 5: Ejecución presupuestal por líneas estratégicas

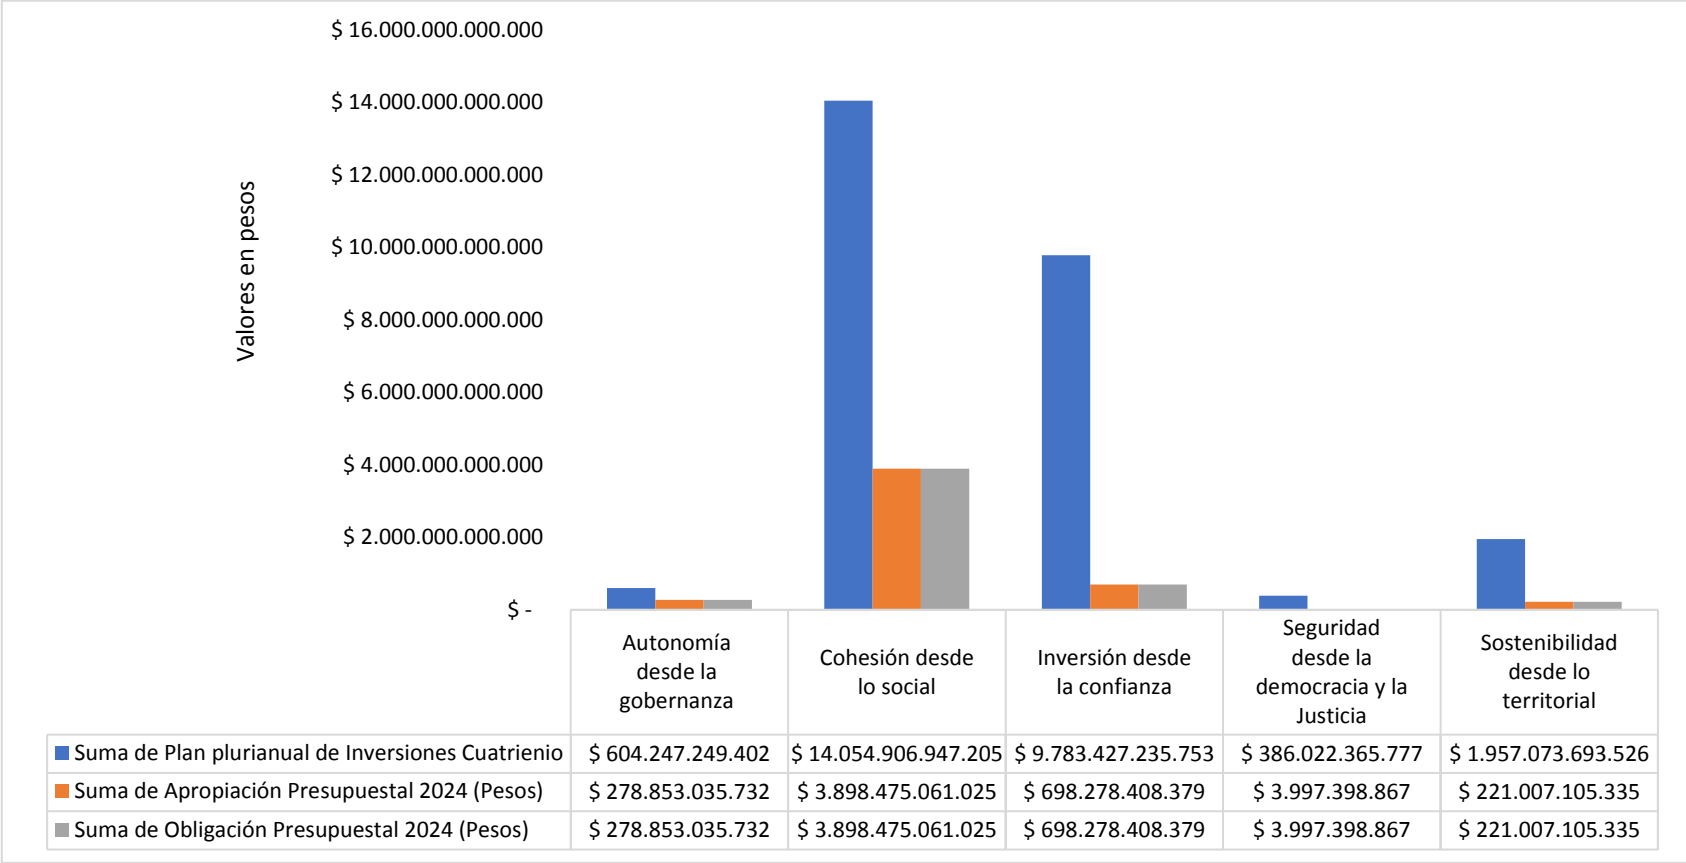

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

3.6. Número de Indicadores Plan de Desarrollo


TABLA 8. Número de Indicadores Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027					
Ente Territorial_ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
Número de Indicadores	2024	2025	2026	2027	
Total, Indicadores de producto	283				
Indicadores de producto programados en la vigencia	245				
Indicadores de producto Sobresaliente	202				
Indicadores de producto Satisfactorio	5				
Indicadores de producto Medio	6				
Indicadores de producto Bajo	8				
Indicadores de producto Crítico	24				
Total, Indicadores de resultado	70				
Indicadores de resultado efectivos Igual al 100%	12				
Indicadores de resultado menos que efectivos Inferior al 100%	58				

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)




Gráfico 6: Número de indicadores de producto programados y ejecutados

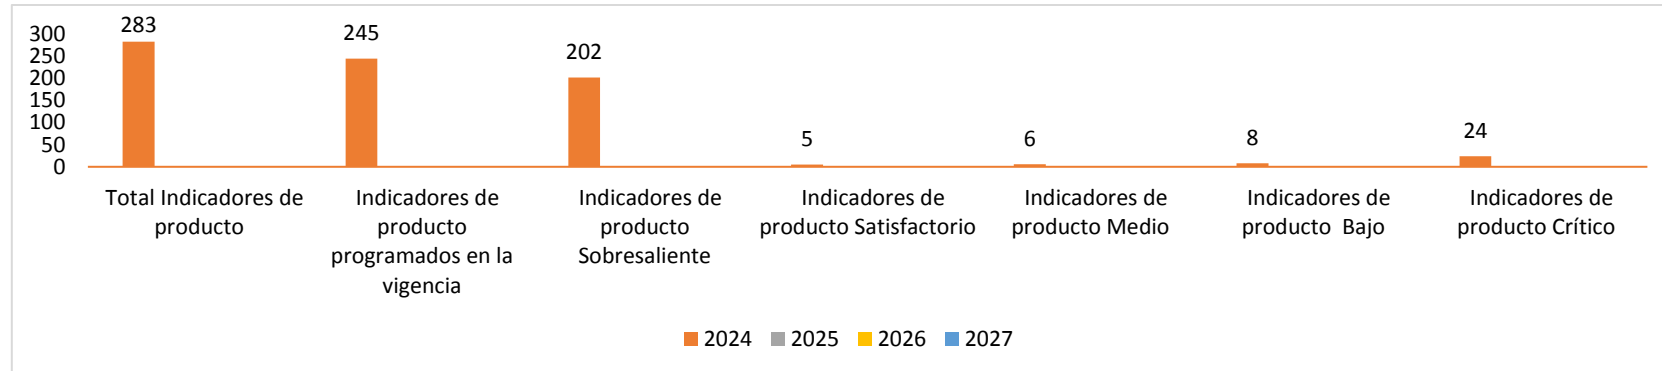

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

Gráfico 7: Número de indicadores de resultado

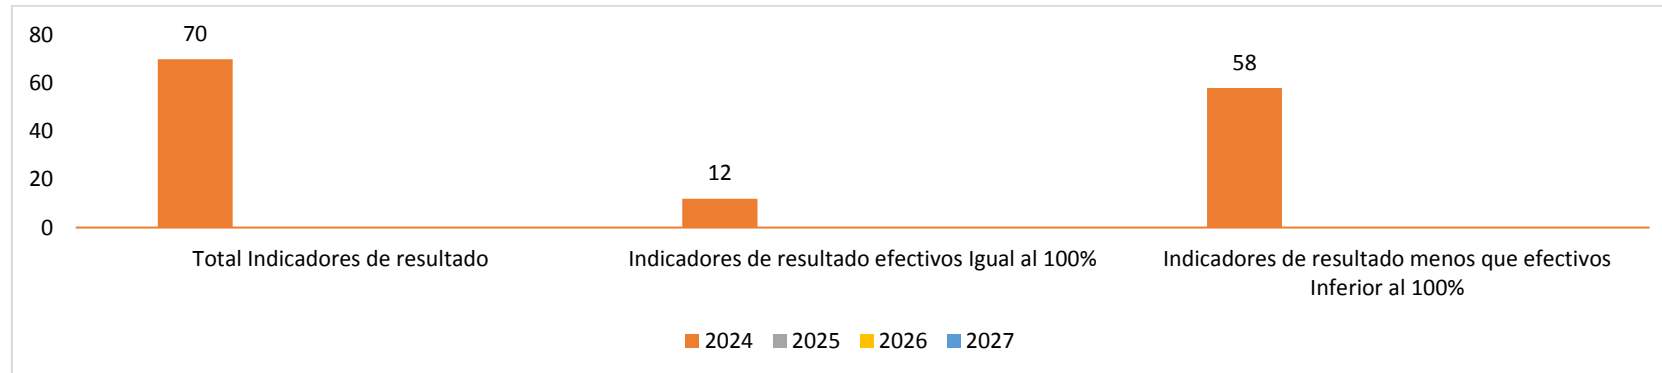

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)



ANALISIS GENERAL DE LA EVALUACION

Cumplimiento de requisitos legales del plan.

- En cuanto al cumplimiento de los requisitos de legalidad del plan de desarrollo se detectó que el Departamento de Antioquia rindió el MFMP, el concepto de las CARs que hacen presencia en el departamento, el concepto del CTP, el plan de acción.
- Sin embargo, no se evidencia el Acta de consejo de gobierno para aprobar, el plan indicativo, además se evidenció que rindió parcialmente el acto administrativo de Armonización Presupuestal.

Ejecución de los indicadores.

- Se encuentra que 245 de los 283 indicadores de producto tuvieron ejecución en la vigencia.
- Se evidenció 40 indicadores de producto sin ejecución en la vigencia 2024.
- Se encuentra que para la vigencia 2024 los 245 indicadores de productos programados se ejecutaron así:
 - Sobresaliente: 202 indicadores lo que representa el 82,45% de los indicadores de producto programados.
 - Satisfactorio: 5 indicadores lo que representa el 2,04%
 - Medio: 6 indicadores lo que representa 2,45%
 - Bajo: 8 indicadores lo que representa 3,26%
 - Crítico: 24 indicadores lo que representa el 9,79%

Cumplimiento del plan de acción y plan de desarrollo

- Se encuentra que la ejecución del plan de acción de la vigencia 2024 presenta un cumplimiento del 83,90%, el cual es considerado (Sobresaliente).



- Mientras que el plan de desarrollo con una ejecución tan solo del 18.20% que es considerado crítico, sin embargo, es importante realizar la claridad que el resultado es crítico, debido a que la calificación se pondera sobre el cuatrienio y la administración departamental empezó su ejecución apenas en la vigencia 2024.

Eficiencia en relación con la eficacia.


- La eficiencia del plan de acción de la vigencia 2024 presenta un valor de 82,71 el cual es 1,98 más bajo que la eficacia del mismo periodo, lo que significa que los indicadores de producto se ejecutaron con unos precios unitarios más altos a los programados.
- La eficiencia del plan de desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027” de la vigencia 2024 presenta un valor de 21,07 el cual es 4,78 por encima de la eficacia del mismo periodo, lo que significa que los indicadores de producto se ejecutaron con unos precios unitarios más bajos a los programados.

Efectividad.

- La efectividad o cumplimiento de los indicadores de resultado, presentó un valor de 31,59% en la vigencia 2024, explicado en el hecho de que 58 indicadores presentaron ejecuciones por debajo del 100%, de los cuales 33 indicativos tienen una calificación de cero (0) en su efectividad.

Ejecución financiera.

- Se observa que la ejecución financiera del plan de acción alcanza el 100% de lo presupuestado en la vigencia.
- Se encuentra que la ejecución financiera acumulada del plan de desarrollo alcanza el 19,04% de lo presupuestado para el cuatrienio en el Plan Plurianual de Inversiones.

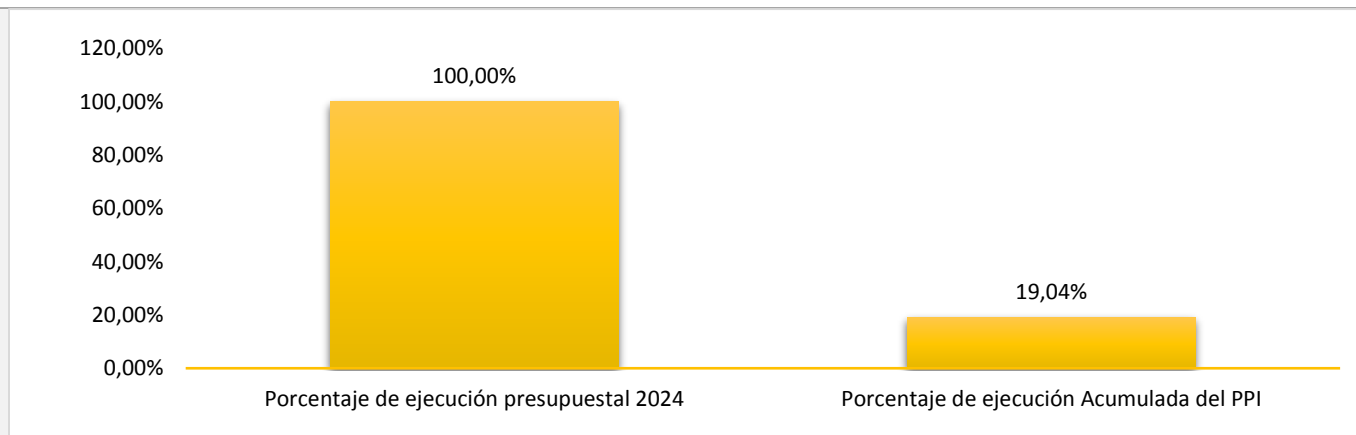

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

- Se evidencia que el sector con mayor ejecución, del plan de desarrollo, fue el de 22. *Educación* con una inversión de 2345919,7 millones de pesos y el de menor ejecución fue el de 12. *Justicia y del Derecho* con una inversión de cero (0) pesos.
- Se evidencia que la línea estratégica con mayor ejecución, del plan de desarrollo, fue la de *Línea – Cohesión desde lo social* con una inversión de 3.898.475.061.025 pesos y el de menor ejecución fue la de *Línea – Seguridad desde la democracia y la justicia* con una inversión de 3.997.398.867 pesos.



3.7. Análisis de legalidad del plan de desarrollo y plan de acción

En la siguiente tabla se describen los documentos que soportan la legalidad de la adopción del plan de desarrollo “**POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027**” y plan de acción **2024** del departamento de Antioquia

INSTRUMENTO	ANEXO	OBSERVACIONES
Plan de Desarrollo 2024 - 2027	Concepto del Consejo territorial de Planeación	Se evidenció que el departamento realizó la rendición del Concepto del Consejo territorial de Planeación
	Concepto de la Corporación Autónoma Regional	Se evidenció que el departamento realizó la rendición del el Concepto de la Corporación Autónoma Regional: CORNARE con radicado CS-02979-2024 del 21 de marzo de 2024 CORANTIOQUIA con radicado 090-COI2403-7209 del 21 de marzo de 2024 CORPOURABA con radicado 100-03-20-99-0342-2... del 21 de marzo de 2024 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA con radicado 00-006072 del 22 de marzo de 2024
	Acta de aprobación del Plan Indicativo (Consejo de Gobierno)	Se evidenció que el departamento NO realizó la rendición de la Acta de aprobación del Plan Indicativo por parte del Consejo de Gobierno
	Acto Administrativo de Armonización del presupuesto al plan de desarrollo 2024 - 2027	Se evidenció que el departamento realizó la rendición parcial del Acto Administrativo de Armonización del presupuesto al plan de desarrollo 2024 – 2027
Plan de Acción 2024	Acta de aprobación del Plan de Acción	Se evidenció que el departamento realizó la rendición del acta de aprobación donde se evidencia la aprobación del Plan de Acción por parte del Consejo de Gobierno.
	Marco fiscal de mediano plazo	Se evidenció que el departamento realizó la rendición del Marco fiscal de mediano plazo de 2024 -2033



4. CUMPLIMIENTO DE METAS

Como se explicado anteriormente, la base de cálculo del cumplimiento del plan de acción y Plan de Desarrollo son los indicadores tanto de producto como de resultado.

4.1. Metas de producto

Se presentan a continuación la relación de las metas de producto contempladas en el plan de desarrollo “**POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027**” y su ejecución con corte a 31 de diciembre de **2024**, la cual soporta el resultado obtenido en los factores de eficacia y eficiencia.

Anexo 1. Ejecución indicadores de producto.

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
1	Entidades, organismos y dependencias fortalecidos en los procesos de participación ciudadana	117	117	114	97,4	114	24,4
2	Instancias formales y no formales de participación fortalecidas	30	5	23	100,0	23	32,9
3	Estrategia para la promoción de la participación, la formación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social	1	0,25	0,25	100,0	0,25	10,0
4	Estrategia para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de los Organismos de Acción Comunal	1	0,25	0,25	100,0	0,25	10,0
5	Alianzas para la promoción de nuevos liderazgos e integración generacional en los Organismos de Acción Comunal	3	1	3	100,0	3	37,5
6	Comités interinstitucionales y alianzas público-privadas implementadas, que promueven el empoderamiento de las organizaciones comunales en el departamento	6	1	4	100,0	4	28,6
7	Consejos de paz acompañados para su fortalecimiento	125	20	35	100,0	35	28,0
8	Planes de acción de las mesas de víctimas departamental y municipales asesoradas y acompañadas para participación efectiva	64	8	8	100,0	8	12,5
9	Mesas de Derechos Humanos asesoradas o asistidas técnicamente para la elaboración y ejecución de los planes de acción de derechos humanos municipales.	50	10	6	60,0	6	12,0
10	Comités de libertad religiosa y de cultos fortalecidos	21	6	4	66,7	4	19,0
11	Municipios PDET y ZOMAC asistidos técnicamente o asesorados para acceso a oferta pública o privada	55	14	14	100,0	14	25,5
12	Personas acompañadas en la búsqueda de personas desaparecidas.	1000	200	250	100,0	250	25,0
13	Acciones para las iniciativas de memoria y reconciliación para la construcción de paz.	9	1	1	100,0	1	11,1



Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
14	Espacios colectivos de reincorporación acompañados para el fortalecimiento del proyecto de vida de firmantes de paz	6	1	1	100,0	1	16,7
15	Alianzas para contribuir e impulsar la sustitución de usos de cultivos de uso ilícito	4	1	0	0,0	0	0,0
16	Entidades asistidas técnicamente para su fortalecimiento en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas)	64	8	12	100,0	12	18,8
17	Asistencia humanitaria prestada a víctimas del conflicto armado.	1	1	1	100,0	1	25,0
18	Municipios asistidos técnicamente en herramientas y rutas para la protección y garantía de derechos de la población migrante	40	10	12	100,0	12	30,0
19	Asistencias humanitarias a líderes y defensores de DDHH y otras personas en el marco de vulneraciones de DDHH	1	1	1	100,0	1	25,0
20	Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la política pública de DDHH, sus rutas de atención y cofinanciación de proyectos	80	10	36	100,0	36	45,0
21	Proyectos cofinanciados para el desarrollo de programas sociales en el marco de la garantía del derecho a la libertad religiosa	16	2	2	100,0	2	12,5
22	Líderes indígenas asistidos técnicamente	64	10	10	100,0	10	15,6
23	Territorios indígenas formalizados o regularizados	3	NP	1	0,0	1	33,3
24	Comunidades afrocolombianas asesoradas y asistidas técnicamente	10	10	10	100,0	10	25,0
25	Acciones para el beneficio de las comunidades afrodescendientes ejecutadas	40	8	8	100,0	8	20,0
26	Municipios y distritos capacitados en la implementación de estudios afrocolombianos	51	12	12	100,0	12	23,5
27	Gerencia contra delitos implementada	16	4	4	100,0	4	25,0
28	Grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad creados y fortalecidos	10000	2500	2346	93,8	2346	23,5
29	Estrategia en sitio para la recuperación de espacios-Casas de vicio	100	25	20	80,0	20	20,0
30	Proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset)	25	5	5	100,0	5	20,0
31	Cámaras implementadas, fortalecidas e integradas al SIES	5000	1200	1648	100,0	1648	33,0
32	Implementación del SIES Departamental para el fortalecimiento de la seguridad	1	0,3	0,3	100,0	0,3	30,0
33	Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) para la atención ciudadana dotadas	104	NP	NA	0,0	NA	0,0
34	Instalaciones del Sistema Penitenciario y Carcelario dotadas	10	NP	NA	0,0	NA	0,0
35	Intervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas	40	5	5	100,0	5	12,5
36	Estrategias de intervención integral para la prevención del delito implementada	126	26	26	100,0	26	20,6
37	Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPAS) dotados	25	14	5	35,7	5	20,0
38	Observatorio de política criminal en funcionamiento	40	10	10	100,0	10	10,0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
39	Estrategias para el abordaje integral de los delitos ambientales	1	0,25	0,25	100,0	0,25	25,0
40	Instancias territoriales asistidas técnicamente en aspectos relacionados con la convivencia ciudadana	36	4	4	100,0	4	11,1
41	Proyectos de cárceles estructurados	3	NP	NA	0,0	NA	0,0
42	Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada	12	NP	NA	0,0	NA	0,0
43	Instalaciones del Sistema Penitenciario y Carcelario adecuadas	5	NP	NA	0,0	NA	0,0
44	Estrategias de seguridad vial implementadas	7	2	4	100,0	4	19,0
45	Municipios apoyados con agentes de tránsito	60	35	28	80,0	28	14,7
46	Entidades del sector salud al servicio del cuidado integral por curso de vida y enfoque diferencial en Antioquia	266	27	27	100,0	27	4,6
47	Visitas de vigilancia a entidades del sector salud con capacidad técnica para la gestión del riesgo a nivel individual y colectivo realizadas	576	147	152	100,0	152	10,5
48	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	36	9	9	100,0	9	10,0
49	Estrategia para la prevención y conciencia del consumo de licor formulada	1	NP	0,25	0,0	0,25	25,0
50	Entidades asesoradas en la implementación del ecosistema de salud mental	641	155	155	100,0	155	9,9
51	Estrategias de la Promoción de la Salud mental implementadas	5	2	2	100,0	2	14,3
52	Instituciones fortalecidas técnica, administrativa y financieramente para garantizar la sostenibilidad y resolutiveidad en la atención integral en salud	123	12	85	100,0	85	31,5
53	Visitas de IVC para el aseguramiento, protección de la población PPNA y Sistema de Emergencias y Desastres realizadas	281	61	61	100,0	61	8,7
54	Evaluaciones municipales para la certificación en salud y fortalecimiento de la gestión realizadas	4	1	1	100,0	1	10,0
55	Entidades con asistencia técnica para la implementación de la arquitectura en tecnologías de Información e interoperabilidad en el marco de la transformación digital en salud	111	17	17	100,0	17	6,0
56	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales realizadas	4	1	1	100,0	1	10,0
57	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones relacionadas con enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis	48	12	12	100,0	12	10,0
58	Campañas de gestión del riesgo para la implementación del Plan de Adaptación del Cambio Climático en Salud	4	1	1	100,0	1	10,0
59	Dotaciones en recreación, actividad física, deporte social comunitario entregadas	492	154	154	100,0	154	31,3
60	Personas atendidas en programas de recreación, deporte formativo y actividad física para el Bienestar	365600	365600	383842	100,0	383842	26,2
61	Personas beneficiadas en juegos deportivos institucionales	65816	36893	53635	100,0	53635	81,5



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 202510005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
62	Talento humano de Antioquia capacitado para fortalecer habilidades en recreación, actividad física y formación en deporte para el Bienestar	3600	450	1822	100,0	1822	50,6
63	Municipios apoyados, asesorados y acompañados en programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	125	125	125	100,0	125	25,0
64	Organizaciones deportivas de alto rendimiento apoyadas	13	13	42	100,0	42	80,8
65	Atletas con apoyo técnico	1600	1600	1927	100,0	1927	30,1
66	Estímulos entregados para el desarrollo deportivo de atletas	1600	1600	40368	100,0	40368	100,0
67	Servicios de atención médica especializada para el desarrollo deportivo de atletas realizados	15000	15000	20185	100,0	20185	33,6
68	Personas en semilleros de talentos deportivos	257	257	257	100,0	257	25,0
69	Infraestructura deportiva construida	18	NP	NA	0,0	NA	0,0
70	Escenarios deportivos o equipamientos adecuados, mantenidos o mejorados.	80	8	0	0,0	0	0,0
71	Sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados	3	3	2	66,7	2	16,7
72	Sedes operativas, para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones funcionales y con mantenimiento	3	3	0	0,0	0	0,0
73	Estrategias de promoción de la garantía de derechos humanos de las mujeres implementadas	40	10	10	100,0	10	25,0
74	Estrategias de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad implementadas	28	7	7	100,0	7	25,0
75	Mujeres y empresas beneficiadas con capital semilla	500	100	210	100,0	210	42,0
76	Personas capacitadas para el uso del tiempo y la generación de ingresos para la autonomía económica de las mujeres	3000	3000	6264	100,0	6264	52,2
77	Entidades asistidas técnicamente en sistema del cuidado	27	5	6	100,0	6	22,2
78	Espacios generados en el marco del sistema departamental del cuidado	70	30	34	100,0	34	17,4
79	Personas de la comunidad en general sensibilizadas y capacitadas en promoción de derechos de la población LGBTI	5000	500	500	100,0	500	10,0
80	Personas de la población LGBTI atendidas en garantía y restablecimiento de derechos	2000	200	81	40,5	81	4,1
81	Centros Dia/Vida Construidos	10	3	6	100,0	6	23,1
82	Centros Vida para el adulto mayor dotados	33	9	26	100,0	26	32,1
83	Centros de Protección Social para el Adulto Mayor Construidos	4	NP	1	0,0	1	14,3
84	Centros de Protección Social Dotados	6	1	3	100,0	3	23,1
85	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	19000	12000	16632	100,0	16632	26,0
86	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	1500	200	200	100,0	200	13,3
87	Cuidadores, familiares y responsables de personas con discapacidad cualificados	2000	300	321	100,0	321	16,1
88	Municipios y Distritos asistidos técnicamente en garantía de derechos para la población joven	32	32	40	100,0	40	32,0
89	Encuentros de formación en participación, liderazgo y resolución de conflictos realizados	36	9	8	88,9	8	22,2



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
90	Estrategia de empleo y emprendimiento implementada	1	0,25	0	0,0	0	0,0
91	Banco de iniciativas juveniles implementado	1	0,25	0,3	100,0	0,3	12,0
92	Gestantes, niños y niñas de 0 a 5 años atendidos en servicios integrales	40000	11000	8326	75,7	8326	7,4
93	Agentes educativos de educación inicial y de atención integral a la primera infancia cualificados	3000	500	394	78,8	394	13,1
94	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	3	NP	NA	0,0	NA	0,0
95	Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	8	NP	NA	0,0	NA	0,0
96	Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas	50	NP	NA	0,0	NA	0,0
97	Hogares con acompañamiento familiar	20000	3000	1886	62,9	1886	4,1
98	Escolares beneficiados con raciones de alimentos	305261	305261	309706	100,0	309706	25,4
99	Beneficiarios con transferencias para la seguridad alimentaria y nutricional.	450000	105000	105759	100,0	105759	9,2
100	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	3000	600	761	100,0	761	10,3
101	Gestantes, niños y niñas menores de 7 años atendidos con complementación alimentaria	40000	7000	6344	90,6	6344	15,9
102	Personas vinculadas a empleo para la población del programa de Alimentación escolar	6000	4000	5370	100,0	5370	24,4
103	Niños, niñas y adolescentes atendidos en entornos protectores	13000	2000	2011	100,0	2011	6,5
104	Municipios asistidos técnicamente para la prevención de las violencias sexuales en niñas, niños y adolescentes	125	10	10	100,0	10	8,0
105	Sedes Educativas oficiales que implementan la jornada escolar extendida	2500	500	111	22,2	111	1,7
106	Sedes Educativas oficiales que implementan la jornada Complementaria	400	150	150	100,0	150	14,3
107	Sedes educativas oficiales que implementan la jornada única	88	70	73	100,0	73	23,1
108	Sedes educativas dotadas con mobiliario escolar	1000	100	849	100,0	849	84,9
109	Niños, niñas y adolescentes de establecimientos educativos oficiales apoyados en sus aptitudes y vocaciones científicas	20000	2000	0	0,0	0	0,0
110	Modelos educativos para grupos étnicos acompañados	5	3	3	100,0	3	17,6
111	Número de niños y niñas con servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con 6 o más atenciones	8000	500	265	53,0	265	1,6
112	Estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales	430000	430000	419207	97,5	419207	24,4
113	Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral.	100	25	9	36,0	9	3,6
114	Estudiantes oficiales con discapacidad y talentos excepcionales atendidos con apoyos pedagógicos.	7652	7652	7643	99,9	7643	25,0
115	Estudiantes beneficiados con estrategias de fomento para el acceso a programas de articulación y media técnica	30000	7500	8471	100,0	8471	28,2
116	Estudiantes beneficiados con Becas o créditos condonables para cursar programas de educación postsecundaria y terciaria	34000	8500	0	0,0	0	0,0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
117	Estudiantes beneficiados con apoyo financiero para la matrícula en el Programa de Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores Oficiales del Departamento.	2800	700	735	100,0	735	26,3
118	Establecimientos educativos asesorados en la implementación de la ruta de atención integral, protocolos para la convivencia y el Gobierno Escolar	550	100	96	96,0	96	17,5
119	Estudiantes beneficiados con transporte escolar	40000	40000	41169	100,0	41169	25,7
120	Establecimientos educativos que reciben acompañamiento para la implementación de Modelos Educativos Flexibles	120	NP	NA	0,0	NA	0,0
121	Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	10400	NP	364	0,0	364	3,5
122	Nodos para el aprendizaje dotados.	5	NP	NA	0,0	NA	0,0
123	Docentes de establecimientos educativos oficiales formados en lengua extranjera inglés	300	NP	301	0,0	301	100,0
124	Docentes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con procesos de formación en competencias TIC y digital.	1500	300	299	99,7	299	19,9
125	Estudiantes oficiales beneficiados con procesos de formación en lengua extranjera inglés	25000	3000	548	18,3	548	2,2
126	Sedes educativas mejoradas	3414	500	624	100,0	624	18,3
127	Sedes educativas conectadas a internet	3414	3000	2355	78,5	2355	18,4
128	Parques y ciudadelas educativos conectados a internet	88	88	85	96,6	85	24,1
129	Dispositivos tecnológicos para la transformación digital educativa en las sedes entregados	7200	1800	6024	100,0	6024	83,7
130	Docentes y administrativos beneficiados con las políticas de bienestar integral	16178	4045	7802	100,0	7802	48,2
131	Procesos de formación para docentes oficiales o agentes educativos para el mejoramiento de sus capacidades y competencias	200	20	20	100,0	20	10,0
132	Experiencias pedagógicas o prácticas educativas de maestros, maestras y directivos docentes reconocidas	750	100	10	10,0	10	1,3
133	Establecimientos Educativos oficiales acompañados en la revisión, actualización o resignificación del PEI o PEC y en el diseño e implementación de los PMI	240	40	74	100,0	74	30,8
134	Establecimientos Educativos oficiales acompañados en la formulación o implementación de los proyectos pedagógicos.	200	NP	17	0,0	17	8,5
135	Establecimientos Educativos con inspección, vigilancia y control del servicio educativo	550	100	174	100,0	174	31,6
136	Escuelas Normales Superiores que reciben acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa	17	17	17	100,0	17	25,0
137	Estrategias implementadas para la innovación y el desempeño de los procesos de la secretaría de educación	4	1	2	100,0	2	20,0
138	Centros de investigación e innovación educativa para maestros y maestras operando	9	NP	NA	0,0	NA	0,0
139	Estrategia desarrollada para la articulación y la gobernanza del sistema de educación terciaria y superior departamental	1	NP	NA	0,0	NA	0,0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
140	Ambientes digitales de aprendizaje en funcionamiento: Escuela digital de artes y oficios	1	NP	NA	0,0	NA	0,0
141	Proyectos pedagógicos productivos financiados	435	NP	7	0,0	7	1,6
142	Estudiantes beneficiados del programa de Educación Rural	35160	28430	29163	100,0	29163	22,5
143	Estudiantes beneficiados con la estrategia de Universidad en el Campo	6044	664	150	22,6	150	2,5
144	Sistema de información del sector artístico y cultural en operación	1	1	1	100,0	1	25,0
145	Infraestructuras culturales intervenidas	55	11	11	100,0	11	20,0
146	Estímulos al sector artístico y cultural otorgados	300	300	307	100,0	307	25,6
147	Sedes artísticas y culturales dotadas	300	50	102	100,0	102	34,0
148	Contenidos culturales en circulación	20	4	4	100,0	4	20,0
149	Cupos de educación formal ofertados	100	NP	NA	0,0	NA	0,0
150	Personas capacitadas en Formación artística y cultural	1200	1200	1238	100,0	1238	25,8
151	Entidades con programas de formación artística y cultural asistidas técnicamente	40	40	13	32,5	13	8,1
152	Emprendimientos culturales beneficiados	100	100	105	100,0	105	26,3
153	Instancias formales y no formales de participación fortalecidas	14	14	14	100,0	14	25,0
154	Sistema de Gestión del ICPA Actualizado	1	1	1	100,0	1	25,0
155	Planeación e investigación sobre patrimonio cultural realizada.	18	4	4	100,0	4	22,2
156	Intervenciones en bienes muebles de interés cultural realizadas	2	NP	NA	0,0	NA	0,0
157	Espacio público adecuado	100000	10000	60450,314	100,0	60450,314	60,5
158	Equipamientos construidos	5	4	2	50,0	2	40,0
159	Túnel y vías de acceso construidas	6	NP	NA	0,0	NA	0,0
160	Aeropuertos o Aeródromos mejorados y en operación	15	NP	NA	0,0	NA	0,0
161	Sistema de transporte público de pasajeros fortalecido	1	NP	0,1428363	0,0	0,1428363	14,3
162	Vía primaria mantenidas	63	63	63	100,0	63	25,0
163	Cables Aéreos sostenibles construidos y operando	3	NP	NA	0,0	NA	0,0
164	Muelles o Embarcaderos Mejorados	4	NP	NA	0,0	NA	0,0
165	Vías secundarias mejoradas	1040	140	39,44411	28,2	39,44411	3,8
166	Vías secundarias mantenidas	5000	5000	2007,475	40,1	2007,475	10,0
167	Vías terciarias mejoradas	500	50	135,12406	100,0	135,12406	27,0
168	Vías terciarias mantenidas	10000	1000	1066,572	100,0	1066,572	10,7
169	Vía urbana mejorada	30	5	11,96146	100,0	11,96146	39,9
170	Estudios y diseños para proyectos de Infraestructura realizados	41	NP	14	0,0	14	34,1
171	Vía férrea estructurada	2	NP	NA	0,0	NA	0,0
172	Estudios de preinversión para el sistema férreo realizados	5	NP	NA	0,0	NA	0,0
173	Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	1	1	1	100,0	1	25,0



Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
174	Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC	4000	NP	NA	0,0	NA	0,0
175	Puntos de acceso a Internet con diferentes tecnologías	4000	NP	NA	0,0	NA	0,0
176	Estrategia para ampliar y mejorar la cobertura del servicio a internet implementada	1	0,25	0,25	100,0	0,25	25,0
177	Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica	14000	3500	3637	100,0	3637	10,4
178	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	1041	900	0	0,0	0	0,0
179	Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	1000	354	0	0,0	0	0,0
180	Procesos de formalización o regularización de predios para el desarrollo rural	5700	1700	255	15,0	255	4,5
181	Campesinos y productores agropecuarios apoyados con sistemas de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria	1650	660	650	98,5	650	39,4
182	Unidades productivas fortalecidas a través de programas de cofinanciación y procesos asociativos para la generación de valor agregado y acceso a la exportación	1925	850	816	96,0	816	42,4
183	Proyectos productivos con enfoque agroecológico implementados	4	1	1	100,0	1	25,0
184	Programas y estrategias asociativas creadas para el fortalecimiento de encadenamientos comerciales regionales, nacionales e internacionales	10	1	1	100,0	1	10,0
185	Unidades productivas agropecuarias beneficiadas	354	144	394	100,0	394	100,0
186	Formulación del nuevo Plan Departamental de Extensión Agropecuaria- PDEA	1	1	1	100,0	1	100,0
187	Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	10000	500	5959	100,0	5959	59,6
188	Productores con acceso a crédito agropecuario y rural	300	NP	NA	0,0	NA	0,0
189	Pequeños productores cubiertos con seguro agropecuario	2400	1200	0	0,0	0	0,0
190	Productores atendidos con estrategias de información comercial o comercio exterior	805	328	777	100,0	777	96,5
191	Sistemas de información para la comercialización actualizado.	1	1	1	100,0	1	25,0
192	Eventos de transferencia de tecnología realizados	8	2	2	100,0	2	25,0
193	Unidades productivas ganaderas fortalecidas	1267	131	110	84,0	110	8,7
194	Infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria intervenida	32	8	14	100,0	14	43,8
195	Áreas reforestadas con sistema silvopastoriles	2000	464	275	59,3	275	13,8
196	Estrategias para el fomento y el desarrollo del sector minero-energético realizadas	26	2	7	100,0	7	26,9
197	Estrategias de planeación del sector minero-energético ejecutadas	9	1	1	100,0	1	11,1
198	Unidades productivas del sector minero-energético formadas	4000	280	899	100,0	899	22,5
199	Entidades territoriales, autoridades, comunidades y grupos de valor acompañados en la diversificación de la matriz energética	80	10	5	50,0	5	6,3
200	Proyectos de infraestructura turística apoyados	9	2	1	50,0	1	11,1
201	Entidades Territoriales acompañadas en la gestión y promoción para el desarrollo turístico.	80	10	8	80,0	8	10,0
202	Estrategias regionales de promoción turística lideradas y apoyadas	13	3	3	100,0	3	25,0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
203	Redes de turismo, Innovación, productividad y sostenibilidad fortalecidas	4	1	2	100,0	2	20,0
204	Observatorio turístico sostenible de Antioquia SITA implementado	1	1	1	100,0	1	25,0
205	Personas formadas en procesos enfocados al sector turístico	2000	500	1029	100,0	1029	51,5
206	Estrategias para el cierre de brechas de competitividad sectorial y subregional implementadas	4	1	1	100,0	1	25,0
207	Unidades productivas con modelos de negocios apoyados con microcrédito/apalancamiento	3000	45	778	100,0	778	12,9
208	Planes de negocios financiados	320	80	90	100,0	90	11,3
209	Personas formadas-mujeres, jóvenes,migrantes-en habilidades y competencias empresariales funcionales	2200	400	620	100,0	620	12,4
210	Plazas de mercado intervenidas como dinamizadores económicos locales	6	NP	2	0,0	2	33,3
211	Estrategias implementadas para el desarrollo de la agenda departamental de competitividad e innovación	4	1	1	100,0	1	10,0
212	Eventos de promoción y marketing para la atracción de Inversión Extranjera Directa realizados	7	1	5	100,0	5	71,4
213	Estrategias de acompañamiento en fomento exportador implementadas	4	1	1	100,0	1	25,0
214	Proyectos estratégicos apoyados	5	1	2	100,0	2	40,0
215	Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación creado e implementado	1	0,25	0,25	100,0	0,25	25,0
216	Proyectos de investigación e innovación con integración de actores sociales apoyados	4	1	1,33	100,0	1,33	33,3
217	Áreas con esquema de pago por servicios ambientales implementado	50000	45000	36143,7	80,3	36143,7	18,5
218	Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal	1000	200	288,1	100,0	288,1	28,8
219	Áreas protegidas	30000	30000	49322,6	100,0	49322,6	41,1
220	Emprendimientos verdes sostenibles apoyados	42	35	0	0,0	0	0,0
221	Monitoreo de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño realizado	4	1	1	100,0	1	25,0
222	Manglar en proceso de restauración	250	50	33,5	67,0	33,5	13,4
223	Estrategias educativo-ambientales y de participación implementadas	12	12	10	83,3	10	20,8
224	Estrategias articuladas para impulsar la competitividad como un modelo sostenible y circular	10	10	10	100,0	10	25,0
225	Áreas en proceso de restauración en mantenimiento	1000	250	347,7	100,0	347,7	34,8
226	Árboles nativos sembrados	1625000	275000	301253	100,0	301253	18,5
227	Estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y su fauna silvestre asociada ejecutadas	4	1	1	100,0	1	25,0
228	Áreas en proceso de restauración	150	NP	NA	0,0	NA	0,0
229	Entidades territoriales acompañadas en su gestión de la calidad del aire	40	10	10	100,0	10	25,0
230	Planes y estudios con orientaciones para el ordenamiento territorial departamental realizados	5	1	3	100,0	3	21,4
231	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente con la escuela de ecología territorial	3	NP	NA	0,0	NA	0,0
232	Sistema de Alerta Temprana implementado	1	1	1	100,0	1	25,0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPO	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
233	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	12	2	5	100,0	5	41,7
234	Organismos de atención de emergencias equipados	30	5	15	100,0	15	50,0
235	Cuerpos de bomberos voluntarios fortalecidos	94	22	22	100,0	22	23,4
236	Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados	1	0,25	0,25	100,0	0,25	10,0
237	Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados	62	10	0	0,0	0	0,0
238	Infraestructura para el bienestar animal cofinanciados	40	5	0	0,0	0	0,0
239	Animales en estado de indefensión o vulnerabilidad atendidos	2000	400	4375	100,0	4375	100,0
240	Caninos y felinos esterilizados	130000	10000	19728	100,0	19728	15,2
241	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	116	54	47	87,0	47	13,4
242	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	63	28	22	78,6	22	11,8
243	Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano implementadas	4000	1000	341	34,1	341	3,4
244	Municipios apoyados con vehículos de recolección de residuos sólidos	30	15	13	86,7	13	14,4
245	Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas	3	1	2	100,0	2	22,2
246	Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construidas	3	1	1	100,0	1	11,1
247	Estudios o diseños para la construcción u optimización de alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos realizados	1	0,5	0	0,0	0	0,0
248	Prestadores de servicios públicos asistidos técnicamente	125	125	121	96,8	121	24,2
249	Viviendas nuevas en las zonas urbanas y rurales gestionadas	50000	7500	3651	48,7	3651	7,3
250	Predios titulados y edificaciones legalizadas	20000	3000	2260	75,3	2260	11,3
251	Viviendas urbanas y rurales mejoradas	100000	15000	12563	83,8	12563	12,6
252	Municipios y Distritos intervenidos con la estrategia Antioquia Pinta Firme	125	18	11	61,1	11	8,8
253	Ruedas de cooperación y filantropía realizadas	4	1	1	100,0	1	25,0
254	Esquemas asociativos territoriales asistidos técnicamente	11	11	21	100,0	21	47,7
255	Sistemas de información e Infraestructura TI actualizados	20	10	10	100,0	10	15,4
256	Organismos asistidos técnicamente en gestión del talento humano	15	5	5	100,0	5	11,6
257	Metodologías aplicadas al talento humano en cultura, conocimiento, cambio y competencias	8	2	2	100,0	2	11,1
258	Estructura organizacional y empleo público optimizada	4	1	1	100,0	1	10,0
259	Personas capacitadas en talento humano	2600	520	2105	100,0	2105	32,4
260	Rendición de cuentas realizadas	2	2	2	100,0	2	25,0
261	Entidades, organismos y dependencias asistidas técnicamente en comunicaciones	8	2	2	100,0	2	25,0
262	Sistemas de información CRM y digitalización de trámites implementados	3	1	0	0,0	0	0,0
263	Personas atendidas con oferta institucional articulada	50000	50000	405994	100,0	405994	100,0
264	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente en atención a la ciudadanía	90	15	19	100,0	19	21,1
265	Sedes institucionales adecuadas	4	1	1	100,0	1	25,0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 1: Ejecución de Indicadores de Producto							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO			ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO	
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Ejecución 2024	% ejec 2024	Ejec Acum	% ejec Acum
266	Programa de saneamiento de bienes ejecutado	80	15	15	100,0	15	7,5
267	Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas	1	0,1	0,1	100,0	0,1	10,0
268	Organismos del nivel central asistidos técnicamente en materia de defensa jurídica	1	1	1	100,0	1	25,0
269	Diligencias de inspección realizadas a entidades sin ánimo de lucro	11200	1200	1553	100,0	1553	13,9
270	Modelo de abastecimiento estratégico y fortalecimiento a la gestión contractual aplicado	1	0,25	0,25	100,0	0,25	25,0
271	Sistema de gestión documental implementado	1	0,67	0,69	100,0	0,69	22,3
272	Documentos de lineamientos técnicos de control interno realizados	4	1	1	100,0	1	25,0
273	Modelo de Gestión para el conglomerado público implementado	1	0,25	0,25	100,0	0,25	10,0
274	Asamblea Departamental Fortalecida	1	1	1	100,0	1	25,0
275	Pago de pasivos laborales de la administración pública realizados.	5750	5720	5720	100,0	5720	24,9
276	Programas para el fortalecimiento de la hacienda pública implementados	3	3	3	100,0	3	25,0
277	Entidades territoriales asistidas técnicamente en catastro y estatutos tributarios	50	10	89	100,0	89	68,5
278	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	5575515	1115103	2909869	100,0	2909869	52,2
279	Trámites de conservación catastral realizados	310386	91241	81292	89,1	81292	26,2
280	Entidades territoriales asistidas fiscal y financieramente	50	5	77	100,0	77	100,0
281	Entidades territoriales con capacidades técnicas fortalecidas en gestión y proyectos	30	30	125	100,0	125	100,0
282	Modernización del sistema de información estadística	1	NP	NA	0,0	NA	0,0
283	Instrumentos de producción y análisis de datos para la toma de decisiones implementados	16	2	2	100,0	2	5,3

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

4.2. Ejecución financiera

Se presentan a continuación la relación de los Indicadores de producto con su ejecución financiera con corte a 31 de diciembre de **2024**, la cual, junto con la ejecución física, soporta el resultado obtenido en el factor de eficiencia.



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Anexo 2. Informe de Ejecución financiera de Indicadores de producto

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial_ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
1	Entidades, organismos y dependencias fortalecidos en los procesos de participación ciudadana	1.963.914.190	100,0	17.227.317	1.963.914.190	100,7	17.227.317
2	Instancias formales y no formales de participación fortalecidas	-	0,0	-	-	0,0	-
3	Estrategia para la promoción de la participación, la formación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social	-	0,0	-	-	0,0	-
4	Estrategia para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de los Organismos de Acción Comunal	-	0,0	-	-	0,0	-
5	Alianzas para la promoción de nuevos liderazgos e integración generacional en los Organismos de Acción Comunal	-	0,0	-	-	0,0	-
6	Comités interinstitucionales y alianzas público-privadas implementadas, que promueven el empoderamiento de las organizaciones comunales en el departamento	-	0,0	-	-	0,0	-
7	Consejos de paz acompañados para su fortalecimiento	-	0,0	-	-	0,0	-
8	Planes de acción de las mesas de víctimas departamental y municipales asesoradas y acompañadas para participación efectiva	-	0,0	-	-	0,0	-
9	Mesas de Derechos Humanos asesoradas o asistidas técnicamente para la elaboración y ejecución de los planes de acción de derechos humanos municipales.	-	0,0	-	-	0,0	-
10	Comités de libertad religiosa y de cultos fortalecidos	-	0,0	-	-	0,0	-
11	Municipios PDET y ZOMAC asistidos técnicamente o asesorados para acceso a oferta pública o privada	-	0,0	-	-	0,0	-
12	Personas acompañadas en la búsqueda de personas desaparecidas.	-	0,0	-	-	0,0	-
13	Acciones para las iniciativas de memoria y reconciliación para la construcción de paz.	-	0,0	-	-	0,0	-
14	Espacios colectivos de reincorporación acompañados para el fortalecimiento del proyecto de vida de firmantes de paz	-	0,0	-	-	0,0	-
15	Alianzas para contribuir e impulsar la sustitución de usos de cultivos de uso ilícito	-	0,0	-	-	0,0	-
16	Entidades asistidas técnicamente para su fortalecimiento en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas)	-	0,0	-	-	0,0	-
17	Asistencia humanitaria prestada a víctimas del conflicto armado.	-	0,0	-	-	0,0	-
18	Municipios asistidos técnicamente en herramientas y rutas para la protección y garantía de derechos de la población migrante	-	0,0	-	-	0,0	-



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
19	Asistencias humanitarias a líderes y defensores de DDHH y otras personas en el marco de vulneraciones de DDHH	-	0,0	-	-	0,0	-
20	Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la política pública de DDHH, sus rutas de atención y cofinanciación de proyectos	-	0,0	-	-	0,0	-
21	Proyectos cofinanciados para el desarrollo de programas sociales en el marco de la garantía del derecho a la libertad religiosa	-	0,0	-	-	0,0	-
22	Líderes indígenas asistidos técnicamente	283.135.241	100,0	28.313.524	283.135.241	19,5	28.313.524
23	Territorios indígenas formalizados o regularizados	20.000.000	100,0	20.000.000	20.000.000	1,6	20.000.000
24	Comunidades afrocolombianas asesoradas y asistidas técnicamente	27.992.820	100,0	2.799.282	27.992.820	127,2	2.799.282
25	Acciones para el beneficio de las comunidades afrodescendientes ejecutadas	226.800.042	100,0	28.350.005	226.800.042	9,8	28.350.005
26	Municipios y distritos capacitados en la implementación de estudios afrocolombianos	-	0,0	-	-	0,0	-
27	Gerencia contra delitos implementada	-	0,0	-	-	0,0	-
28	Grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad creados y fortalecidos	-	0,0	-	-	0,0	-
29	Estrategia en sitio para la recuperación de espacios-Casas de vicio	-	0,0	-	-	0,0	-
30	Proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset)	-	0,0	-	-	0,0	-
31	Cámaras implementadas, fortalecidas e integradas al SIES	-	0,0	-	-	0,0	-
32	Implementación del SIES Departamental para el fortalecimiento de la seguridad	-	0,0	-	-	0,0	-
33	Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) para la atención ciudadana dotadas	-	0,0	-	-	0,0	-
34	Instalaciones del Sistema Penitenciario y Carcelario dotadas	-	0,0	-	-	0,0	-
35	Intervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas	-	0,0	-	-	0,0	-
36	Estrategias de intervención integral para la prevención del delito implementada	-	0,0	-	-	0,0	-
37	Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPAS) dotados	-	0,0	-	-	0,0	-
38	Observatorio de política criminal en funcionamiento	-	0,0	-	-	0,0	-
39	Estrategias para el abordaje integral de los delitos ambientales	-	0,0	-	-	0,0	-
40	Instancias territoriales asistidas técnicamente en aspectos relacionados con la convivencia ciudadana	-	0,0	-	-	0,0	-
41	Proyectos de cárceles estructurados	-	0,0	-	-	0,0	-



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
42	Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada	-	0,0	-	-	0,0	-
43	Instalaciones del Sistema Penitenciario y Carcelario adecuadas	-	0,0	-	-	0,0	-
44	Estrategias de seguridad vial implementadas	1.325.872.674	100,0	331.468.169	1.325.872.674	29,6	331.468.169
45	Municipios apoyados con agentes de tránsito	149.683.900	100,0	5.345.854	149.683.900	6,2	5.345.854
46	Entidades del sector salud al servicio del cuidado integral por curso de vida y enfoque diferencial en Antioquia	47.785.094.448	100,0	1.769.818.313	47.785.094.448	62,6	1.769.818.313
47	Visitas de vigilancia a entidades del sector salud con capacidad técnica para la gestión del riesgo a nivel individual y colectivo realizadas	13.425.255.753	100,0	88.324.051	13.425.255.753	8,1	88.324.051
48	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	4.838.144.603	100,0	537.571.623	4.838.144.603	46,8	537.571.623
49	Estrategia para la prevención y conciencia del consumo de licor formulada	-	0,0	-	-	0,0	-
50	Entidades asesoradas en la implementación del ecosistema de salud mental	8.767.618.261	100,0	56.565.279	8.767.618.261	29,9	56.565.279
51	Estrategias de la Promoción de la Salud mental implementadas	17.112.960.512	100,0	8.556.480.256	17.112.960.512	7479,4	8.556.480.256
52	Instituciones fortalecidas técnica, administrativa y financieramente para garantizar la sostenibilidad y resolutiveidad en la atención integral en salud	224.681.150.233	100,0	2.643.307.650	224.681.150.233	56,1	2.643.307.650
53	Visitas de IVC para el aseguramiento, protección de la población PPNA y Sistema de Emergencias y Desastres realizadas	497.648.193.043	100,0	8.158.167.099	497.648.193.043	18,9	8.158.167.099
54	Evaluaciones municipales para la certificación en salud y fortalecimiento de la gestión realizadas	48.196.946.730	100,0	48.196.946.730	48.196.946.730	25,6	48.196.946.730
55	Entidades con asistencia técnica para la implementación de la arquitectura en tecnologías de Información e interoperabilidad en el marco de la transformación digital en salud	13.409.910.321	100,0	788.818.254	13.409.910.321	40,9	788.818.254
56	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales realizadas	33.660.995.239	100,0	33.660.995.239	33.660.995.239	195,7	33.660.995.239
57	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones relacionadas con enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis	14.275.710.834	100,0	1.189.642.570	14.275.710.834	6,9	1.189.642.570
58	Campañas de gestión del riesgo para la implementación del Plan de Adaptación del Cambio Climático en Salud	2.479.461.184	100,0	2.479.461.184	2.479.461.184	14,4	2.479.461.184
59	Dotaciones en recreación, actividad física, deporte social comunitario entregadas	3.718.580.542	100,0	24.146.627	3.718.580.542	19,5	24.146.627
60	Personas atendidas en programas de recreación, deporte formativo y actividad física para el Bienestar	4.169.468.015	100,0	10.862	4.169.468.015	12,2	10.862
61	Personas beneficiadas en juegos deportivos institucionales	25.445.465.791	100,0	474.419	25.445.465.791	53,7	474.419



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
62	Talento humano de Antioquia capacitado para fortalecer habilidades en recreación, actividad física y formación en deporte para el Bienestar	842.016.858	100,0	462.139	842.016.858	12,4	462.139
63	Municipios apoyados, asesorados y acompañados en programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	8.734.576.933	100,0	69.876.615	8.734.576.933	21,3	69.876.615
64	Organizaciones deportivas de alto rendimiento apoyadas	8.039.152.287	100,0	191.408.388	8.039.152.287	29,3	191.408.388
65	Atletas con apoyo técnico	9.035.672.700	100,0	4.688.984	9.035.672.700	20,5	4.688.984
66	Estímulos entregados para el desarrollo deportivo de atletas	28.583.880.457	100,0	708.083	28.583.880.457	211,0	708.083
67	Servicios de atención médica especializada para el desarrollo deportivo de atletas realizados	3.356.881.388	100,0	166.306	3.356.881.388	49,0	166.306
68	Personas en semilleros de talentos deportivos	2.646.326.807	100,0	10.296.991	2.646.326.807	19,0	10.296.991
69	Infraestructura deportiva construida	2.999.086.345	100,0	-	2.999.086.345	26,7	-
70	Escenarios deportivos o equipamientos adecuados, mantenidos o mejorados.	10.184.392.894	100,0	-	10.184.392.894	21,9	-
71	Sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados	3.218.167.859	100,0	1.609.083.930	3.218.167.859	19,0	1.609.083.930
72	Sedes operativas, para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones funcionales y con mantenimiento	1.642.344.247	100,0	-	1.642.344.247	64,6	-
73	Estrategias de promoción de la garantía de derechos humanos de las mujeres implementadas	356.502.807	100,0	35.650.281	356.502.807	1,0	35.650.281
74	Estrategias de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad implementadas	3.845.495.976	100,0	549.356.568	3.845.495.976	30,9	549.356.568
75	Mujeres y empresas beneficiadas con capital semilla	675.000.000	100,0	3.214.286	675.000.000	9,5	3.214.286
76	Personas capacitadas para el uso del tiempo y la generación de ingresos para la autonomía económica de las mujeres	135.614.458	100,0	21.650	135.614.458	0,7	21.650
77	Entidades asistidas técnicamente en sistema del cuidado	498.425.459	100,0	83.070.910	498.425.459	11,3	83.070.910
78	Espacios generados en el marco del sistema departamental del cuidado	8.340.034.116	100,0	245.295.121	8.340.034.116	31,5	245.295.121
79	Personas de la comunidad en general sensibilizadas y capacitadas en promoción de derechos de la población LGBTI	191.574.641	100,0	383.149	191.574.641	21,1	383.149
80	Personas de la población LGBTI atendidas en garantía y restablecimiento de derechos	-	0,0	-	-	0,0	-
81	Centros Dia/Vida Construidos	13.271.537.118	100,0	2.211.922.853	13.271.537.118	34,9	2.211.922.853
82	Centros Vida para el adulto mayor dotados	9.209.002.590	100,0	354.192.407	9.209.002.590	36,7	354.192.407
83	Centros de Protección Social para el Adulto Mayor Construidos	914.818.685	100,0	914.818.685	914.818.685	4,2	914.818.685
84	Centros de Protección Social Dotados	860.563.577	100,0	286.854.526	860.563.577	11,5	286.854.526
85	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	79.664.420.072	100,0	4.789.828	79.664.420.072	72,7	4.789.828



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
86	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	209.077.151	100,0	1.045.386	209.077.151	15,3	1.045.386
87	Cuidadores, familiares y responsables de personas con discapacidad cualificados	245.903.469	100,0	766.054	245.903.469	18,0	766.054
88	Municipios y Distritos asistidos técnicamente en garantía de derechos para la población joven	84.731.113	100,0	2.118.278	84.731.113	25,9	2.118.278
89	Encuentros de formación en participación, liderazgo y resolución de conflictos realizados	2.118.278	100,0	264.785	2.118.278	0,1	264.785
90	Estrategia de empleo y emprendimiento implementada	12.709.667	100,0	-	12.709.667	2,3	-
91	Banco de iniciativas juveniles implementado	2.118.278	100,0	7.060.926	2.118.278	1,6	7.060.926
92	Gestantes, niños y niñas de 0 a 5 años atendidos en servicios integrales	14.924.843.033	100,0	1.792.559	14.924.843.033	1151,9	1.792.559
93	Agentes educativos de educación inicial y de atención integral a la primera infancia cualificados	-	0,0	-	-	0,0	-
94	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	-	0,0	-	-	0,0	-
95	Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	-	0,0	-	-	0,0	-
96	Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas	-	0,0	-	-	0,0	-
97	Hogares con acompañamiento familiar	1.686.107.711	100,0	894.013	1.686.107.711	42,4	894.013
98	Escolares beneficiados con raciones de alimentos	156.750.979.941	100,0	506.128	156.750.979.941	24,5	506.128
99	Beneficiarios con transferencias para la seguridad alimentaria y nutricional.	132.351.502.281	100,0	1.251.444	132.351.502.281	34,3	1.251.444
100	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	39.805.967.500	100,0	52.307.447	39.805.967.500	330,1	52.307.447
101	Gestantes, niños y niñas menores de 7 años atendidos con complementación alimentaria	2.185.798.621	100,0	344.546	2.185.798.621	21,4	344.546
102	Personas vinculadas a empleo para la población del programa de Alimentación escolar	21.092.172.560	100,0	3.927.779	21.092.172.560	33,3	3.927.779
103	Niños, niñas y adolescentes atendidos en entornos protectores	1.514.450.626	100,0	753.083	1.514.450.626	237,8	753.083
104	Municipios asistidos técnicamente para la prevención de las violencias sexuales en niñas, niños y adolescentes	111.252.214	100,0	11.125.221	111.252.214	27813,1	11.125.221
105	Sedes Educativas oficiales que implementan la jornada escolar extendida	5.029.947.246	100,0	45.314.840	5.029.947.246	2,6	45.314.840
106	Sedes Educativas oficiales que implementan la jornada Complementaria	-	0,0	-	-	0,0	-
107	Sedes educativas oficiales que implementan la jornada única	-	0,0	-	-	0,0	-
108	Sedes educativas dotadas con mobiliario escolar	600.000.000	100,0	706.714	600.000.000	2,2	706.714
109	Niños, niñas y adolescentes de establecimientos educativos oficiales apoyados en sus aptitudes y vocaciones científicas	-	0,0	-	-	0,0	-
110	Modelos educativos para grupos étnicos acompañados	-	0,0	-	-	0,0	-
111	Número de niños y niñas con servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con 6 o más atenciones	-	0,0	-	-	0,0	-



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
112	Estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales	2.038.994.044.258	100,0	4.863.931	2.038.994.044.258	33,7	4.863.931
113	Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral.	-	0,0	-	-	0,0	-
114	Estudiantes oficiales con discapacidad y talentos excepcionales atendidos con apoyos pedagógicos.	3.911.069.324	100,0	511.719	3.911.069.324	17,8	511.719
115	Estudiantes beneficiados con estrategias de fomento para el acceso a programas de articulación y media técnica	33.269.176	100,0	3.927	33.269.176	0,1	3.927
116	Estudiantes beneficiados con Becas o créditos condonables para cursar programas de educación post-secundaria y terciaria	-	0,0	-	-	0,0	-
117	Estudiantes beneficiados con apoyo financiero para la matrícula en el Programa de Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores Oficiales del Departamento.	3.030.297.629	100,0	4.122.854	3.030.297.629	48,3	4.122.854
118	Establecimientos educativos asesorados en la implementación de la ruta de atención integral, protocolos para la convivencia y el Gobierno Escolar	-	0,0	-	-	0,0	-
119	Estudiantes beneficiados con transporte escolar	9.692.434.077	100,0	235.430	9.692.434.077	12,8	235.430
120	Establecimientos educativos que reciben acompañamiento para la implementación de Modelos Educativos Flexibles	-	0,0	-	-	0,0	-
121	Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	83.129.410.232	100,0	228.377.501	83.129.410.232	809,4	228.377.501
122	Nodos para el aprendizaje dotados.	27.706.417.053	100,0	-	27.706.417.053	261,4	-
123	Docentes de establecimientos educativos oficiales formados en lengua extranjera inglés	-	0,0	-	-	0,0	-
124	Docentes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con procesos de formación en competencias TIC y digital.	-	0,0	-	-	0,0	-
125	Estudiantes oficiales beneficiados con procesos de formación en lengua extranjera inglés	-	0,0	-	-	0,0	-
126	Sedes educativas mejoradas	66.972.326.138	100,0	107.327.446	66.972.326.138	6,3	107.327.446
127	Sedes educativas conectadas a internet	3.654.116.852	100,0	1.551.642	3.654.116.852	1,5	1.551.642
128	Parques y ciudadelas educativos conectados a internet	632.811.902	100,0	7.444.846	632.811.902	31,6	7.444.846
129	Dispositivos tecnológicos para la transformación digital educativa en las sedes entregados	1.043.767.892	100,0	173.268	1.043.767.892	1,6	173.268
130	Docentes y administrativos beneficiados con las políticas de bienestar integral	5.037.415.933	100,0	645.657	5.037.415.933	38,4	645.657
131	Procesos de formación para docentes oficiales o agentes educativos para el mejoramiento de sus capacidades y competencias	33.610.229.012	100,0	1.680.511.451	33.610.229.012	873,0	1.680.511.451



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
132	Experiencias pedagógicas o prácticas educativas de maestros, maestras y directivos docentes reconocidas	150.000.000	100,0	15.000.000	150.000.000	37,5	15.000.000
133	Establecimientos Educativos oficiales acompañados en la revisión, actualización o resignificación del PEI o PEC y en el diseño e implementación de los PMI	-	0,0	-	-	0,0	-
134	Establecimientos Educativos oficiales acompañados en la formulación o implementación de los proyectos pedagógicos.	-	0,0	-	-	0,0	-
135	Establecimientos Educativos con inspección, vigilancia y control del servicio educativo	-	0,0	-	-	0,0	-
136	Escuelas Normales Superiores que reciben acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa	523.285.000	100,0	30.781.471	523.285.000	34,5	30.781.471
137	Estrategias implementadas para la innovación y el desempeño de los procesos de la secretaria de educación	680.185.205	100,0	340.092.603	680.185.205	104,6	340.092.603
138	Centros de investigación e innovación educativa para maestros y maestras operando	260.000.000	100,0	-	260.000.000	39,8	-
139	Estrategia desarrollada para la articulación y la gobernanza del sistema de educación terciaria y superior departamental	56.443.736.954	100,0	-	56.443.736.954	3333,0	-
140	Ambientes digitales de aprendizaje en funcionamiento: Escuela digital de artes y oficios	-	0,0	-	-	0,0	-
141	Proyectos pedagógicos productivos financiados	6.097.941.616	100,0	871.134.517	6.097.941.616	90,4	871.134.517
142	Estudiantes beneficiados del programa de Educación Rural	-	0,0	-	-	0,0	-
143	Estudiantes beneficiados con la estrategia de Universidad en el Campo	-	0,0	-	-	0,0	-
144	Sistema de información del sector artístico y cultural en operación	159.340.359	100,0	159.340.359	159.340.359	14,7	159.340.359
145	Infraestructuras culturales intervenidas	12.530.452.642	100,0	1.139.132.058	12.530.452.642	122,3	1.139.132.058
146	Estímulos al sector artístico y cultural otorgados	3.238.039.583	100,0	10.547.360	3.238.039.583	32,9	10.547.360
147	Sedes artísticas y culturales dotadas	99.213.000	100,0	972.676	99.213.000	4,8	972.676
148	Contenidos culturales en circulación	6.042.770.209	100,0	1.510.692.552	6.042.770.209	54,0	1.510.692.552
149	Cupos de educación formal ofertados	-	0,0	-	-	0,0	-
150	Personas capacitadas en Formación artística y cultural	712.671.995	100,0	575.664	712.671.995	14,5	575.664
151	Entidades con programas de formación artística y cultural asistidas técnicamente	-	0,0	-	-	0,0	-
152	Emprendimientos culturales beneficiados	-	0,0	-	-	0,0	-
153	Instancias formales y no formales de participación fortalecidas	-	0,0	-	-	0,0	-
154	Sistema de Gestión del ICPA Actualizado	-	0,0	-	-	0,0	-
155	Planeación e investigación sobre patrimonio cultural realizada.	527.996.816	100,0	131.999.204	527.996.816	11,5	131.999.204



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
156	Intervenciones en bienes muebles de interés cultural realizadas	91.694.696	100,0	-	91.694.696	7,6	-
157	Espacio público adecuado	2.425.582.808	100,0	40.125	2.425.582.808	4,9	40.125
158	Equipamientos construidos	-	0,0	-	-	0,0	-
159	Túnel y vías de acceso construidas	280.802.018.885	100,0	-	280.802.018.885	36,4	-
160	Aeropuertos o Aeródromos mejorados y en operación	419.055.213	100,0	-	419.055.213	5,6	-
161	Sistema de transporte público de pasajeros fortalecido	30.053.800.000	100,0	210.407.314.736	30.053.800.000	16,2	210.407.314.736
162	Vía primaria mantenidas	1.580.000.000	100,0	25.079.365	1.580.000.000	395000,0	25.079.365
163	Cables Aéreos sostenibles construidos y operando	-	0,0	-	-	0,0	-
164	Muelles o Embarcaderos Mejorados	-	0,0	-	-	0,0	-
165	vías secundarias mejoradas	30.382.831.519	100,0	770.275.499	30.382.831.519	0,7	770.275.499
166	Vías secundarias mantenidas	52.324.136.195	100,0	26.064.651	52.324.136.195	3,8	26.064.651
167	vías terciarias mejoradas	21.584.952.819	100,0	159.741.743	21.584.952.819	1,0	159.741.743
168	vías terciarias mantenidas	24.212.188.636	100,0	22.700.942	24.212.188.636	5,0	22.700.942
169	Vía urbana mejorada	5.474.188.043	100,0	457.652.163	5.474.188.043	4,6	457.652.163
170	Estudios y diseños para proyectos de Infraestructura realizados	84.111.388.406	100,0	6.007.956.315	84.111.388.406	336,4	6.007.956.315
171	Vía férrea estructurada	-	0,0	-	-	0,0	-
172	Estudios de preinversión para el sistema férreo realizados	-	0,0	-	-	0,0	-
173	Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	57.803.540.216	100,0	57.803.540.216	57.803.540.216	23,2	57.803.540.216
174	Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC	-	0,0	-	-	0,0	-
175	Puntos de acceso a Internet con diferentes tecnologías	5.590.038.624	100,0	-	5.590.038.624	30,4	-
176	Estrategia para ampliar y mejorar la cobertura del servicio a internet implementada	27.340.874.612	100,0	109.363.498.448	27.340.874.612	398,3	109.363.498.448
177	Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica	5.556.124.420	100,0	1.527.667	5.556.124.420	27,6	1.527.667
178	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	30.842.181.886	100,0	-	30.842.181.886	54,8	-
179	Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	3.985.325.879	100,0	-	3.985.325.879	35,0	-
180	Procesos de formalización o regularización de predios para el desarrollo rural	-	0,0	-	-	0,0	-
181	Campeños y productores agropecuarios apoyados con sistemas de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria	800.715.208	100,0	1.231.870	800.715.208	14,7	1.231.870
182	Unidades productivas fortalecidas a través de programas de cofinanciación y procesos asociativos para la generación de valor agregado y acceso a la exportación	330.245.977	100,0	404.713	330.245.977	22,7	404.713
183	Proyectos productivos con enfoque agroecológico implementados	215.038.965	100,0	215.038.965	215.038.965	19,5	215.038.965



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
184	Programas y estrategias asociativas creadas para el fortalecimiento de encadenamientos comerciales regionales, nacionales e internacionales	-	0,0	-	-	0,0	-
185	Unidades productivas agropecuarias beneficiadas	1.492.914.226	100,0	3.789.122	1.492.914.226	70,3	3.789.122
186	Formulación del nuevo Plan Departamental de Extensión Agropecuaria-PDEA	-	0,0	-	-	0,0	-
187	Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	4.000.000	100,0	671	4.000.000	0,1	671
188	Productores con acceso a crédito agropecuario y rural	1.000.000.000	100,0	-	1.000.000.000	333,3	-
189	Pequeños productores cubiertos con seguro agropecuario	600.000.000	100,0	-	600.000.000	50,0	-
190	Productores atendidos con estrategias de información comercial o comercio exterior	467.322.227	100,0	601.444	467.322.227	24,2	601.444
191	Sistemas de información para la comercialización actualizado.	297.732.466	100,0	297.732.466	297.732.466	31,5	297.732.466
192	Eventos de transferencia de tecnología realizados	-	0,0	-	-	0,0	-
193	Unidades productivas ganaderas fortalecidas	769.826.459	100,0	6.998.422	769.826.459	6,8	6.998.422
194	Infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria intervenida	12.807.304.047	100,0	914.807.432	12.807.304.047	13,1	914.807.432
195	Áreas reforestadas con sistema silvopastoriles	7.462.250.482	100,0	27.135.456	7.462.250.482	37,0	27.135.456
196	Estrategias para el fomento y el desarrollo del sector minero-energético realizadas	526.122.855	100,0	75.160.408	526.122.855	19,6	75.160.408
197	Estrategias de planeación del sector minero-energético ejecutadas	-	0,0	-	-	0,0	-
198	Unidades productivas del sector minero-energético formadas	-	0,0	-	-	0,0	-
199	Entidades territoriales, autoridades, comunidades y grupos de valor acompañados en la diversificación de la matriz energética	-	0,0	-	-	0,0	-
200	Proyectos de infraestructura turística apoyados	-	0,0	-	-	0,0	-
201	Entidades Territoriales acompañadas en la gestión y promoción para el desarrollo turístico.	143.698.692	100,0	17.962.337	143.698.692	17,5	17.962.337
202	Estrategias regionales de promoción turística lideradas y apoyadas	164.467.649	100,0	54.822.550	164.467.649	20,0	54.822.550
203	Redes de turismo, Innovación, productividad y sostenibilidad fortalecidas	96.237.600	100,0	48.118.800	96.237.600	11,7	48.118.800
204	Observatorio turístico sostenible de Antioquia SITA implementado	149.994.292	100,0	149.994.292	149.994.292	18,3	149.994.292
205	Personas formadas en procesos enfocados al sector turístico	-	0,0	-	-	0,0	-
206	Estrategias para el cierre de brechas de competitividad sectorial y subregional implementadas	115.095.718	100,0	115.095.718	115.095.718	4,1	115.095.718
207	Unidades productivas con modelos de negocios apoyados con microcrédito/apalancamiento	4.509.750.000	100,0	5.796.594	4.509.750.000	97,2	5.796.594
208	Planes de negocios financiados	924.935.325	100,0	10.277.059	924.935.325	20,0	10.277.059



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
209	Personas formadas-mujeres, jóvenes, migrantes-en habilidades y competencias empresariales funcionales	-	0,0	-	-	0,0	-
210	Plazas de mercado intervenidas como dinamizadores económicos locales	797.618.154	100,0	398.809.077	797.618.154	16,8	398.809.077
211	Estrategias implementadas para el desarrollo de la agenda departamental de competitividad e innovación	-	0,0	-	-	0,0	-
212	Eventos de promoción y marketing para la atracción de Inversión Extranjera Directa realizados	31.099.736	100,0	6.219.947	31.099.736	6,9	6.219.947
213	Estrategias de acompañamiento en fomento exportador implementadas	-	0,0	-	-	0,0	-
214	Proyectos estratégicos apoyados	20.229.510	100,0	10.114.755	20.229.510	2,1	10.114.755
215	Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación creado e implementado	-	0,0	-	-	0,0	-
216	Proyectos de investigación e innovación con integración de actores sociales apoyados	63.580.630	100,0	47.804.985	63.580.630	1,6	47.804.985
217	Áreas con esquema de pago por servicios ambientales implementado	5.987.055.555	100,0	165.646	5.987.055.555	11,6	165.646
218	Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal	4.999.379.866	100,0	17.352.933	4.999.379.866	61,5	17.352.933
219	Áreas protegidas	114.842.258	100,0	2.328	114.842.258	0,8	2.328
220	Emprendimientos verdes sostenibles apoyados	86.428.939	100,0	-	86.428.939	7,1	-
221	Monitoreo de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño realizado	-	0,0	-	-	0,0	-
222	Manglar en proceso de restauración	58.250.000	100,0	1.738.806	58.250.000	14,0	1.738.806
223	Estrategias educativo-ambientales y de participación implementadas	100.000.000	100,0	10.000.000	100.000.000	2,8	10.000.000
224	Estrategias articuladas para impulsar la competitividad como un modelo sostenible y circular	-	0,0	-	-	0,0	-
225	Áreas en proceso de restauración en mantenimiento	-	0,0	-	-	0,0	-
226	Árboles nativos sembrados	-	0,0	-	-	0,0	-
227	Estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y su fauna silvestre asociada ejecutadas	211.519.182	100,0	211.519.182	211.519.182	45,7	211.519.182
228	Áreas en proceso de restauración	-	0,0	-	-	0,0	-
229	Entidades territoriales acompañadas en su gestión de la calidad del aire	22.942.516	100,0	2.294.252	22.942.516	9,2	2.294.252
230	Planes y estudios con orientaciones para el ordenamiento territorial departamental realizados	2.044.292.627	100,0	681.430.876	2.044.292.627	24,4	681.430.876
231	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente con la escuela de ecología territorial	-	0,0	-	-	0,0	-
232	Sistema de Alerta Temprana implementado	6.685.489.020	100,0	6.685.489.020	6.685.489.020	26,9	6.685.489.020
233	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	16.176.177.254	100,0	3.235.235.451	16.176.177.254	86,7	3.235.235.451
234	Organismos de atención de emergencias equipados	8.397.303.051	100,0	559.820.203	8.397.303.051	45,0	559.820.203
235	Cuerpos de bomberos voluntarios fortalecidos	-	0,0	-	-	0,0	-



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número
Radicado No 2025100005479
Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
236	Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados	275.749.999	100,0	1.102.999.996	275.749.999	5,7	1.102.999.996
237	Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados	240.000.000	100,0	-	240.000.000	13,0	-
238	Infraestructura para el bienestar animal cofinanciados	100.000.000	100,0	-	100.000.000	8,5	-
239	Animales en estado de indefensión o vulnerabilidad atendidos	198.692.332	100,0	45.415	198.692.332	19,9	45.415
240	Caninos y felinos esterilizados	3.467.170.752	100,0	175.749	3.467.170.752	82,5	175.749
241	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	66.838.801.049	100,0	1.422.102.150	66.838.801.049	22,6	1.422.102.150
242	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	25.736.227.857	100,0	1.169.828.539	25.736.227.857	20,1	1.169.828.539
243	Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano implementadas	247.919.983	100,0	727.038	247.919.983	3,1	727.038
244	Municipios apoyados con vehículos de recolección de residuos sólidos	5.812.745.887	100,0	447.134.299	5.812.745.887	24,2	447.134.299
245	Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas	4.046.101.540	100,0	2.023.050.770	4.046.101.540	63,2	2.023.050.770
246	Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construidas	2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	2.000.000.000	16,7	2.000.000.000
247	Estudios o diseños para la construcción u optimización de alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos realizados	-	0,0	-	-	0,0	-
248	Prestadores de servicios públicos asistidos técnicamente	10.000.000.000	100,0	82.644.628	10.000.000.000	25,0	82.644.628
249	Viviendas nuevas en las zonas urbanas y rurales gestionadas	23.513.348.807	100,0	6.440.249	23.513.348.807	2,3	6.440.249
250	Predios titulados y edificaciones legalizadas	-	0,0	-	-	0,0	-
251	Viviendas urbanas y rurales mejoradas	33.266.056.281	100,0	2.647.939	33.266.056.281	16,2	2.647.939
252	Municipios y Distritos intervenidos con la estrategia Antioquia Pinta Firme	380.610.580	100,0	34.600.962	380.610.580	9,8	34.600.962
253	Ruedas de cooperación y filantropía realizadas	-	0,0	-	-	0,0	-
254	Esquemas asociativos territoriales asistidos técnicamente	1.497.055.000	100,0	71.288.333	1.497.055.000	6,8	71.288.333
255	Sistemas de información e Infraestructura TI actualizados	23.576.558.436	100,0	2.357.655.844	23.576.558.436	26,4	2.357.655.844
256	Organismos asistidos técnicamente en gestión del talento humano	1.162.093.114	100,0	232.418.623	1.162.093.114	0,8	232.418.623
257	Metodologías aplicadas al talento humano en cultura, conocimiento, cambio y competencias	3.302.325.181	100,0	1.651.162.591	3.302.325.181	317,5	1.651.162.591
258	Estructura organizacional y empleo público optimizada	2.264.845.776	100,0	2.264.845.776	2.264.845.776	568,6	2.264.845.776
259	Personas capacitadas en talento humano	882.015.940	100,0	419.010	882.015.940	29,9	419.010
260	Rendición de cuentas realizadas	175.611.396	100,0	87.805.698	175.611.396	13,7	87.805.698
261	Entidades, organismos y dependencias asistidas técnicamente en comunicaciones	780.578.553	100,0	390.289.277	780.578.553	9,0	390.289.277
262	Sistemas de información CRM y digitalización de trámites implementados	-	0,0	-	-	0,0	-
263	Personas atendidas con oferta institucional articulada	6.264.758.861	100,0	15.431	6.264.758.861	32,8	15.431



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027							
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Anexo 2: Ejecución Financiera Indicadores de Producto (Valores en millones de COP)							
DATOS DEL INDICADOR DE PRODUCTO		ANÁLISIS PLAN ACCIÓN 2024			ANÁLISIS CUATRIENIO ACUMULADO		
#	Indicador De Producto Según ERIPD	Ejecución Financiera 2024	% Ejec	Costo Unitario Ejecutado 2024	Ejecución Acumulada	% Ejec	Costo Unitario Acumulado
264	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente en atención a la ciudadanía	-	0,0	-	-	0,0	-
265	Sedes institucionales adecuadas	16.363.350.199	100,0	16.363.350.199	16.363.350.199	183,4	16.363.350.199
266	Programa de saneamiento de bienes ejecutado	747.581.156	100,0	49.838.744	747.581.156	8,0	49.838.744
267	Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas	-	0,0	-	-	0,0	-
268	Organismos del nivel central asistidos técnicamente en materia de defensa jurídica	912.201.523	100,0	912.201.523	912.201.523	36,0	912.201.523
269	Diligencias de inspección realizadas a entidades sin ánimo de lucro	-	0,0	-	-	0,0	-
270	Modelo de abastecimiento estratégico y fortalecimiento a la gestión contractual aplicado	1.325.000.000	100,0	5.300.000.000	1.325.000.000	16,3	5.300.000.000
271	Sistema de gestión documental implementado	360.210.712	100,0	522.044.510	360.210.712	6,1	522.044.510
272	Documentos de lineamientos técnicos de control interno realizados	221.737.975	100,0	221.737.975	221.737.975	21,8	221.737.975
273	Modelo de Gestión para el conglomerado público implementado	-	0,0	-	-	0,0	-
274	Asamblea Departamental Fortalecida	3.527.560.197	100,0	3.527.560.197	3.527.560.197	27,9	3.527.560.197
275	Pago de pasivos laborales de la administración pública realizados.	131.860.005	100,0	23.052	131.860.005	11,7	23.052
276	Programas para el fortalecimiento de la hacienda pública implementados	19.959.538.334	100,0	6.653.179.445	19.959.538.334	32,3	6.653.179.445
277	Entidades territoriales asistidas técnicamente en catastro y estatutos tributarios	-	0,0	-	-	0,0	-
278	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	190.221.352.711	100,0	65.371	190.221.352.711	129,0	65.371
279	Trámites de conservación catastral realizados	3.789.927.449	100,0	46.621	3.789.927.449	10,8	46.621
280	Entidades territoriales asistidas fiscal y financieramente	-	0,0	-	-	0,0	-
281	Entidades territoriales con capacidades técnicas fortalecidas en gestión y proyectos	1.330.193.934	100,0	10.641.551	1.330.193.934	21,3	10.641.551
282	Modernización del sistema de información estadística	29.250.000	100,0	-	29.250.000	2,1	-
283	Instrumentos de producción y análisis de datos para la toma de decisiones implementados	27.429.280	100,0	13.714.640	27.429.280	6857,3	13.714.640

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)

4.3. Metas de Resultado.

Se presentan a continuación la relación de las metas de Resultado e impacto contempladas en el plan de desarrollo “**POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027**” y su ejecución con corte a 31 de diciembre de **2024**, la cual soporta el resultado obtenido en el factor de efectividad.



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Anexo 3. Ejecución de Indicadores de resultado

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027											
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA											
Anexo 3: Indicadores de resultado											
DATOS DEL INDICADOR DE RESULTADO						Ejecución					
#	Indicador De Resultado	Línea Base	Meta (2024-2027)	Ejecución 2024		Ejecución 2025		Ejecución 2026		Ejecución 2027	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	Promoción de la participación ciudadana en los procesos liderados desde la institucionalidad	0	100	25	25,0	0	0	0	0	0	0
2	Porcentaje de municipios PDET que se articulan al sistema departamental del cuidado	0	90	14	15,6	0	0	0	0	0	0
3	Porcentaje de municipios priorizados que contribuyen al Modelo de Intervención Integral- MITI-	0	90	32	35,6	0	0	0	0	0	0
4	Transversalización de la identidad multicultural con enfoque étnico y de género, para fortalecer las particularidades sociales, culturales, económicas y políticas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP)	0	40	10	25,0	0	0	0	0	0	0
5	Percepción de seguridad	70,6	85	75	30,6	0	0	0	0	0	0
6	Índice de criminalidad	0,77	0,8	0,7	0,0	0	0	0	0	0	0
7	Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes	25,5	24	24	100,0	0	0	0	0	0	0
8	Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes	40	38	35,37	100,0	0	0	0	0	0	0
9	Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de transporte terrestre	14,72	13,98	15,4	0,0	0	0	0	0	0	0
10	Índice del Riesgo en Salud Pública	70,3	65,6	64,1	100,0	0	0	0	0	0	0
11	Índice de Vigilancia en Salud Pública, Prestación de Servicios y Sanitarios	34,4	34	34,3	25,0	0	0	0	0	0	0
12	Índice de Gestión del Riesgo de las ESE Hospitales	48,25	85	29,5	0,0	0	0	0	0	0	0
13	Índice de Gestión del Riesgo de Entidades Territoriales Municipales	92	95	87,7	0,0	0	0	0	0	0	0
14	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.	8,79	10	6,26	0,0	0	0	0	0	0	0
15	Medallas de oro obtenidas en juegos deportivos nacionales y para nacionales	227	249	0	0,0	0	0	0	0	0	0
16	Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas	0	91	0	0,0	0	0	0	0	0	0
17	Índice de desigualdad de género	0,28	0,26	0	0,0	0	0	0	0	0	0
18	Niños y niñas con atención integral para la primera infancia, que obtienen nivel de desarrollo adecuado.	0	90	0	0,0	0	0	0	0	0	0
19	Prevalencia del riesgo de desnutrición aguda	7,7	6,7	0	0,0	0	0	0	0	0	0
20	Prevalencia de Inseguridad Alimentaria y Nutricional del departamento de Antioquia (moderada + severa)	37,9	35,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0
21	Personas mayores, jóvenes, LGTBI y en situación de discapacidad asistidos para la garantía de derechos	0	24000	43253	100,0	0	0	0	0	0	0
22	Efectividad de la atención a las familias para la garantía de derechos	0	60	0	0,0	0	0	0	0	0	0
23	Establecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría en pruebas saber 11	13,73	15,7	16,27	100,0	0	0	0	0	0	0
24	Transformación Digital en el sector educativo	0	60	0	0,0	0	0	0	0	0	0
25	Tasa de Cobertura neta en grado transición	77,1	83	76,01	0,0	0	0	0	0	0	0
26	Tasa de cobertura neta en primaria	82,22	91,09	81,85	0,0	0	0	0	0	0	0
27	Tasa de cobertura neta en educación media	50,11	70,48	49,47	0,0	0	0	0	0	0	0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027											
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA											
Anexo 3: Indicadores de resultado											
DATOS DEL INDICADOR DE RESULTADO				Ejecución							
#	Indicador De Resultado	Línea Base	Meta (2024-2027)	Ejecución 2024		Ejecución 2025		Ejecución 2026		Ejecución 2027	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
28	Tasa de tránsito inmediato a la educación superior en municipios no certificados	28,61	40	29,14	4,7	0	0	0	0	0	0
29	Tasa de analfabetismo en personas de 15 años y más	4	2	4,13	0,0	0	0	0	0	0	0
30	Tasa de deserción oficial en edad escolar	4,66	3	3,77	53,6	0	0	0	0	0	0
31	Tasa de cobertura neta en secundaria	72,98	90,35	71,41	0,0	0	0	0	0	0	0
32	Infraestructura de uso cultural intervenida	0	55	20	36,4	0	0	0	0	0	0
33	Tasa de cobertura en educación superior	16,15	25	55,66	100,0	0	0	0	0	0	0
34	Docentes, directivos docentes y administrativos que participan en actividades de bienestar laboral	79	85	0	0,0	0	0	0	0	0	0
35	Alcance municipal de convocatorias públicas de las culturas, las artes y los saberes	0	100	100	100,0	0	0	0	0	0	0
36	Vías pavimentadas en la red vial a cargo del Departamento	43,62	60	45,45079 67	11,2	0	0	0	0	0	0
37	Red vial a cargo del Departamento en buen estado	66	70	73	100,0	0	0	0	0	0	0
38	Vías intervenidas en la red vial a cargo de los Municipios	0	70,5	4,461099 21	6,3	0	0	0	0	0	0
39	Cobertura de energía eléctrica rural	98,62	99,52	98,95	36,7	0	0	0	0	0	0
40	Incremento de la conectividad a internet en el Departamento de Antioquia.	70,58	78	0	0,0	0	0	0	0	0	0
41	Generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales	76,5	1117,5	76,5	0,0	0	0	0	0	0	0
42	Ahorro estimado en el consumo de energía eléctrica por transición tecnológica	1088500	1588500	1088500	0,0	0	0	0	0	0	0
43	Rendimiento promedio rubros agrícolas	9,9	10,3	9,74	0,0	0	0	0	0	0	0
44	Producción Agrícola	3974969	4094216	3914872, 01	0,0	0	0	0	0	0	0
45	Participación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales respecto al total de exportaciones del Departamento	30,3	38	28,5	0,0	0	0	0	0	0	0
46	Producción Pecuaria (bovina y bufalina)	101850	117193	60689	0,0	0	0	0	0	0	0
47	Porcentaje de unidades de producción minero-energética asistidas con estándares de legalidad y de competitividad	4,3	25	1,98	0,0	0	0	0	0	0	0
48	Visitantes no residentes	677773	700605	957905	100,0	0	0	0	0	0	0
49	Índice de competitividad turística	6,14	6,3	5,88	0,0	0	0	0	0	0	0
50	Tasa de informalidad laboral	38,4	37,19	37,93	38,8	0	0	0	0	0	0
51	Índice de competitividad Departamental	6,82	6,9	6,7	0,0	0	0	0	0	0	0
52	Grado de Apertura Comercial	42,5	43	0	0,0	0	0	0	0	0	0
53	Densidad Empresarial Departamental	32,29	33,2	32,5	23,1	0	0	0	0	0	0
54	Tasa de desempleo	9,3	9	7,4	100,0	0	0	0	0	0	0
55	Índice Departamental de Innovación para Colombia -IDIC	62,97	66,9	0	0,0	0	0	0	0	0	0



* 2 0 2 5 1 0 0 0 5 4 7 9 *

Al responder por favor cite este número

Radicado No 2025100005479

Medellín, 24/06/2025

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027											
Ente Territorial DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA											
Anexo 3: Indicadores de resultado											
DATOS DEL INDICADOR DE RESULTADO				Ejecución							
#	Indicador De Resultado	Línea Base	Meta (2024-2027)	Ejecución 2024		Ejecución 2025		Ejecución 2026		Ejecución 2027	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
56	Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación	45929,9	50000	36143,7	0,0	0	0	0	0	0	0
57	Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados	No Dato	250	0	0,0	0	0	0	0	0	0
58	Instancias y autoridades de planeación territorial articuladas y posicionadas	100	100	100	100,0	0	0	0	0	0	0
59	Cobertura de acueducto	91,94	93,21	92,62	53,5	0	0	0	0	0	0
60	Cobertura de alcantarillado	82,88	83,82	83,71	88,3	0	0	0	0	0	0
61	Cobertura de aseo	90,21	90,94	90,88	91,8	0	0	0	0	0	0
62	Déficit habitacional	571886	421886	555672	10,8	0	0	0	0	0	0
63	Alianzas para la cooperación y la asociatividad generadas	0	4	2	50,0	0	0	0	0	0	0
64	Índice de Desempeño Institucional - IDI	88,8	94,8	93,4	76,7	0	0	0	0	0	0
65	Percepción de la Satisfacción ciudadana	93,52	97	96,53	86,5	0	0	0	0	0	0
66	Modernización de la infraestructura física y equipamiento	44	70	55	42,3	0	0	0	0	0	0
67	Cobertura del Pasivo Pensional	74	80	76	33,3	0	0	0	0	0	0
68	Cumplimiento del recaudo programado de ingresos corrientes de libre destinación	0	100	23,8	23,8	0	0	0	0	0	0
69	Porcentaje de entidades, organismos y dependencias con al menos un instrumento de gestión o planificación actualizado	0	70	61	87,1	0	0	0	0	0	0
70	Gestión de la información estadística	80,4	82,4	84,9	100,0	0	0	0	0	0	0

Fuente: elaborado por el equipo evaluador, con base en la información rendida por el sujeto de control en la plataforma Gestión Transparente (2025)



5. REFERENCIAS

- Cohen, E., & Franco, R. (1992). *Evaluación de proyectos sociales*. Obtenido de Repositorio de la CEPAL:
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9051/S3092C678S.pdf>
- Contraloría General de Antioquia. (2022). *Plan Estratégico Corporativo 2022–2025*. Medellín. Recuperado el Enero de 2023
- Contraloría General de Antioquia. (2024). Rendición ERIPD sujetos de control - Gestión Transparente.
- DNP. (2018). *Guía para la construcción y análisis de indicadores*. Obtenido de SINERGIA DNP:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
- Gobernación de Antioquia. (2024). Plan de Desarrollo Departamental “Por Antioquia Firme 2024-2027”.
<http://www.gestiontransparente.com/Misional/ViewReport.aspx?report=/Reports/rptAnexoByType>
